



ESQUEMA DE FASES (REFORMA INTERIOR PARCIAL DEL MERCAT DEL CARMEL)**FASE 1**

- 1- Sectorització zona logística i accés 04 mitjançant parets de pladur i lones.
- 2- Realització dels enderrocs.

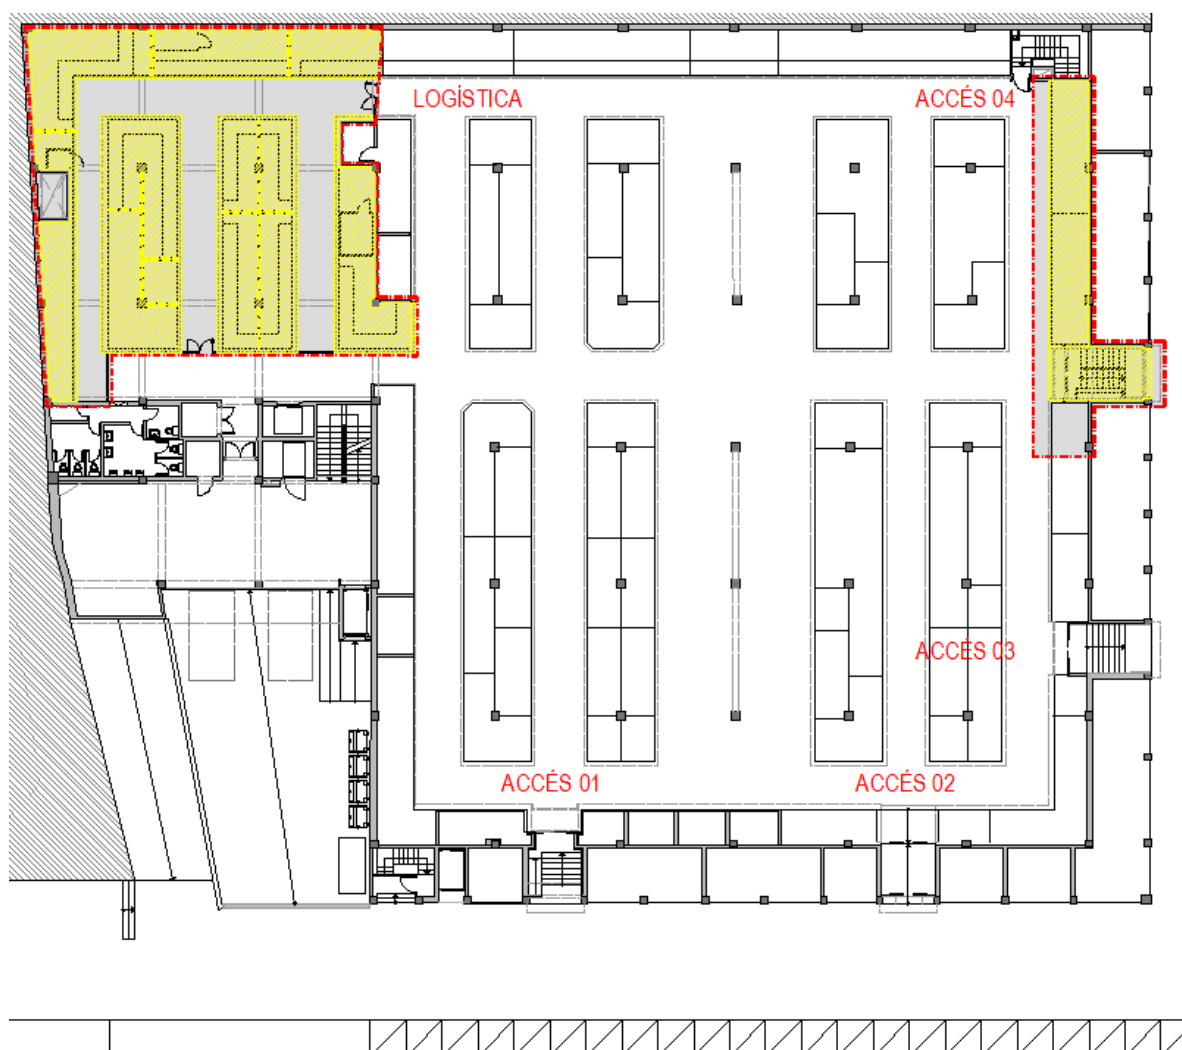


FASE 2

- 1- Inici construcció zona logística.
- 2- Construcció nou nucli de lavabos.
- 3- Construcció nova rampa accés 04.

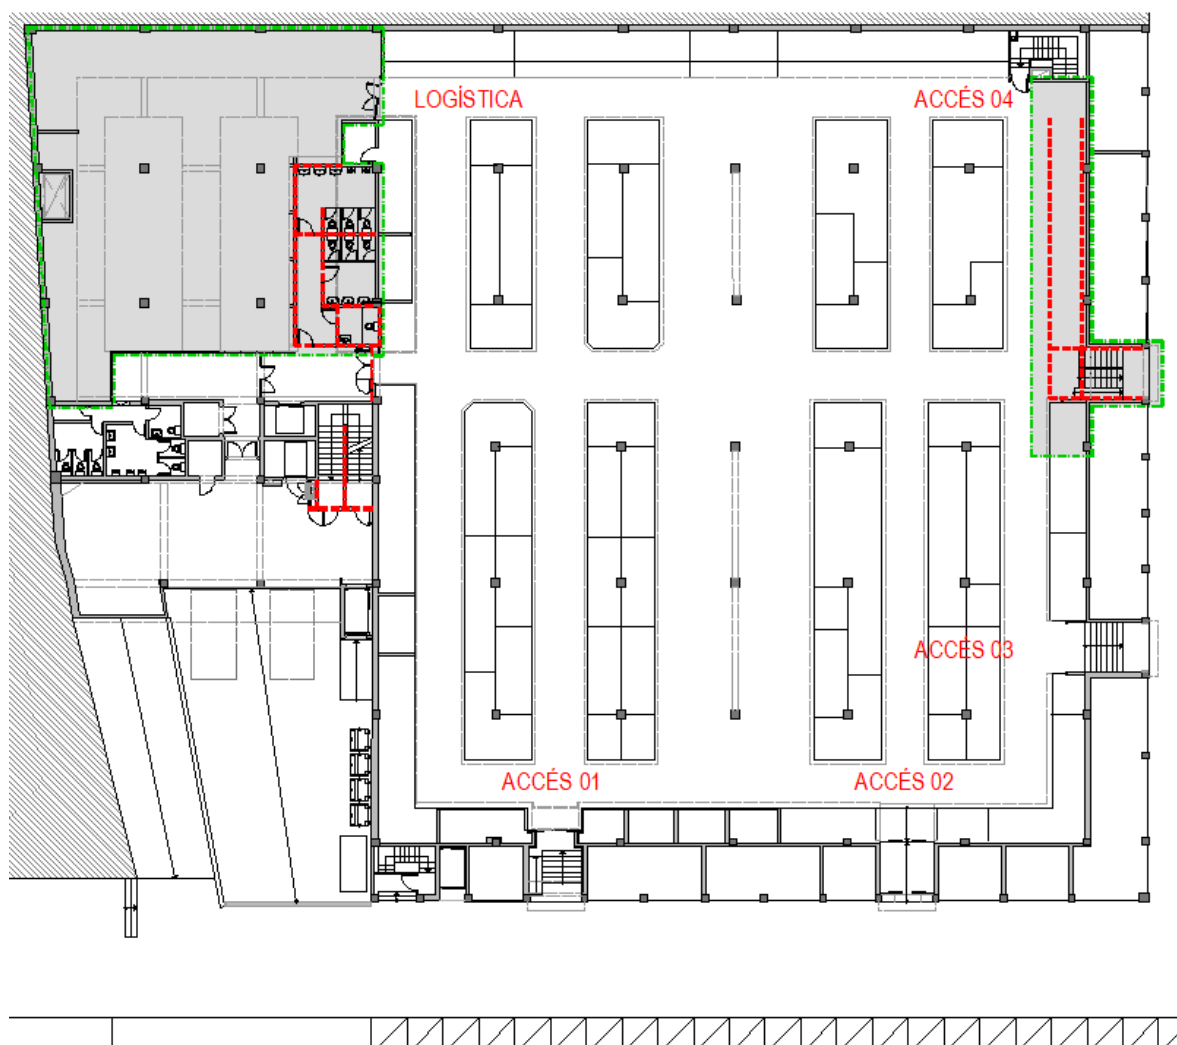


FASE 3

- 1- Posada en marxa del nou nucli de lavabos.
- 2- Enderroc nucli de lavabos antic.
- 3- Construcció zona logística.
- 4- Finalització construcció i habilitació accés 04.

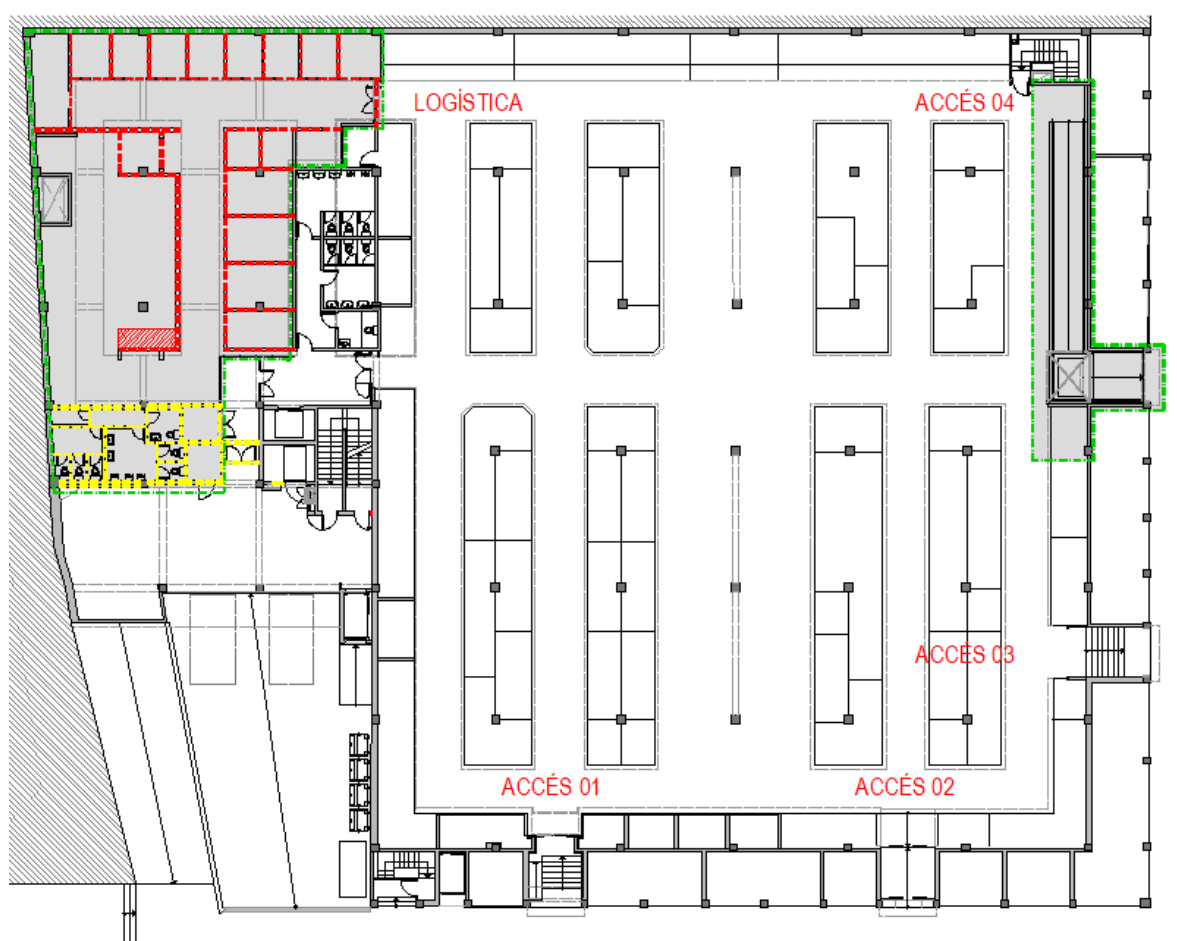


FASE 4

- 1- Sectorització accés 01 mitjançant parets de pladur i lones.
- 2- Posada en marxa del la nova zona logística interior.
- 3- Trasllat maquinària ascensor exterior moll.
- 4- Enderrocs accés 01.

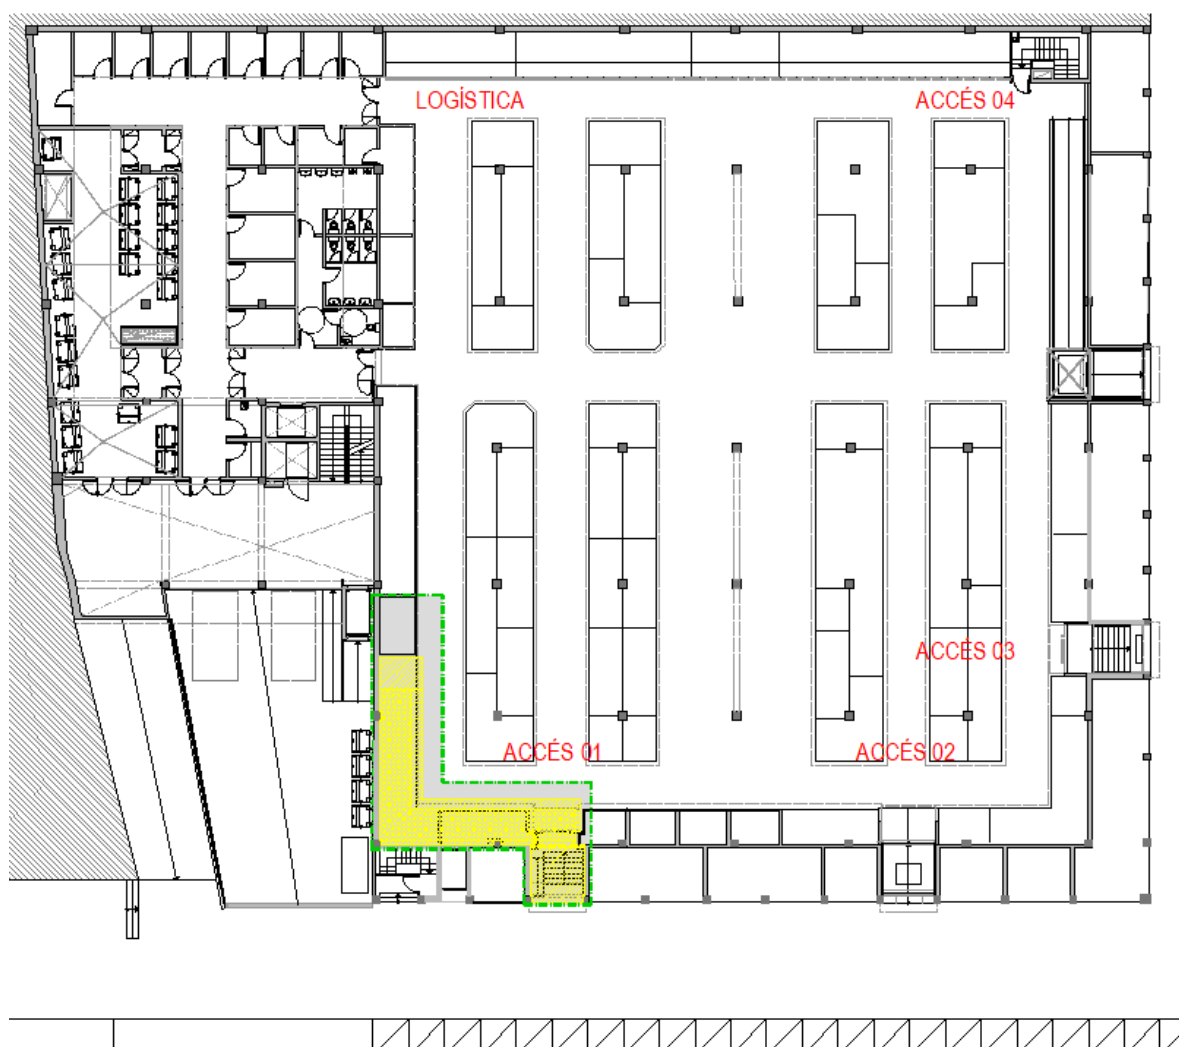


FASE 5

- 1- Desmuntatge i construcció ascensors.
- 2- Tancament escala altell / magatzems.
- 3- Construcció rampa accés 01.
- 4- Enderrocs i acondicionament moll.

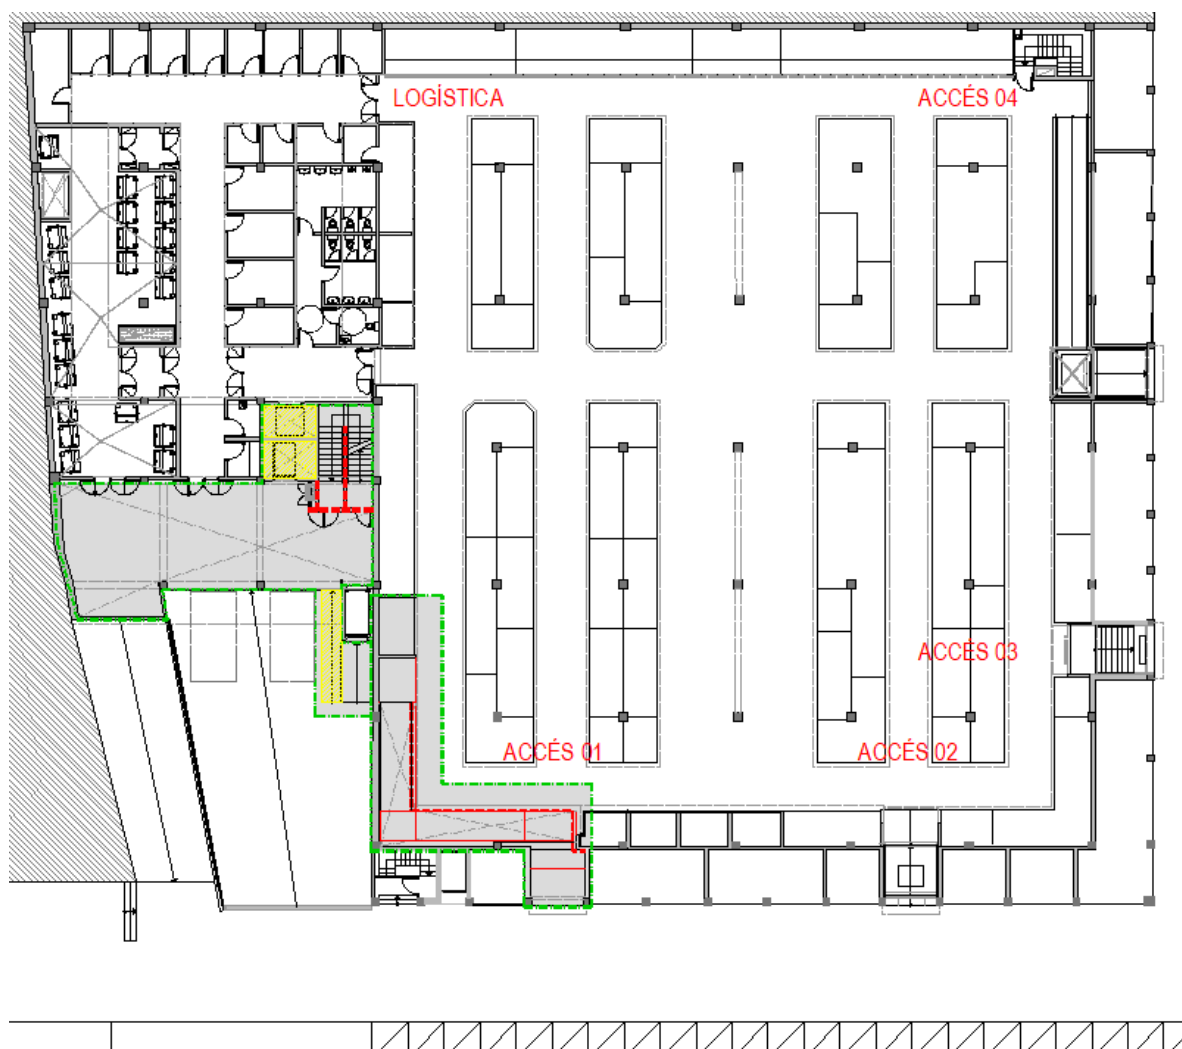

FASE 6

- 1- Finalització construcció i habilitació accés 01.
- 2- Habilitació ascensors i moll interior.
- 3- Sectorització accés 02 i 03 mitjançant lones.
- 4- Enderrocs i habilitació accessos 03 i 04.
- 5- Sectorització i construcció rampa camions.

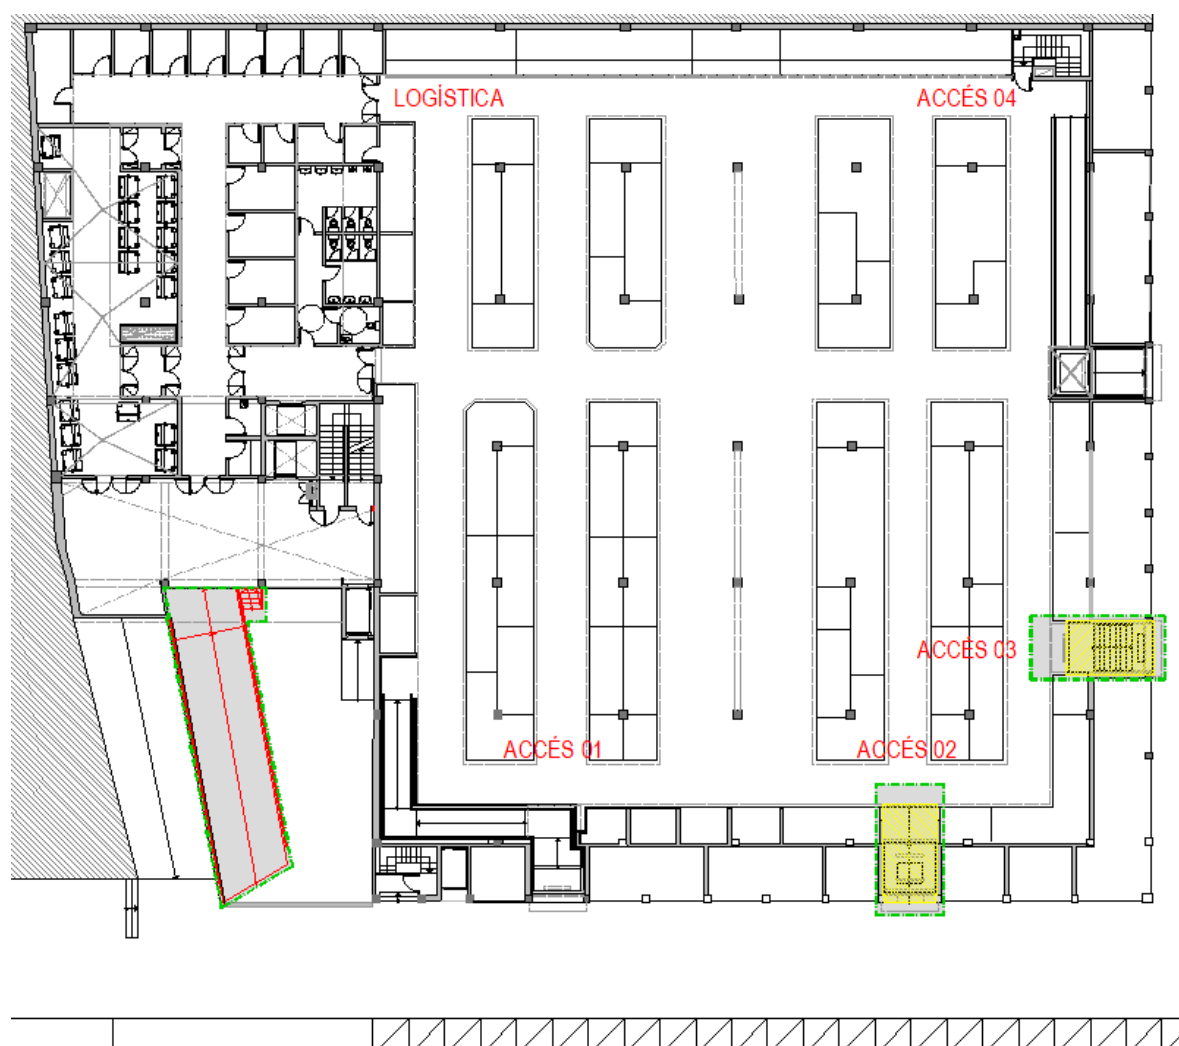

Barcelona , a 23 de març de 2021

L'ARQUITECTE TÈCNIC

Miquel Llaurodo Sanahuja
