

INNFORME AMPLIACIÓ DE LA SALA DE DISSECCIONS DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

DATA	30/09/2025
PROJECTE	AMPLIACIÓ DE LA SALA DE DISSECCIONS DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.
Autor	Joan Guàrdia, DIRECCIÓ D'OBRA INSTAL·LACIONS.


1. OBJECTE DEL DOCUMENT

Justificació del retràs produït per motius aliens a la empresa constructora.

2. MOTIU DE LA PRORROGA

En la obra de de ampliació de la sala de disseccions de la facultat de medicina de la universitat de Lleida, s'ha produït un imprevist ja que el fabricant de la maquina de climatització de la sala per problemes en la seva fabrica per no poder disposar de tots els complements no pot subministrar la maquina necessària per tal de poder acabar la obra.

La maquina es va demanar amb el degut temps, el 9 de juliol de 2025, el Ramon Masip administrador de l'empresa subcontractada va fer la comanda.

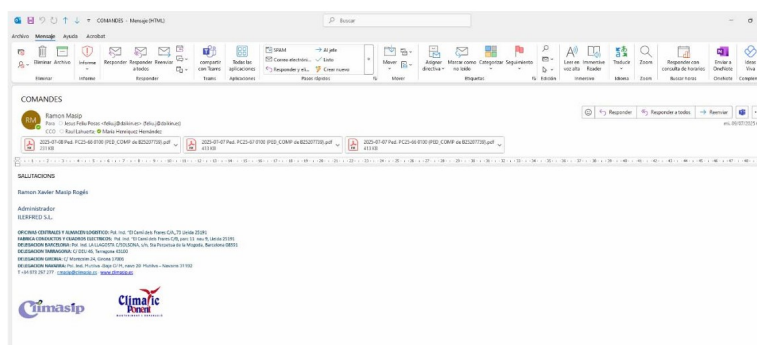

El fabricant va indicar que es podria rebre la maquina en temps i forma per talde poder acabar la obra en temps. Per tan no es va estudiar possibles alternatives ja que la maquina de projecte no comprometia el plaç.

Pero al setembre el fabricant va indicar que la maquina es retrasaria, deixant la obra sense temps de poder estudiar amb altres fabricants, ja que ens deixava sense marge de maniobra. Ja que la informacio ens la va dornar al setembre i la obra finalitza el 6 d'octubre.

Per tant el temps perdut degut al fabricant es de mes de 2 mesos ja que desde la comanda de el 9/07 fins al 10/09 no indica que el climatitzador no arriba a temps.

La obra no es retrassa tot aquest temps ja que teniem previst un temps de posible posta en marxa i dels 2 mesos sense informacio de la maquina el retras final de la obra seran 6 setmanes, del 6'octubre fins al 21 de novembre de 2025

La obra quedara aquesta setmana quedara totalment finalitzada, a l'espera de l'arribada d'aquesta maquina.

Lleida, a 30 de Setembre de 2025.

E3G INGINYERIA I ENERGIA

Joan Guardia Preixens
