

DOCUMENT Informe tècnic	ÒRGAN ÀREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I RESILIÈNCIA URBANA	REFERÈNCIA PACC2025000074
Codi Segur de Verificació: e25acdb5-95af-42f2-822d-eb77e29258ca Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082114_2025_6073262 Data d'impressió: 12/11/2025 11:17:35 Pàgina 1 de 15		
SIGNATURES 1.- Javier Olarte Oliva (TCAT), 03/10/2025 09:26		



Número d'expedient: PACC2025000074
Número de registre: X2025010635
RE núm.:
De data:
Assumpte: Contractació de treballs d'emergència per les obres de reconstrucció d'un mur, reomplir terres, arranament de infraestructura hidràulica a la Riera Pahissa per fer front al desastre natural a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat

**INFORME TÈCNIC
DEL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT**

Xavier Olarte, Cap unitat de manteniment de la Ciutat, en relació amb la necessitat d'emetre informe definitiu sobre l'assumpte del títol enunciat, una vegada examinat l'informe inicial de data 25.08.25 signat per l'Efrén Radigales, Cap de manteniment de la Ciutat, i realitzats els treballs declarats com a necessaris per emergència, aquest tècnic informa:

1. OBJECTE

Aquest informe té per objecte indicar els treballs finalment efectuats amb data d'inici **27.08.25** i finalitzats en data **22.09.25**, la valoració econòmica final del mateixos als efectes de procedir a la contractació d'emergència, d'acord amb l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), arran dels danys ocasionats pels aiguats del dia 20 d'agost de 2025 al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat i als efectes de permetre la facturació prèvia certificació per part de l'empresa indicada a l'informe inicial.

2. ANTECEDENTS I FETS

Consta a l'expedient l'informe tècnic d'identificació d'afectacions greus i condicions de risc derivades de l'episodi de precipitacions intenses.

El dia 20/08/2025, es van acumulat 31.4mm en un període de 20 minuts i ratxes de vent superiors als 40 km/h.

Aquest episodi va ocasionar:

A l'espai públic: sortida de tapes de clavegueram, caiguda d'arbres i ensorrament parcial d'un mur a la Riera Pahissa, que ha malmès el tub de reg del Canal de la Infanta i ha generat risc per a persones i finques agrícoles. Ha deixat al descobert una fonamentació de la torre elèctrica d'AT. Existeix un perill greu i imminent per les persones, per existir risc de caiguda no controlada de part del mur, per caiguda al desnivell generat, per caiguda de torre elèctrica.



Ajuntament de
Sant Feliu
de Llobregat

Cal reconstruir el mur que delimita el pas de l'aigua de la riera per canalitzar-la, de manera urgent sanejar el terreny endegat d'aigua i reomplir amb terres tot-u artificial, executar un fonament i mur de formigó. Cal comunicar a ENDESA la possible afectació del fonament de la torre d'Alta Tensió número T12A, per efectuar les actuacions que considerin, i en tot cas prendre les mesures necessaris per evitar riscos a tercers.



Trencament infraestructura de reg i ensorrament de mur.







3. FONAMENT JURÍDIC

Article 120 LCSP: habilita la contractació d'emergència quan sigui necessari actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics o situacions que suposin perill imminent.

En aquests cas, l'òrgan de contractació pot ordenar l'execució immediata de les prestacions indispensables, sense seguir la tramitació ordinària, procedint a la posterior justificació i liquidació.

Les actuacions proposades afecten béns de titularitat municipal o sota responsabilitat de manteniment de l'Ajuntament, conforme han confirmat els serveis jurídics i de patrimoni.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE

CPV: 45110000 ; 45250000 ; 45262000

Títol: Obres de reconstrucció d'un mur, reomplir terres, arranament de infraestructura hidràulica, retirada de les terres i runes del pas sota carretera d'una conducció auxiliar, de a la Riera Pahissa per fer front al desastre natural a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

En el moment de realitzar la visita in situ amb un contractista es determina un cost aproximat dels treballs a realitzar sense poder avaluar si hauran despeses associades a la torre d'alta tensió. Una vegada realitzats els treballs es va poder comprovar com no ha calgut actuar en cap element ni fonament de la torre elèctrica per no veure's afectada per la caiguda del mur aigües a baix.

El valor estimat del contracte en el moment que s'ordenen els treballs ascendeix a la quantitat de **54.137,50€ més IVA**. S'adjunta pressupost a l'expedient que justifica el conjunt de partides que originen aquest tal. Una vegada iniciats els treballs es va produir un nou episodi de pluja que va propiciar la sortida d'aigües pluvials a la zona de treball obligant a refer treballs de moviment de terres i d'arranjament del tub del



canal de reg afectat valorats en **2.500,00 €**. Igualment es va haver d'afrontar la despesa del càlcul de l'armadura del mur i sabata de fonament necessària per l'alçada i secció valorats en **1.200,00 €**. Tot plegat genera un total de **57.837,50 €** IVA no inclòs. La qual cosa representa un total de 69.983,38 amb el 21% d'IVA inclòs.

Les partides pressupostaries previstes són:

2025 300 15320 61900	PLA DE PAVIMENTACIÓ	20.200,88 €
2025 300R4 15320 61900	PLA DE PAVIMENTACIÓ	0,55 €
2025 300R3 17200 61901	INVERSIONS PLA CLIMA I ENERGIA	6.000,00 €
2025 300R4 45900 61904	INC.REPOS.INFRAEST- VIA PÚBLICA	43.781,95 €
		69.983,38 €

5. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

La tramitació de l'expedient a seguit el seu curs, **a la vista de la urgència i del perill imminent per les persones i per la infraestructura hidràulica**, i amb el comunicat de pre alerta emes pel CECAT per episodis de pluges intenses previstes pel dia 28 d'agost.
Les obres d'emergència s'han iniciat el **dia 27 d'agost de 2025** i han finalitzat el dia **22.09.2025** dins la previsió inicial de 30 dies naturals.

Es fa una relació temporal i gràfica dels referits treballs per deixar constància de la seva correcta realització d'acord a les instruccions donades per qui subscriu:

Data	Treballs	Imatge
27.08.25	Treballs de desbrossament a la riera per facilitar accés de vehicles.	




28.08.25	Treballs de moviments de terres per reparació de conducte de reg.	
29.08.25	Pluja de 10 l/m² que genera conducció d'aigües pluvials de la riera cap el camp amb moviment de terres i treballs de conductes de canal de reg malmesos. Reparació i posta en funcionament del conducte de reg.	 



		
01.09.25	Treballs excavació sabata de fonament amb execució de capa de grava i formigó de neteja.	

Codi Segur de Verificació: e25acdb5-95af-42f2-822d-eb77e29258ca
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082114_2025_6073262
Data d'impressió: 12/11/2025 11:17:35
Pàgina 8 de 15

SIGNATURES
1.- Javier Olarte Oliva (TCAT), 03/10/2025 09:26

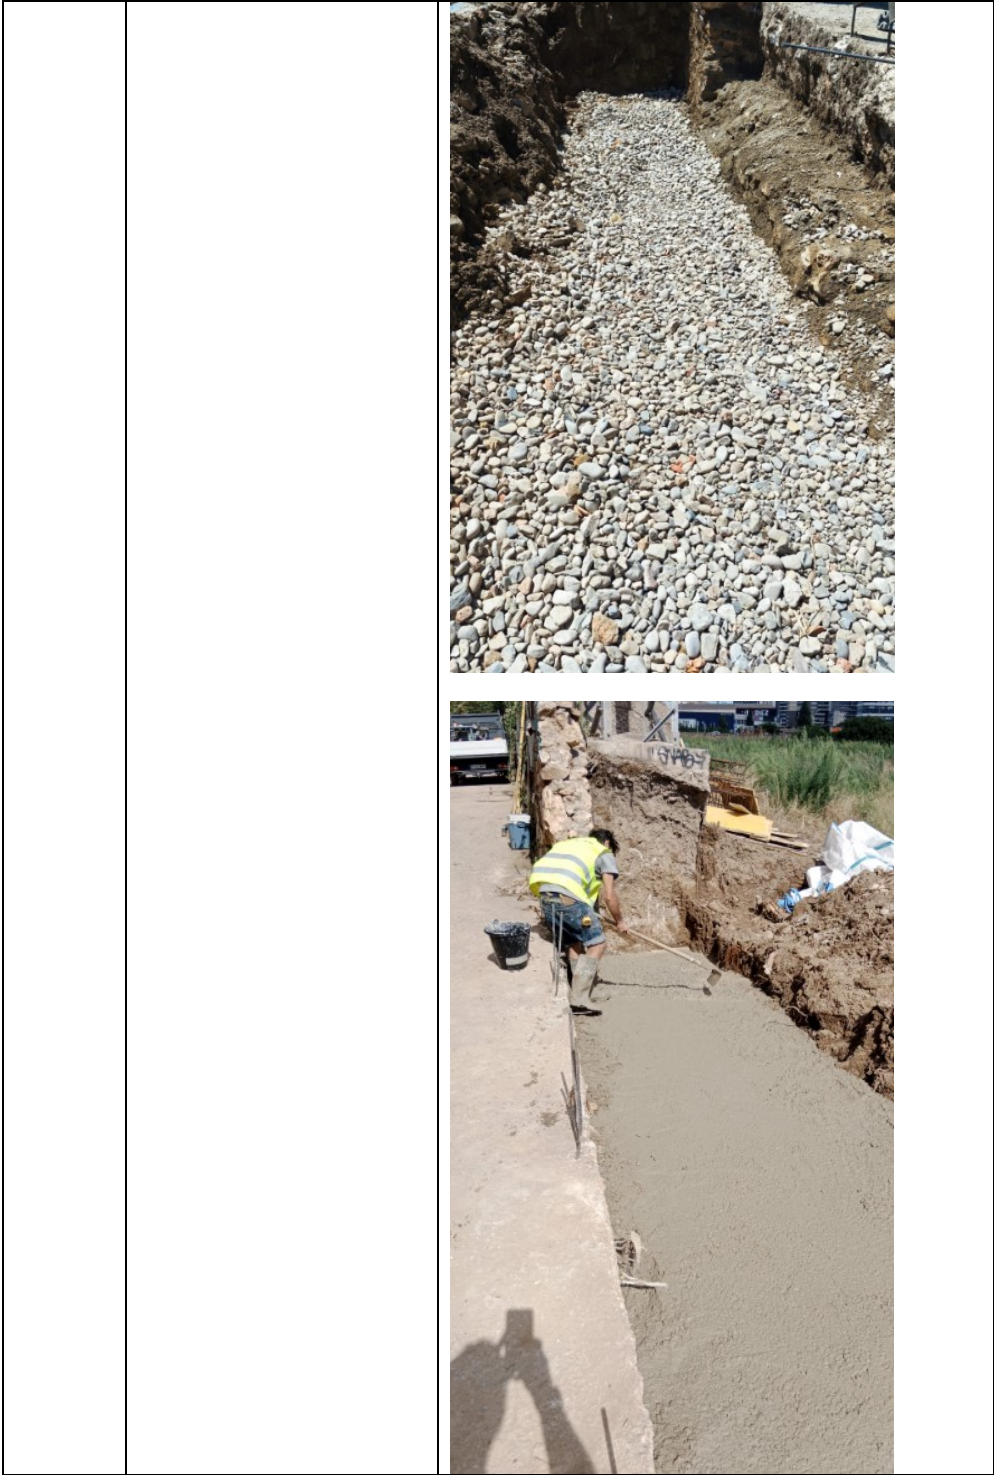

Codi Segur de Verificació: e25acdb5-95af-42f2-822d-eb77e29258ca
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082114_2025_6073262
Data d'impressió: 12/11/2025 11:17:35
Pàgina 9 de 15

SIGNATURES
1.- Javier Olarte Oliva (TCAT), 03/10/2025 09:26



02.09.25	Treballs col·locació armadura de sabata de fonament amb esperes de mur.	 A photograph showing a long, narrow excavation pit. The bottom of the pit is covered with a dense grid of steel reinforcement bars (rebar) laid out on a layer of sand. The rebar is arranged in a rectangular pattern, with some sections marked with green spray paint. The walls of the pit are earthen and uneven. A yellow safety barrier is visible on the right side of the pit.
03.09.25	Formigonat sabata amb dúmper.	 A photograph showing the same excavation pit as in the previous image. The rebar grid is still visible, but now it is partially covered by a layer of concrete. A yellow concrete pump truck (dúmp) is visible in the background, and a red and white striped bucket is in the foreground. The concrete is being poured from the truck into the pit.

Codi Segur de Verificació: e25acdb5-95af-42f2-822d-eb77e29258ca
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082114_2025_6073262
Data d'impressió: 12/11/2025 11:17:35
Pàgina 10 de 15

SIGNATURES
1.- Javier Olarte Oliva (TCAT), 03/10/2025 09:26



04.09.25	Muntatge armadura i encofrat nou mur riera	
05.09.25	Formigonat a 1 m primera tongada mur	

Codi Segur de Verificació: e25acdb5-95af-42f2-822d-eb77e29258ca
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082114_2025_6073262
Data d'impressió: 12/11/2025 11:17:35
Pàgina 11 de 15

SIGNATURES
1.- Javier Olarte Oliva (TCAT), 03/10/2025 09:26



08.09.25	Desencofrat i preparació segona tongada mur.	
10.09.25	Ompliment terres sobre peu sabata. 60m³	



14.09.25	Encofrat i armadura restant de l'alçada del mur.	
19.09.25	Finalització encofrat apuntalat.	



20.09.25	Formigonat resta alçada del mur amb bomba.	



22.09.25	Desencofrat del mur. Moviment de terres per deixar terreny pla Finalització dels treballs.
----------	---





6. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Aquest tipus de contracte no requereix accés i tractament de dades o informació de caràcter personal per part del contractista.

7. ENTITAT PROPOSADA PER L'ADJUDICACIÓ

EMPRESA:	ACTIUM INSTALACIONES ESPECIALIZADAS Y REDES SLU.
ADREÇA	CARRER GALLEC, 68 PLANTA 11 PORTA 3 MOLLET DEL VALLÈS 08100 (BCN) t.930319078 aministracion@grupoactium.com
NIF:	B67165597
REPRESENTANT:	ANA SANTACRUZ MUÑOZ
NIF REPRESENTANT:	53.650.573-Z
POLISSA ASSEGURANÇA:	900.000€
RELI:	NO

8. CONCLUSIONS

1. Els fets descrits constitueixen una emergència acreditada, amb risc imminent per a la seguretat de persones, a les infraestructures de subministrament d'aigua i agràries.
2. Les actuacions són indispensables i inajornables, i no poden tramitar-se pels procediments ordinaris de contractació sense agreujar els danys.
3. Es proposa a l'òrgan de contractació dictar resolució ordenant l'adjudicació dels referits treballs realitzats a l'empresa ACTIUM INSTALACIONES ESPECIALIZADAS Y REDES SLU, amb càrrec a l'article 120 LCSP.

El que s'informa als efectes oportuns,

Xavier Olarte Oliva
Cap de la Unitat de Manteniment
ÀREA DE TERRITORI, TRANSICIÓ ECOLÒGICA i
PLANEJAMENT.

Sant Feliu de Llobregat, en la data de la signatura digital.

Document electrònic verificable a <http://www.santfeliu.cat/sde>



e25acdb5-95af-42f2-822d-eb77e29258ca

tmp2502049601998542913.doc
