



**Transports Metropolitans
de Barcelona**

Plec de Prescripcions Tècniques

Licitació de Subministrament

**Plec de prescripcions per al subministrament i la instal·lació de mòduls
prefabricats en règim de lloguer a la cotxera de TMB, Zona Franca Port.**

16141496

Juny 2026



ÍNDEX

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1- OBJECTE

1.2- DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI

2. MEMÒRIA TÈCNICA

2.1- PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES

3. AMIDAMENTS

4. CONDICIONS GENERALS

5. CRITERIS MEDIAMBIENTALS


6. PLÀNOLS

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 - OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions i l'abast del servei que cal tenir en compte per a la presentació d'ofertes per part de les empreses licitadores.

El servei objecte de licitació és el lloguer d'un conjunt de mòduls prefabricats per a un ús provisional al centre de Zona Franca Port, ubicada al xamfrà entre el carrer 3 i el carrer Z del sector de la Zona Franca de Barcelona.

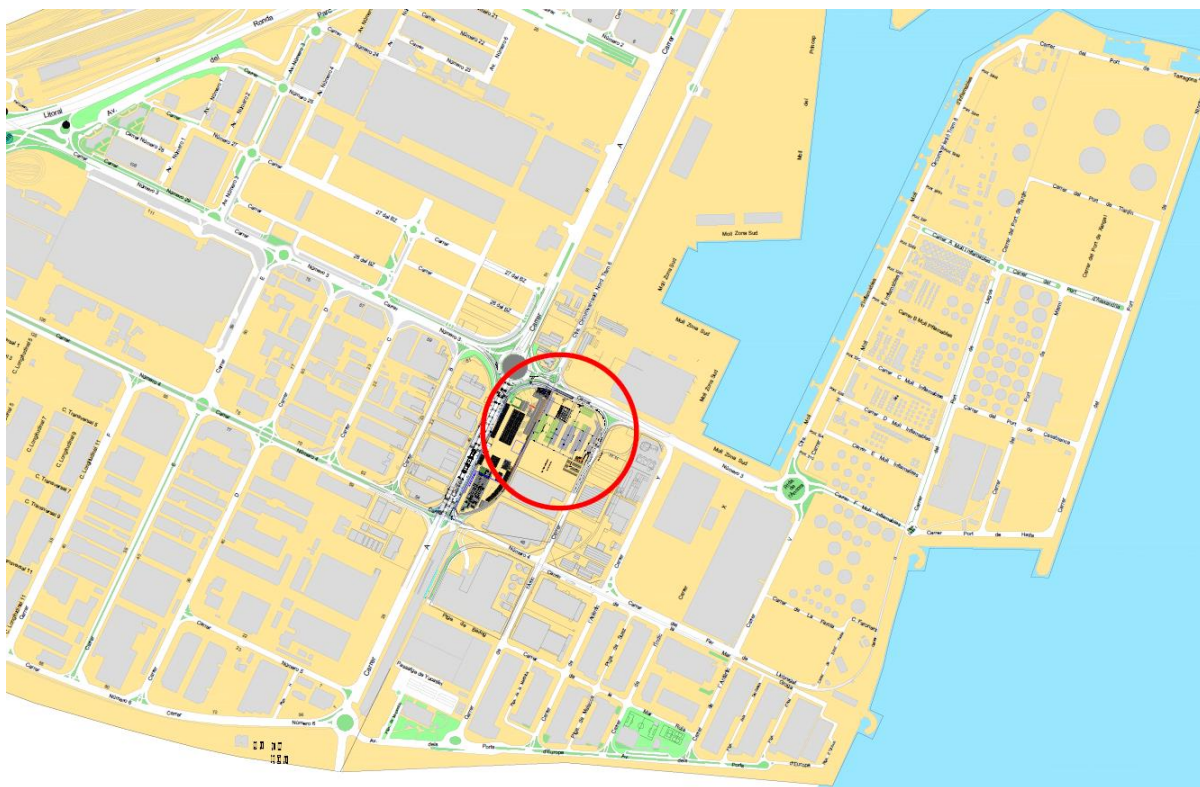

Plànol de Situació


Aquest servei està dins del grup CPV: 44211100 – EDIFICIS PREFABRICATS MODULARS.


1.2 - DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI

El centre de Zona Franca Port opera actualment com a cotxera i taller de manteniment d'autobusos elèctrics i de gas. Per garantir-ne l'operativitat i donar suport a les activitats associades al manteniment, emmagatzematge de materials i serveis al personal, es requereix la contractació del servei de subministrament, instal·lació i lloguer de mòduls prefabricats destinats a usos de magatzem, vestidors, serveis higiènics i zona d'estada-menjador.

Actualment, l'emplaçament objecte d'aquesta licitació disposa d'un conjunt de mòduls prefabricats que cobreixen provisionalment aquestes necessitats funcionals. Atès que la continuïtat d'aquests espais és necessària per al correcte desenvolupament de l'activitat del centre, es requereix la implantació d'un nou conjunt de mòduls prefabricats que mantingui les funcionalitats existents.

La proposta objecte de licitació s'haurà d'implantar dins l'àmbit actualment destinat a aquesta finalitat, d'acord amb els condicionants d'espai i operativitat definits per TMB.

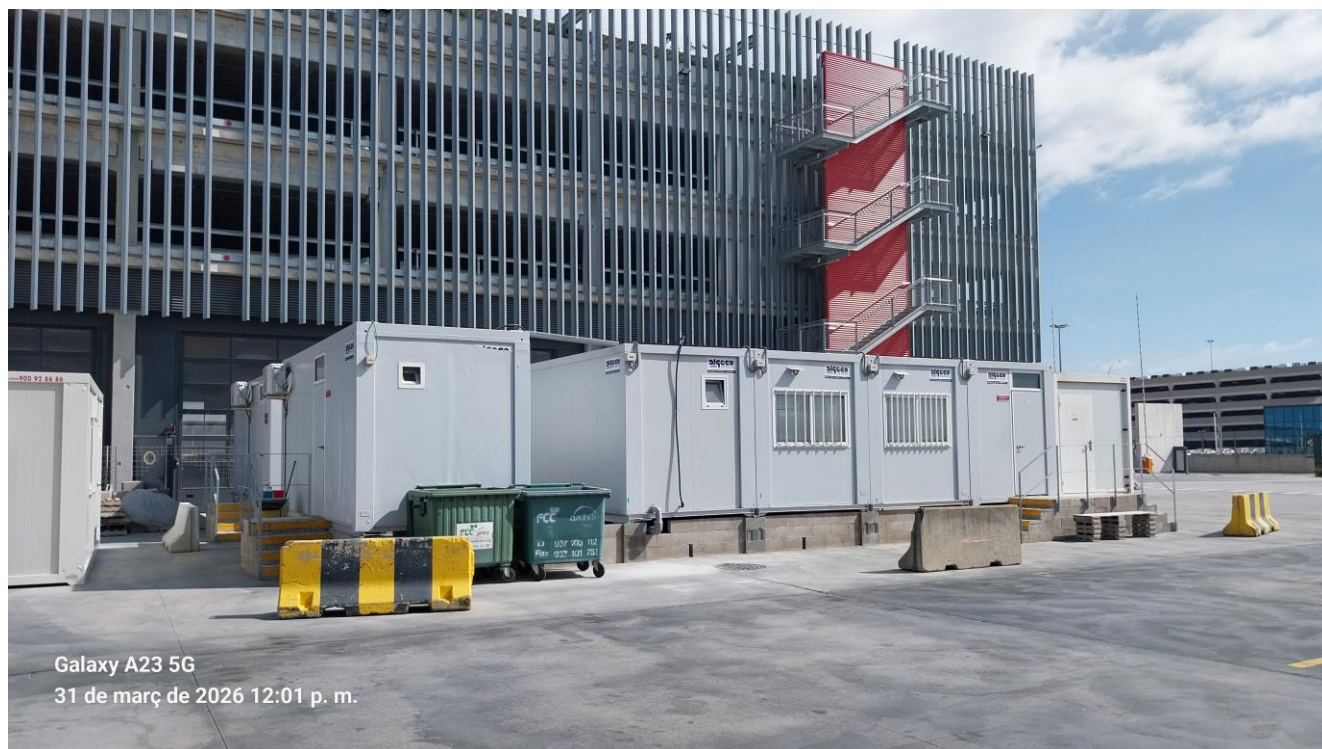

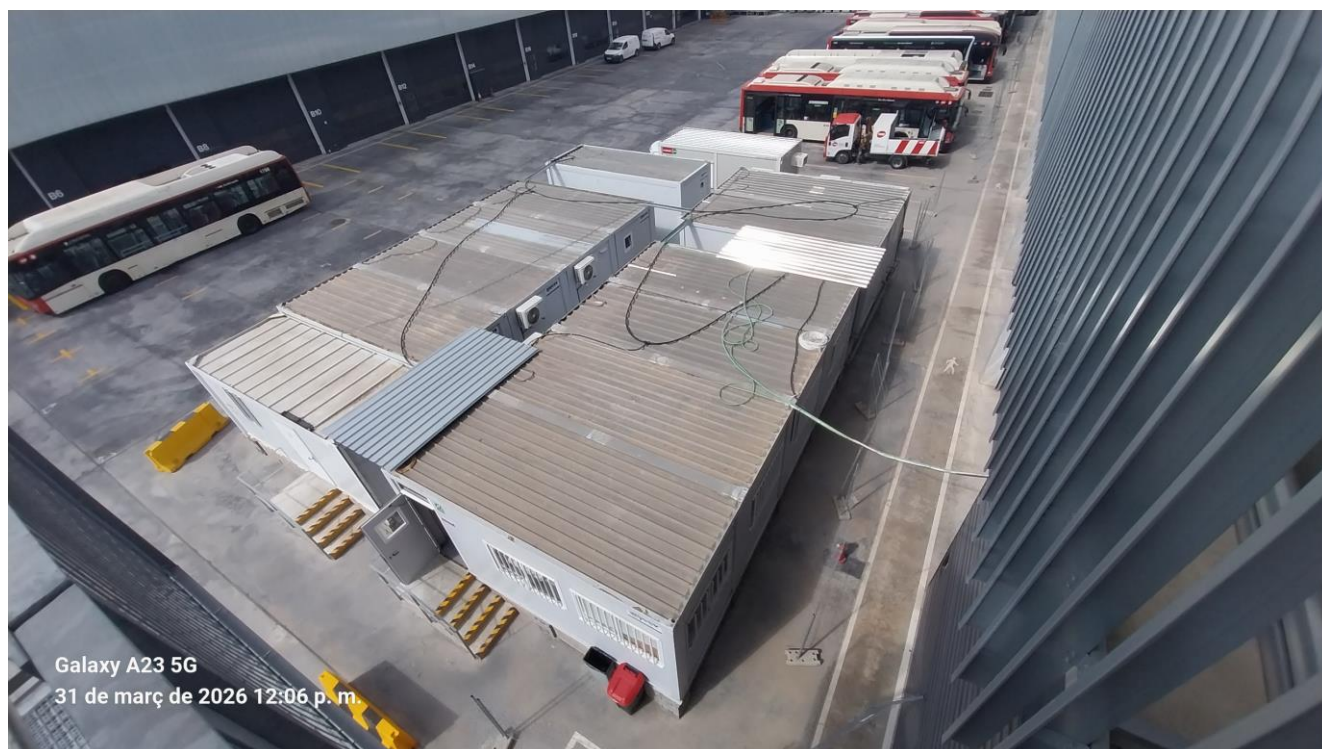

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

L'objecte d'aquest contracte: Lloguer, transport, muntatge i desmuntatge del conjunt de mòduls prefabricats.

Lloc: centre de Zona Franca Port.

DURACIÓ DE CONTRACTE

S'estableix la següent duració inicial del contracte: 1 any

Possibles pròrrogues del contracte:

- 2 pròrrogas d' 1 any
- 4 pròrrogas de 6 mesos

La duració màxima del contracte incloues pròrrogues (en cas de ser necessàries) seria de 5 anys.

El conjunt de construccions prefabricades estarà format per:

- Mòduls prefabricats destinats a la zona de vestidors i serveis higiènics (WC), amb espais per a ús masculí i femení.
- Mòduls prefabricats destinats a la zona d'estada i menjador.
- Mòduls prefabricats destinats a serveis higiènics
- Mòdul prefabricat estàndard d'oficina

A la Taula 1 es detallen les dimensions orientatives i les superfícies totals requerides.

ÚS	QUANTITAT	DIMENSIONS APROXIMADES (*) Variació segons proveïdor	SUPERFÍCIE APROXIMADA PER MÒDUL	SUPERFÍCIE TOTAL REQUERIDA (mínima a proporcionar)
Vestidors femení	1	6.210 x 2.440 mm, H = 2.500 mm	15,15 m ²	15,15 m ²
WC femení	1	6.210 x 2.440 mm, H = 2.500 mm	15,15 m ²	15,15 m ²
Vestidors masculí	4(*)	6.210 x 2.440 mm, H = 2.500 mm (*) Dimensiones de mòduls Incorporats 6.210 x 9.760 mm, H = 2.500 mm	15,15 m ²	60,6 m ²
WC masculí	1	6.210 x 2.440 mm, H = 2.500 mm	15,15 m ²	15,15 m ²
Zona d'estada i menjador	4(*)	6.210 x 2.440 mm, H = 2.500 mm (*) Dimensiones de mòduls Incorporats 6.210 x 9.760 mm, H = 2.500 mm	15,15 m ²	60,6 m ²
Oficina TMMB	1	6.210 x 2.440 mm, H = 2.500 mm	15,15 m ²	15,15 m ²

(*) La zona estar-menjador i els vestidors masculins es considera la incorporació de quatre mòduls estàndard amb la finalitat de complir la superfície de 60,6m²

Taula 1. Superfície requerida en centre per ús

NOTA: Les dimensions són referències considerant la infraestructura actual. L'empresa contractant haurà de complir amb la superfície total requerida.

S'haurà de considerar el lloguer dels equipaments descrits a continuació:

- Extintor en pols de 6 kg (1 unitat)
- Panell SPLIT fins a 3.000 frigories (1 unitat per caseta, a excepció del mòdul dutxes masculines, que incoporen dos escalfadors de 200L)
- Pack zona estar - menjador inclou: 1 aigüera,
- Pack lavabo (1 unitat), inclou: 1 dispensador de tovalloletes per assecat de mans, 1 dispensador de sabó, 1 paperera

- Pack bany (1 unitat / bany), cada unitat inclou: 1 portarolls, 1 raspall de WC
- Packs de nivellació d'acord amb la necessitat dels mòduls proposats per l'adjudicatari

Període de vigència del contracte: la durada del contracte de lloguer serà com a mínim de 12 mesos, amb possibilitat d'ampliació prèviament acordada amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Un cop s'hagin habilitat els espais corresponents de l'edifici d'oficines, actualment en construcció, l'entitat contractant avisarà el contractista amb un període mínim d'un mes d'antelació perquè gestioni el desmuntatge dels mòduls.

L'entitat contractant no resta obligada a exhaurir el valor estimat del contracte atès que s'està gestionant l'habilitació de l'edifici d'oficines i, quan aquest sigui operatiu, deixarà de ser necessari mantenir els mòduls.

Condicions tècniques:

- Es disposa de base anivellada per al suport dels mòduls
- Es disposa de subministrament elèctric, aigua i connexió a la xarxa de sanejament
- El client realitzarà la neteja del mòdul i de les instal·lacions
- El servei ofert ha de disposar d'assegurança sobre el material objecte de lloguer
- **El servei d'assistència haurà d'estar inclòs en l'oferta**

2. MEMÒRIA TÈCNICA

2.1 - PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES

2.1.1 VESTIDORS FEMENÍNS

El mòdul prefabricat per a un ús de WC femení ha de tenir una superfície total mínima de 15,15 m2 aproximadament. S'hi inclou:

Transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i transport per a la retirada del mòdul prefabricat

- Transport, lliurament, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de WC de superfície total aproximada 15,15 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).
- S'han de considerar tots els costos necessaris per a realitzar el transport de lliurament, instal·lació del mòdul; el desmuntatge i transport de retirada un cop finalitzat el període de lloguer.
- Mòdul col·locat segons les especificacions de la DT.

Lloguer de mòdul prefabricat WC femení

- Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de vestidors de superfície total aproximada 15,15 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).

Característiques constructives:

Els mòduls han de disposar de tancaments perimetrals amb aïllament interior mínim de 40 mm de gruix.

Paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre.

Equipament interior:

Instal·lació elèctrica: punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial.

Instal·lació de climatització interior dimensionada per cobrir les necessitats d'ús.

Equipament sanitari: -

Haurà d'incloure: -

Incloent sistema de renovació de l'aire interior (natural o mecànic).

El mòdul es col·locarà segons les especificacions de la DT.

2.1.2 WC FEMENÍ

El mòdul prefabricat per a un ús de WC femení ha de tenir una superfície total mínima de 15,15 m2 aproximadament. S'hi inclou:

Transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i transport per a la retirada del mòdul prefabricat

- Transport, lliurament, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de WC de superfície total aproximada 15,15 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).
- S'han de considerar tots els costos necessaris per a realitzar el transport de lliurament, instal·lació del mòdul; el desmuntatge i transport de retirada un cop finalitzat el període de lloguer.
- Mòdul col·locat segons les especificacions de la DT.

Lloguer de mòdul prefabricat WC femení

- Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de vestidors de superfície total aproximada 15,15 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).

Característiques constructives:

Els mòduls han de disposar de tancaments perimetrals amb aïllament interior mínim de 40 mm de gruix.

Paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre.

Equipament interior:

Instal·lació elèctrica: punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial.

Instal·lació de climatització interior dimensionada per cobrir les necessitats d'ús.

Equipament sanitari: (1) WC i (2) lavabos i (1) dutxa.

Haurà d'incloure: (2) Pack lavabo cadascun d'ells amb: 1 dispensador de tovalloletes d'assecat de mans, 1 dispensador de sabó, paperera, (1) suport de paper higiènic, 1 paperera sanitària, 1 escombreta.

Incloent sistema de renovació de l'aire interior (natural o mecànic).

El mòdul es col·locarà segons les especificacions de la DT.

2.1.3 CONJUNT DE MÒDULS VESTIDORS MASCULINS

El conjunt de mòduls prefabricat per a un ús de vestidors masculins ha de tenir una superfície total mínima de 60,6 m2 aproximadament. S'hi inclou:

Transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i transport per a la retirada del mòdul prefabricat

- Transport, lliurament, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de WC de superfície total aproximada 15,15 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).
- S'han de considerar tots els costos necessaris per a realitzar el transport de lliurament, instal·lació del mòdul; el desmuntatge i transport de retirada un cop finalitzat el període de lloguer.
- Mòdul col·locat segons les especificacions de la DT.

Lloguer de conjunt de mòduls prefabricat vestidors masculins

- Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de vestidors de superfície total aproximada 60,6 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).

Característiques constructives:

Els mòduls han de disposar de tancaments perimetrals amb aïllament interior mínim de 40 mm de gruix.

Paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre.

Equipament interior:

Instal·lació elèctrica: punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial.

Instal·lació de climatització interior dimensionada per cobrir les necessitats d'ús.

Equipament sanitari: (6) dutxes incloent dos escalfadors de 200L

Haurà d'incloure: -

Incloent sistema de renovació de l'aire interior (natural o mecànic).

El mòdul es col·locarà segons les especificacions de la DT.

2.1.4 WC MASCULÍ

El mòdul prefabricat per a un ús de WC masculí ha de tenir una superfície total mínima de 15,15 m² aproximadament. S'hi inclou:

Transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i transport per a la retirada del mòdul prefabricat

- Transport, lliurament, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de WC de superfície total aproximada 15,15 m² (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).
- S'han de considerar tots els costos necessaris per a realitzar el transport de lliurament, instal·lació del mòdul; el desmuntatge i transport de retirada un cop finalitzat el període de lloguer.
- Mòdul col·locat segons les especificacions de la DT.

Lloguer de mòdul prefabricat WC masculí

- Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de vestidors de superfície total aproximada 15,15 m² (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).

Característiques constructives:

Els mòduls han de disposar de tancaments perimetrals amb aïllament interior mínim de 40 mm de gruix.

Paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre.

Equipament interior:

Instal·lació elèctrica: punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial.

Instal·lació de climatització interior dimensionada per cobrir les necessitats d'ús.

Equipament sanitari: (6) WC i (4) lavabos.

Haurà d'incloure: (4) Pack lavabo cadascun d'ells amb: 1 dispensador de tovalloletes d'assecat de mans, 1 dispensador de sabó, paperera

Incloent sistema de renovació de l'aire interior (natural o mecànic).

El mòdul es col·locarà segons les especificacions de la DT.

2.1.5 CONJUNT DE MÒDULS ZONA D'ESTADA I MENJADOR

Conjunt de mòduls prefabricats per a ZONA D'ESTAR - MENJADOR amb una superfície total de 60,6 m2 aproximadament. S'inclou:

Transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i transport per a la retirada del mòdul prefabricat

- Transport, lliurament, retirada, muntatge i desmuntatge de conjunt de mòduls prefabricats per a un ús de menjador i zona d'estar de superfície total aproximada 30,30 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).
- S'han de considerar tots els costos necessaris per a realitzar el transport de lliurament, instal·lació del mòdul; el desmuntatge i transport de retirada un cop finalitzat el període de lloguer.
- Conjunt de mòduls col·locats segons les especificacions de la DT.

Lloguer de mòdul prefabricat menjador

- Lloguer de conjunt de mòduls prefabricats per a ZONA D'ESTAR - MENJADOR de superfície total aproximada 60,6 m2 (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).

Característiques constructives:

Els mòduls han de disposar de tancaments perimetrals amb aïllament interior mínim de 40 mm de gruix.

Paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre.

Equipament interior:

Instal·lació elèctrica: punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial.

Instal·lació de climatització interior dimensionada per cobrir les necessitats d'ús.

Ha de disposar de moble per a aigüera, inclosa aigüera amb un sifó i zona d'escorredor.

Incloent sistema de renovació de l'aire (natural o mecànic).

Conjunt de mòduls col·locat segons les especificacions de la DT.

2.1.6- MÒDUL PREFABRICAT ESTÀNDARD OFICINA TMMB

El mòdul prefabricat per a un ús de WC masculí ha de tenir una superfície total mínima de 15,15 m² aproximadament. S'hi inclou:

Transport, lliurament, muntatge, desmuntatge i transport per a la retirada del mòdul prefabricat

- Transport, lliurament, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de WC de superfície total aproximada 15,15 m² (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).
- S'han de considerar tots els costos necessaris per a realitzar el transport de lliurament, instal·lació del mòdul; el desmuntatge i transport de retirada un cop finalitzat el període de lloguer.
- Mòdul col·locat segons les especificacions de la DT.

Lloguer de mòdul prefabricat WC masculí

- Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de vestidors de superfície total aproximada 15,15 m² (adaptable segons les dimensions dels mòduls del fabricant).

Característiques constructives:

Els mòduls han de disposar de tancaments perimetrals amb aïllament interior mínim de 40 mm de gruix.

Paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre.

Equipament interior:

Instal·lació elèctrica: punts de llum, interruptors, endolls i protecció diferencial.

Instal·lació de climatització interior dimensionada per cobrir les necessitats d'ús.

Incloent sistema de renovació de l'aire interior (natural o mecànic).

El mòdul es col·locarà segons les especificacions de la DT.

3. AMIDAMENTS

Es presenta a continuació l'estat d'amidaments dels objectes d'intervenció.

Els licitadors hauran d'aportar la valoració econòmica desglossada d'acord amb els conceptes indicats a la taula següent per a la durada inicial del contracte de 12 mesos:

	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	TOTAL
CONSTRUCCIONS PREFABRICADES MODULARS				
01. LLOGUER DE MATERIALS I EQUIPAMENTS				
Mes	1 mòdul prefabricat de vestidors femenins (15,15 m²)	12 mesos	- €	- €
Mes	1 x Pack vestuari, inclou: 2 bancs 1 guixetes 1 papelera	12 mesos	- €	- €
Mes	1 mòdul prefabricat de WC femenins (15,15 m²)	12 mesos	- €	- €
Mes	1 x Pack lavabo, inclou: 1 dispensador de tovalloletes d'assecat de mans, 1 dispensador de sabó 1 paperera	12 mesos	- €	- €
Mes	4 mòduls prefabricats de zona vestuari masculí (60,6 m²)	12 mesos	- €	- €
Mes	6 zones de 5m lineals de guixetes amb tancament per candau 3 bancs de vestuari de 2m cadascun	12 mesos	- €	- €
Mes	1 mòdul prefabricat de WC masculí (15,15 m²)	12 mesos	- €	- €
Mes	4 x Pack lavabo, inclou: 1 dispensador de tovalloletes d'assecat de mans, 1 dispensador de sabó 1 paperera	12 mesos	- €	- €
Mes	4 mòduls prefabricats de zona d'estar-menjador (60,6 m²)	12 mesos	- €	- €
Mes	1 x Pack de cuina, inclou: 1 aigüera amb zona de s'assecat 1 microondas 1 nevera petxeta	12 mesos	- €	- €
Mes	1 mòdul prefabricat de WC masculí (15,15 m²)			
Mes	Extintor de pols de 6 kg (1 unitat)	12 mesos	- €	- €
Mes	7 equips tipus Split fins a 3.000 frigories	12 mesos	- €	- €
unitat	Packs de nivellació segons les necessitats dels mòduls proposats per l'adjudicatari	12 mesos	- €	- €
02. SERVEI D'ASSISTÈNCIA				
UD	Servei d'assistència: cobreix els danys dels mòduls i de la resta de material arrendat que no impliquin dol o negligència del client	12 unitats	- €	- €
03. INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE				
global	Transport de lliurament dels mòduls prefabricats	1 global	- €	- €
global	Treballs d'instal·lació dels mòduls prefabricats	1 global	- €	- €

global	Transport de retirada dels mòduls prefabricats	1 global	- €	- €
global	Desmuntatge dels mòduls prefabricats	1 global	- €	- €
	TOTAL PRESSUPOST			- €

4. CONDICIONS GENERALS

Control dels treballs

Els amidaments i les quantitats indicades per Transports de Barcelona (TMB) per a l'inici de les obres són únicament orientatius. L'adjudicatari haurà d'efectuar els amidaments i replantejaments necessaris.

Materials

Les zones d'acopiament de materials i els contenidors de residus d'obra hauran de ser consensuats prèviament amb el tècnic responsable de TMB.

La maquinària i els sistemes d'elevació aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Personal

El personal de l'adjudicatari haurà d'estar degudament donat d'alta i disposar de les cobertures de la Seguretat Social i de les mutualitats que corresponguin a les tasques que realitzi.

El contractista comunicarà el nom de la persona responsable permanent de l'obra.

A tots els efectes, el personal subcontractat serà considerat per TMB com a personal de l'adjudicatari.

En qualsevol cas, s'estarà al que estableix el Reial decret 171/2004 sobre Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

Horari de treball

Atesa la condició de servei públic, cada treball s'haurà de realitzar en l'horari que ocasioni les mínimes molèsties al centre i haurà de supeditar-se als treballs imprescindibles de manteniment general de les instal·lacions.

La durada dels treballs serà l'establerta segons la planificació prevista.

Treballs no previstos

Si cal efectuar treballs no previstos a les partides del pressupost, aquests es realitzaran amb l'acord previ i específic, en cada cas, entre l'adjudicatari i el tècnic responsable de TMB.

Termini de lliurament

El termini de lliurament s'establirà en el moment de l'adjudicació dels treballs.

Finalització de l'obra



L'obra es considerarà finalitzada quan, un cop executats tots els treballs i retirats tots els materials i eines, l'adjudicatari presenti les possibles diferències entre els treballs previstos i els efectivament realitzats, així com la seva valoració econòmica.

Aquesta relació es compararà amb els controls efectuats pel tècnic responsable de TMB i, un cop efectuades les modificacions que siguin necessàries, si escau, es formalitzarà una Acta de Recepció com a document acreditatiu de la finalització de l'obra.

Diversos

Per tal d'evitar duplicitats, unificar criteris i garantir un millor control tant dels treballs com dels costos, així com una correcta planificació general, la persona en qui delegui l'adjudicatari haurà d'adreçar-se al tècnic responsable de TMB o a la persona que TMB designi com a coordinador, per a totes aquelles consultes i aclariments que siguin necessaris, així com per sol·licitar les autoritzacions corresponents en cas d'ampliacions o modificacions del que s'hagi previst.

Garantia dels materials utilitzats i dels treballs executats

Els materials quedaran garantits durant el període establert pel fabricant, que en cap cas serà inferior a un any.

S'estableix un període d'un any de garantia per assegurar l'absència de defectes ocults en l'execució dels treballs.

Adequació a la normativa de Seguretat i Salut

El contractista, quan sigui necessari, es compromet a elaborar el Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, dins dels terminis indicats per TMB i, en concret, seguint les directrius de l'empresa coordinadora de seguretat i salut. Aquest pla s'haurà de presentar per a la seva aprovació al coordinador de seguretat i salut en fase d'execució que s'hagi designat.

El contractista té l'obligació de vetllar pel compliment i l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut, així com de seguir les instruccions del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució i aportar tota la documentació que aquest requereixi en matèria de seguretat i salut.

Documentació

El contractista, un cop finalitzada l'obra, haurà de presentar la documentació següent:

- Documentació gràfica (plànols, esquemes).
- Homologacions i/o certificacions.
- Manuals i pla de manteniment.

Aquesta documentació haurà de formar part del pressupost com una partida independent degudament valorada.

En cas d'incongruència entre la documentació tècnica del projecte, prevaldrà aquella que estableixi els requisits de major qualitat entre els diferents documents.

Documentació de control de qualitat

Durant l'execució de l'obra, el contractista haurà de presentar a TMB la documentació relativa al control de qualitat, així com les fitxes tècniques i els certificats que la Direcció d'Obra sol·liciti.

Protecció de dades

Si, en el desenvolupament del present contracte, fos necessària la comunicació de dades entre ambdues organitzacions, aquesta comunicació s'entendrà realitzada en el marc del present contracte d'arrendament de subministraments i exclusivament per al correcte desenvolupament d'aquest.

Així mateix, l'entitat receptora de les dades garanteix a l'entitat emissora que únicament tractarà les dades amb la finalitat de donar compliment a les estipulacions de l'arrendament de subministraments, eliminant totes les dades aportades un cop hagin deixat de ser pertinents per a aquesta finalitat.

Ambdues parts garanteixen que les dades comunicades seran tractades en els seus sistemes d'informació, complint les mesures de seguretat i els requisits legals establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Ambdues parts es comprometen a no comunicar dades de caràcter personal a tercers, llevat que existeixi una obligació legal, que s'hagi autoritzat expressament i per escrit pel responsable del tractament, o que aquesta comunicació sigui necessària per al compliment del present contracte.

Coordinació d'activitats empresarials

L'adjudicatari haurà de dur a terme la Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) que estableixi el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Transports de Barcelona, SA.

L'adjudicatari es compromet a avaluar els riscos dels llocs de treball, formar i informar el personal afectat, i a donar compliment a totes les obligacions derivades de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària haurà d'aplicar els procediments i requisits de prevenció de riscos laborals establerts als centres de treball de Transports de Barcelona, SA.

L'adjudicatari haurà d'informar dels riscos específics associats a la intervenció o al servei que s'hagi de prestar.

5. CRITERIS MEDIAMBIENTALS

Criteri	Descripció	Condicionants
EMBALATGES - no primaris material reciclat	Els embalatges no primaris (*) dels productes estaran fabricats al 100 % a partir de materials reciclats. (1 embalatge addicional al del propi material per a la distribució final del producte)	En cas que el subministrament se serveixi amb embalatges no primaris.
Etiqueta ambiental dels vehicles	Els vehicles (turismes o furgonetes) que donin el servei en aquest contracte hauran de tenir adjudicada l'etiqueta ambiental tipus C com a mínim.	Per a serveis que requereixin de l'ús de vehicles (turismes o furgonetes). Aquest criteri serà d'aplicació quan es tinguin previstos almenys 20 serveis/any.



6. PLÀNOLS

Documentació gràfica de l'emplaçament del projecte

AMBIT OBRA EO

AMBIT OBRA EO

MB: 51.57

MA: 51.74

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990
