



ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT

**Projecte bàsic i executiu de reordenació de les cobertes de la casa
Solterra**

C/ Ciutadans 18, 17004 Girona

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TÈCNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
	Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4ZrduMcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01	Visat: 2022401461	Data: 30-06-2022
---	--	--------------------------	------------------

Arquitectes:
Codiestudi Equip Tècnic, S.L.P

David Codinach i Sala
David Aubert i Batlle
Aina Santiago Garcia

Promotor:
Departament de cultura de la
Generalitat de Catalunya

ÍNDEX

MG 1 Identificació i objecte del projecte

MG 2 Agents del projecte

MG 3 Estudi Bàsic Seguretat i Salut

MG 4 Documentació gràfica. Plànols.

MG 5 Normativa aplicable

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 ArquitectesCODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01
Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
Visat: 2022401461	
Data: 30-06-2022	

MG 1 Identificació i objecte del projecte

Títol del projecte: Estudi bàsic de seguretat i salut de reordenació de les cobertes de la casa Solterra

Objecte de l'encàrrec: Desenvolupar el projecte bàsic de seguretat i salut per rebre la llicència d'obres municipal.

Situació: Carrer Ciutadans, número 18, Girona 17004

Referència cadastral: 5782106DG8458B0001DA

MG 2 Agents del projecte

Promotor: *Nom:* Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya

CIF: S0811001G

Representant: Aleix Costa

Adreça: C/ de la Rambla, 8. 08002 Barcelona

Telèfon: 677281597

Mail: aleixcosta@gencat.cat

Arquitecte: *Nom:* Codiestudi Equip Tècnic, S.L.P
nº col·legiat: SP013053
NIF: B55309538

David Codinach Sala
nº col·legiat: CAT0091
DNI: 77918220Q

David Aubert Batlle
nº col·legiat: CAT0092
DNI: 40341724T

Aina Santiago Garcia
nº col·legiat: CAT0090
DNI: 43542666D

Direcció fiscal: c/ Joaquim Pla i Cargol, nº 1 2º, 17004 Girona

Telèfon: 972 68 55 00

Mail: info@elsdelrepla.com

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TÈCNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA	
	Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01	Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022

MG 3 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdu/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01
Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022	

Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

Reordenació de les cobertes de la casa Solterra

Emplaçament:

C/Ciutadans, 18 de Girona (17004)

Superfície construïda:

188,65m²

Promotor:

Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

Codiestudi Equip Tècnic, S.L.P NIF: B55309538

David Codinach Sala n° col·legiat: 43739-5 DNI: 77918220Q

David Aubert Batlle n° col·legiat: 72683-4 DNI: 40341724T

Aina Santiago Garcia n° col·legiat: 72688-5 DNI: 43542666D

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Codiestudi Equip Tècnic, S.L.P NIF: B55309538

David Codinach Sala n° col·legiat: 43739-5 DNI: 77918220Q

David Aubert Batlle n° col·legiat: 72683-4 DNI: 40341724T

Aina Santiago Garcia n° col·legiat: 72688-5 DNI: 43542666D

DADES TÈNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

Topografia:

Topografia de l'entorn sense desnivell que afecti a l'obra. Actuació a la quarta planta de l'edifici (planta coberta).

Característiques del terreny:

Barri vell de Girona.

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:

Barri vell de Girona amb carrers estrets i edificis de planta baixa+4. Accés per a vehicles restringit.

Instal·lacions de serveis públics:

La parcel·la disposa de tots els serveis.

Tipologia de vials:

Vial d'un sol carril i d'una sola direcció, pavimentat però estret. Vial amb dues voreres amb un total de 5 metres.

Accés per a vehicles restringit.



Estudi Bàsic De Seguretat I Salut
REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA
Emplaçament: Dels Ciutadans, 18
Municipi: Girona - 17004
Arquitectes CODIESTUDI EQUIP TÈCNIC SLP,
CODINACH I SALA, DAVID
SANTIAGO GARCIA, AINA

Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA	
	Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkda6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01	Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixi

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA	
	Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkda6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01	Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Altres

Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures
- Bolcada de piles de material

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
	Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc=
Hash COAC: qkda6YKvc+Svb/KOdVLOEOjPFk=
Ref: COAC-2022401461-263286-01

Visat: 2022401461

Data: 30-06-2022

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Enderrocs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
- Altres

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
- Altres

Fonaments

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalços
- Generació excessiva de pols



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc=
Hash COAC: qkda6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk=
Ref: COAC-2022401461-263286-01

Estudi Bàsic De Seguretat I Salut
REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA
Emplaçament: Dels Ciutadans, 18
Municipi: Girona - 17004
Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP,
CODINACH I SALA, DAVID
SANTIAGO GARCIA, AINA

Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Visat: 2022401461

Data: 30-06-2022

- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Estructura

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials
- Altres

Ram de paleta

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Coberta

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
	Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	

Visat: 2022401461

Data: 30-06-2022

- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

Instal·lacions

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnel
- Treballs realitzats en immobles
- Treballs realitzats en cambres



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc=
Hash COAC: qkda6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk=
Ref: COAC-2022401461-263286-01

Estudi Bàsic De Seguretat I Salut
REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA
Emplaçament: Dels Ciutadans, 18
Municipi: Girona - 17004
Arquitectes CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP,
CODINACH I SALA, DAVID
SANTIAGO GARCIA, AINA

Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Visat: 2022401461

Data: 30-06-2022

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escaleres de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual

- Utilització de cassetes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixos de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge adequats per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat. La utilització del qual serà obligatòria. L'obra haurà de comptar amb la formació i capacitat suficient dels treballadors.

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01 Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

Veure Annex MG 5

En l'actual situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d'iniciar-se les obres estigui encara present aquest risc per a la salut, serà necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com a mínim, les mesures de protecció determinades pel Ministeri de Sanitat.

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01
Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022	

Notes:


© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016)

L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota l'ur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 ArquitectesCODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdu/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01
Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022	

MG 4 Documentació gràfica. Plànols

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA	
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdu/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01	Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Visat: 2022401461		Data: 30-06-2022

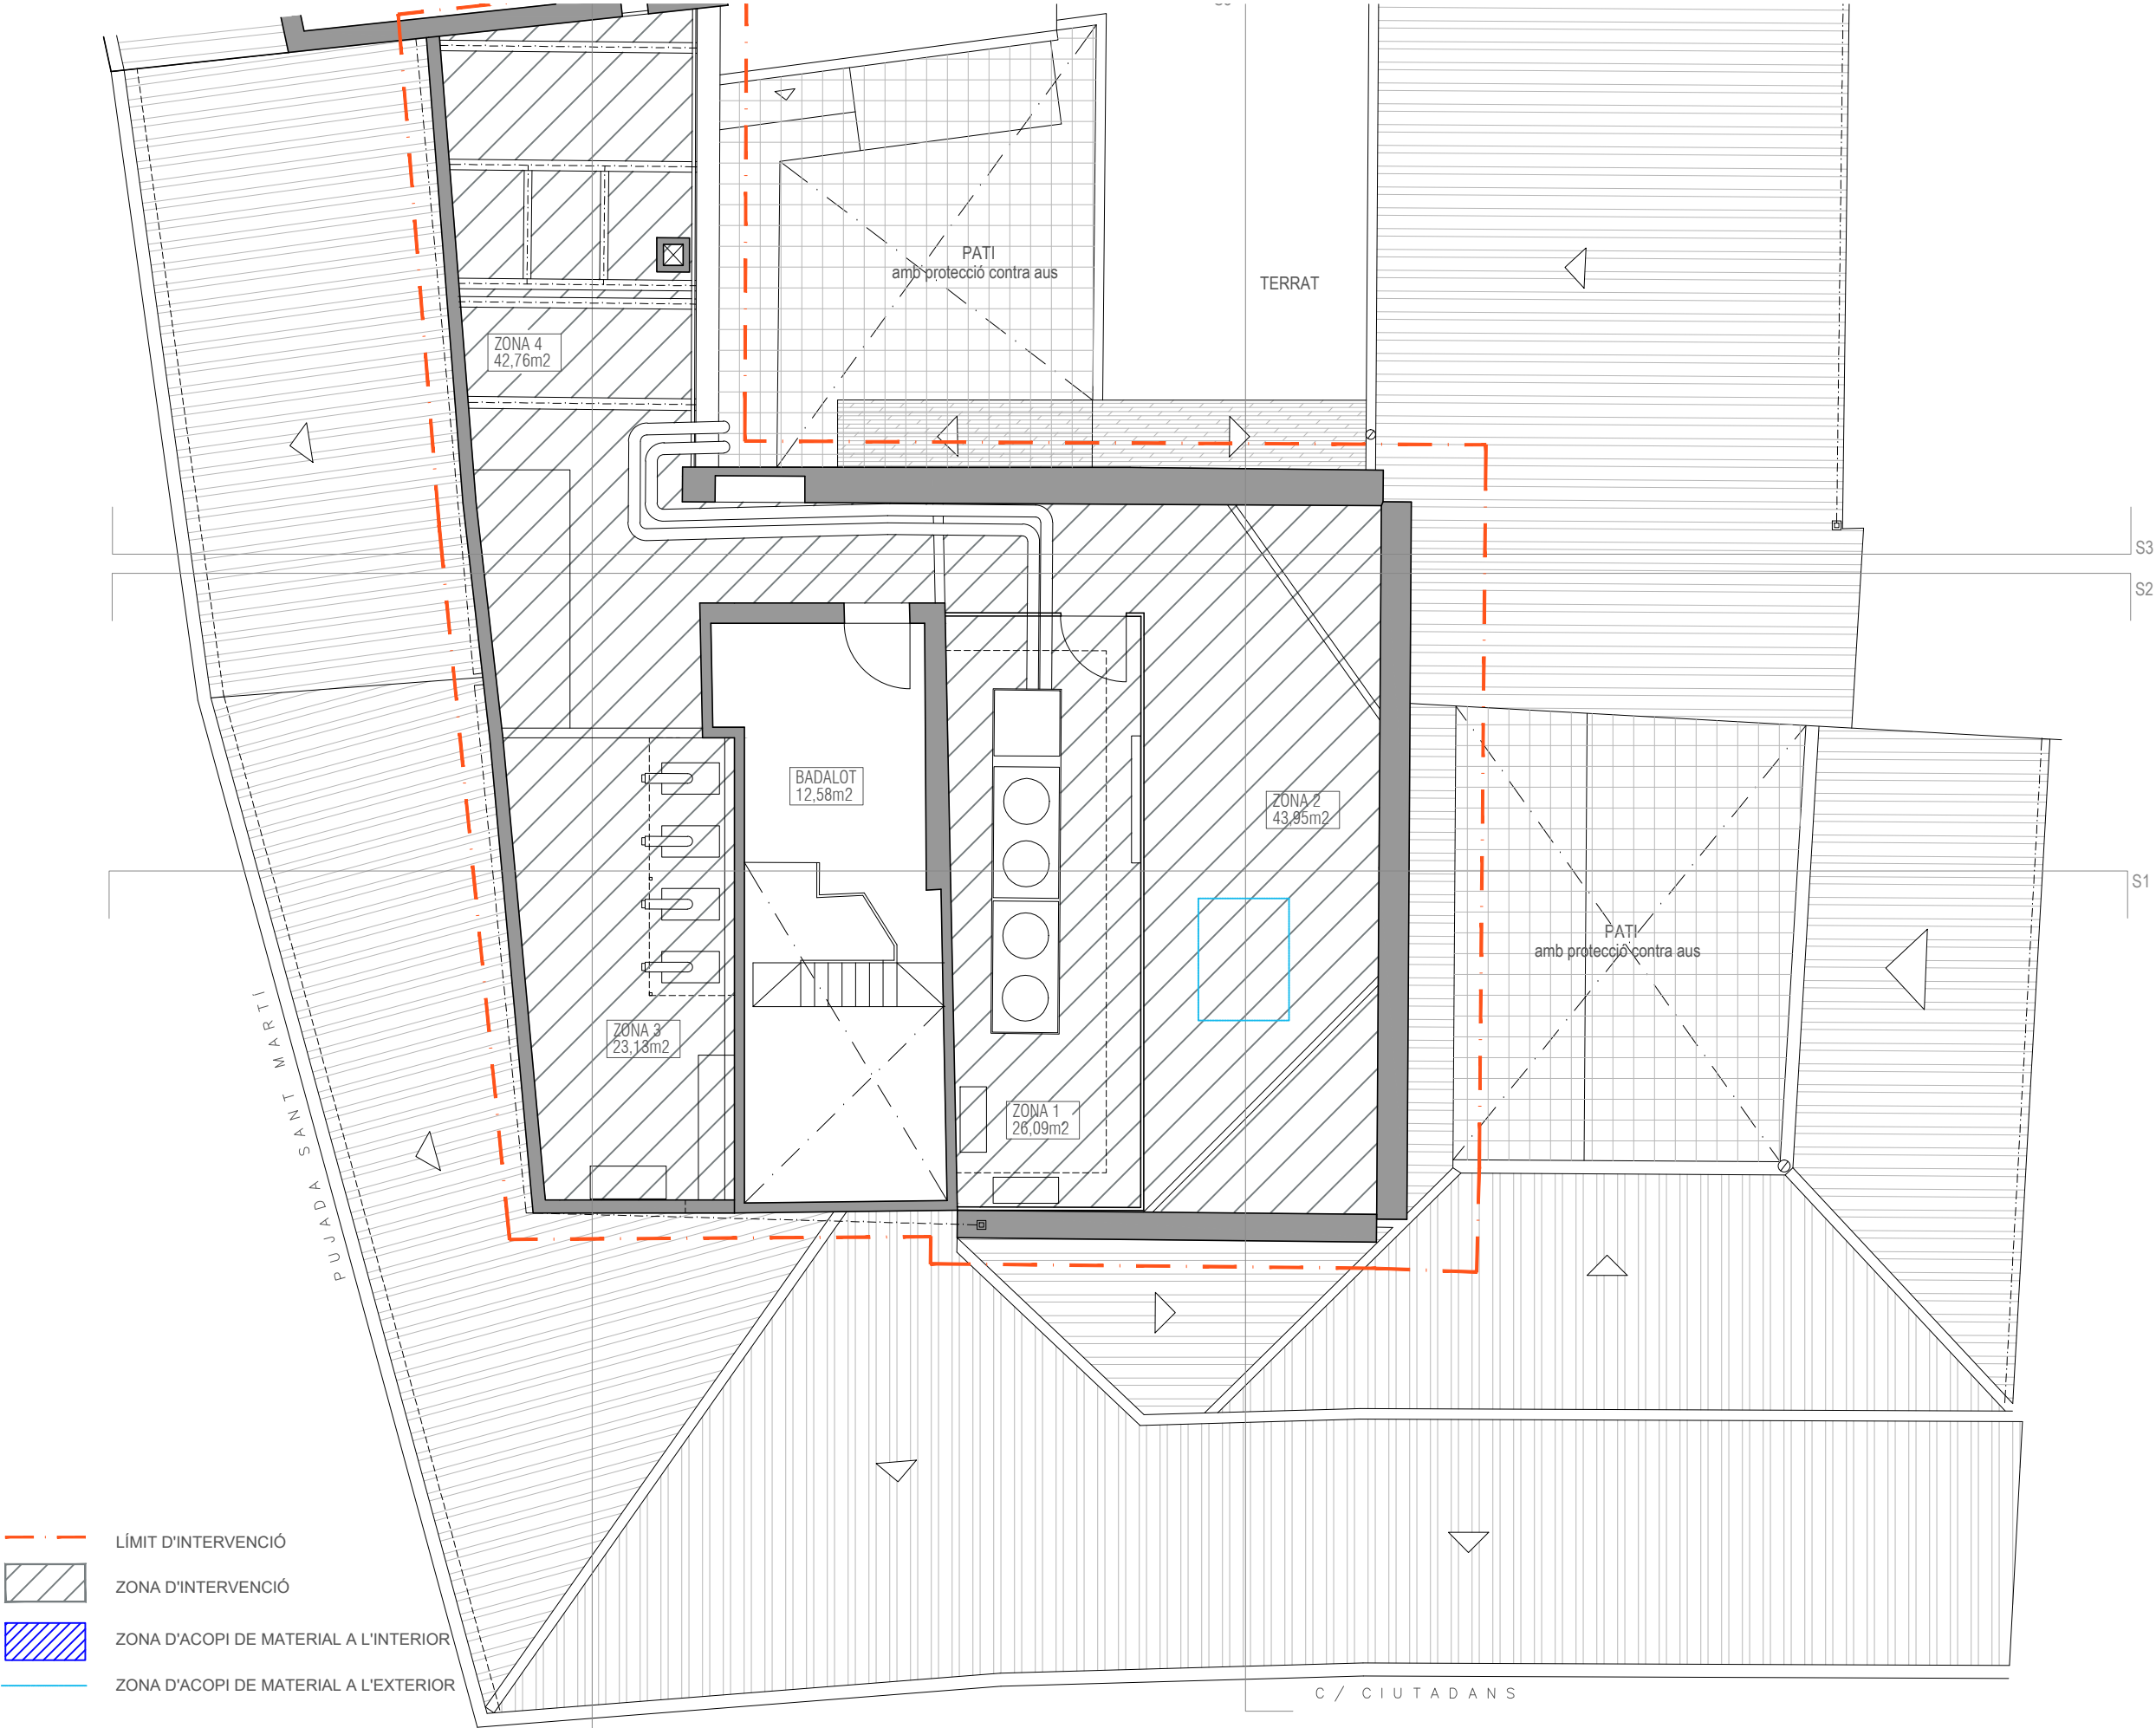

Estudi Bàsic De Seguretat I Salut

REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA

Ciutat de Girona, 18 de Girona, 17004

Municipi: Girona - 17004

Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TÈCNIC S.L.P.

CODINACH I SALA, DAVID

SANTIAGO GARCIA, AINA

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: J4EKDm2Ng4ZrdWky6Kn3fc=

Ref: COAC-2022401461-263286-01

Client: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Visat: 2022401461

Data: 30-06-2022

SS-02

Projecte bàsic i executiu	Codi intern	Plànol	Planta sota-coberta
Reordenació de les cobertes de la casa Soltterra, c/ Ciutadans, 18 de Girona 17004	22040	EBSS	(Les escales específiques indicades en detalls fan referència a plans format DIN A3)
CODIESTUDI EQUIP TÈCNIC, S.L.P.	NIF B55309538		
C/ Joaquim Pla i Cargol nº1, 2n 17004 Girona telf 972685500 info@codiestudi.com			
Arquitectes	David Aubert i Batlle (núm. COAC: 72683-4)	Aina Santiago Garcia (núm. COAC: 72688-5)	Client
David Codinach i Sala (núm. COAC: 43739-5)			Generalitat de Catalunya

Data

Maig 2022

Escala

DIN A1 e/1/50

DIN A3 e/1/100

MG 5 Normativa aplicable

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdu/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01
Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
Visat: 2022401461 Data: 30-06-2022	

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)	RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)



Estudi Bàsic De Seguretat I Salut
REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA
Emplaçament: Dels Ciutadans, 18
Municipi: Girona - 17004
Arquitectes CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP,
CODINACH I SALA, DAVID
SANTIAGO GARCIA, AINA

Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya

Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc=
Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk=
Ref: COAC-2022401461-263286-01

Visat: 2022401461

Data: 30-06-2022

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES	R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)



Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc=
Hash COAC: qkda6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk=
Ref: COAC-2022401461-263286-01

Estudi Bàsic De Seguretat I Salut
REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA
Emplaçament: Dels Ciutadans, 18
Municipi: Girona - 17004
Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TÈCNIC SLP,
CODINACH I SALA, DAVID
SANTIAGO GARCIA, AINA

Clients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Visat: 2022401461

Data: 30-06-2022

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
PROTECTORES AUDITIVOS	(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
PANTALLAS PARA SOLDADORES	(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO	(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

	Estudi Bàsic De Seguretat I Salut REORDENACIÓ DE LES COBERTES DE LA CASA SOLTERRA Emplaçament: Dels Ciutadans, 18 Municipi: Girona - 17004 Arquitectes: CODIESTUDI EQUIP TECNIC SLP, CODINACH I SALA, DAVID SANTIAGO GARCIA, AINA
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	Hash: J4EkDgnjzNg4Zrdt/Mcy6Kln3fc= Hash COAC: qkdaf6YKVc+Svb/KOdVLOEOjPFk= Ref: COAC-2022401461-263286-01
Cients: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
Visat: 2022401461	
Data: 30-06-2022	
