



AJUNTAMENT DE
Subirats

Ajuntament de Subirats
Plaça de l'1 d'octubre, s/n
08739 – Sant Pau d'Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT CONSISTENT EN L'ARRENDAMENT SENSE OPCIO DE COMPRA DE DOS MÒDULS PREFABRICATS DOBLES PER VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE SANT PAU D'ORDAL (SUBIRATS).

OBJECTE DEL SERVEI.

L'objecte del contracte és el subministrament consistent en l'arrendament sense opció de compra de dos mòduls prefabricats dobles per vestidors al Camp de Futbol Municipal de Sant Pau d'Ordal, de conformitat amb l'establert al plec de prescripcions tècniques.

El subministrament inclou els recursos humans i tècnics necessaris per al transport i instal·lació dels mòduls al Camp de Futbol Municipal Sant Pau d'Ordal, així com el muntatge i desmuntatge dels mòduls en la ubicació establerta.


DESCRIPCIÓ DELS MÒDULS PREFABRICATS.

Tipus de cada conjunt de vestidor: Mòdul doble per vestuaris col·lectius formats cada un per:

Una caseta modular de mides iguals o superiors a 14 m2 equipats amb un mínim de 4 dutxes, termo elèctric mínim 150 litres, 2 wc independents amb porta, i mínim dos lavabos complets.

Una caseta modular de mides iguals o superiors a 14 m2 connectada a la anterior. Aquesta caseta modular estarà equipada amb un aire condicionat.

EXEMPLE TIPUS DE PLANOL DISTRIBUCIÓ D'UN VESTIDOR DE MÒDUL DOBLE

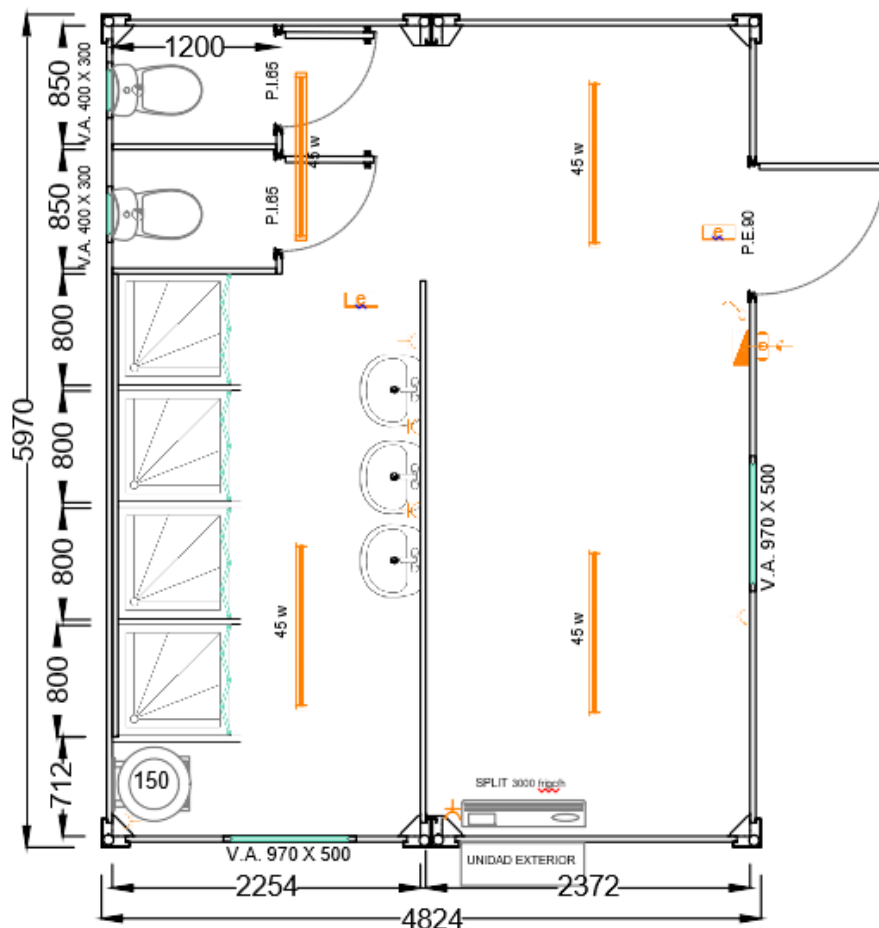

ESPECIFICACIONS TÈCNiques GENERALS

- Il·luminació natural amb zones translúcides però sense visió.
- Divisions interiors en 2 zones diferenciades: zona de dutxes, i vàter (tancat amb porta) i zona de canvi de roba.
- Altura interior mínima interior de 2,50 m.
- Paviment antilliscant.
- Divisions interiors 4 espais de dutxes, amb separacions visuals entre cada espai amb material fenòlic o similar. Preveure zona de recollida d'aigua a la zona exterior de les dutxes.
- Aixetes temporitzades per a instal·lació vista.
- Termos elèctrics vestuaris grups de mínim 150 litres.
- Aparell d'aire acondicionat a la zona de canvi de roba

ESPECIFICACIONS TÈCNiques MÍNIMES DELS MÒDULS

CODI DE L'EXPEDIENT: 446 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_446_LICITACIO SERVEI DE LLOGUER DE DOS MODULS DE VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL DE SANT PAU



- Estructura autoportant metàl·lica galvanitzada i pintada en blanc RAL 9002
- Coberta de xapa perfilada amb aïllament
- Terra contraxapat fenòlic amb aïllant inferior
- Panells interiors i exteriors tipus Sandwich amb un gruix mínim de 40mm
- Instal·lació elèctrica completa amb quadre general, il·luminació led amb pantalles estanques. Preses de corrent situades en els pilars a força de caixes cargolades i cablesebornats i situats a una alçada convenient. Amb la instal·lació de cables oculta a través de les lames del sostre.
- Mínim 2 finestres abatibles correderes d'alumini lacades en blanc
- 1 porta metàl·lica accés exterior mínim de 0.90 x2.06m en color blanc amb pany i manivela
- Vestidor amb 2 inodors amb porta rotllos. Mínim 2 lavabos amb peu, aixetes cromades, degudament instal·lats, i mirall. 4 dutxes mínim de 0.80x0.80m en color blanc amb grifaria inclosa
- 1 aire condicionat mínim de 3.000frig/hora.
- 1 termo elèctric mínim de 150L

ALTRA INFORMACIÓ

Serà a càrrec de l'empresa adjudicatària:

- El transport per muntatge i desmuntatge dels mòduls
- Muntatge i desmuntatge dels mòduls en la ubicació establerta.
- Servei de lloguer continuat dels dos mòduls durant tot el període de contracte
- En cas de ser necessari, i sota demanda de l'Ajuntament, el contractista es compromet a realitzar 2 reparacions anuals sense cost, que inclouran el material necessari, la mà d'obra i el desplaçament.

Els mòduls s'ubicaran al Camp Municipal de Futbol de Sant Pau d'Ordal (Subirats) situat al carrer Sant Pau, s/n Subirats 08739.

En aquesta instal·lació existeixen uns espais de llosa de formigó previstos per la ubicació dels mòduls. Els serveis contractats hauran de preveure les modificacions necessàries, si fos necessari, per adaptar-la a les característiques dels mòduls.

ASSEGURANCES

El contractista, a partir de la data d'inici del contracte i durant la vigència d'aquest, està obligat a contractar una pòlissa d'assegurança que cobreixi robatori i incendi.

El contractista, a partir de la data d'inici del contracte i durant la vigència d'aquest, està obligat a contractar una pòlissa d'assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d'aquest contracte.

Hi restaran coberts, especialment, els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l'execució del servei, d'acord amb la normativa legal aplicable.

OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària l'accés dels camions durant el muntatge i desmuntatge.

CODI DE L'EXPEDIENT: 446 NOM DE L'EXPEDIENT: 2024_446_LICITACIO SERVEI DE LLOGUER DE DOS MODULS DE VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL DE SANT PAU



AJUNTAMENT DE
Subirats

Ajuntament de Subirats
Plaça de l'1 d'octubre, s/n
08739 – Sant Pau d'Ordal
(Subirats)
Tel. 93 899 30 11

L'Ajuntament s'encarregarà de realitzar les connexions dels mòduls a les instal·lacions existents de clavegueram, ACS, elèctriques i altres que siguin necessàries pel seu funcionament.

Serà obligació de l'Ajuntament mantenir nets i en bon estat els mòduls i retornar-los de la mateixa manera que vans ser lliurats.

Subirats, en la data de la signatura electrònica.
