



Data Realització: 15/04/2013
 Última Actualització:

Adreça de l'edifici:	Ctra. de Santa Bàrbara, km.1,2
Població i CP:	Amposta – 43870
Telèfon:	977 70 62 61
Superfície Construïda:	
Cost de l'obra del Projecte:	
Data redacció del Projecte:	
Data execució de l'obra:	
Règim propietat:	Lloguer

Antecedents:

Elements estructurals: Oficines en planta 1 de nau industrial. Aparcament en nau industrial.

ELECTRICITAT	Potència Contractada:	10 kW kw	Potència Instal·lada :	kw
	Descripció:			
	Enllumenat: Llumeneres decoratives de 4 fluorescents de 36W encastades al sostre A la zona d'aparcament hi ha 12 llumeneres amb 2 fluorescents de 58W. A l'arxiu hi ha 6 llumeneres de 2 fluorescents de 58W Bany planta 1 llumenera d'un fluorescent 18W. Entrada a vestidors a l'aparcament també amb llumenera de 4 fluorescents de 18W A recepció PB d'entrada a la oficina 3 llumeneres amb PC-L 36W 4p Llum exterior situada a la façana a sobre la porta d'entrada de la oficina. Llums d'emergència a la oficina encastades al sostre. A la zona d'aparcament queden a sobre la paret.			

CLIMA	Climatització:
	La climatització es realitza mitjançant un sistema d'splits 1x1, 4 Ut, de la marca Panasonic, de 2.600W de fred i 2.850W de calor.
	A la zona de vestidors hi ha calefactores paret d'1.2Kw penjats a la paret.
	Ventilació
	Extracció forçada als banys amb extractors tipus SP Decor 100, 2 Ut.

VEU	Rack:
	Hi ha 2 racks penjats
	Cablejat tipus :
	Cable de xarxa, Cat. 5
	Centralita: Inter 4Plus RDSI Telefònica

AIGÜ	Fontaneria
	Producció ACS : Termo marca Thermor 100L 2200W al quartet de neteja.
	Sanejament:

ALARMA	Alarma Incendis : Si, truca a Control Central
	Detectors :
	Extinció d'incendis: 4 extintors pols ABC 6kg , 1 carro-extintor 50kg pols ABC 2 extintors CO2 de 2kg (1 a aparcament i 1 a Planta 1) i 1 CO2 de 5kg a l'aparcament

	Alarma Intrusió: Panell de control de l'alarma d'intrusió a porta que comunica l'aparcament amb l'escala de pujada a la oficina (Alarma Paradox).
	Senyal acústica de l'alarma d'intrusió a la paret de la façana principal d'entrada a les oficines.
	Detectors : Detectors volumètrics (5) en despatxos i recepció en PB.

OBSERVACIONS	Portes electrònic a la porta amb dos telèfons per obrir a la planta 1. Porta mecànica a l'entrada de l'aparcament.
---------------------	--

GALERIA FOTOGRÀFICA

Façana



Pàrquing, Nau



Comptadors Llum



Quadre Electric



Climatització



Ventilació

SENSE SISTEMA VENTILACIÓ

Rack, Cablejat



Centraleta



Comptadors Aigua

Tractament Legionel·la



Producció ACS




Control Alarma Intrusió i Foc



Armari Alarma Foc



ESQUEMES UNIFILARS

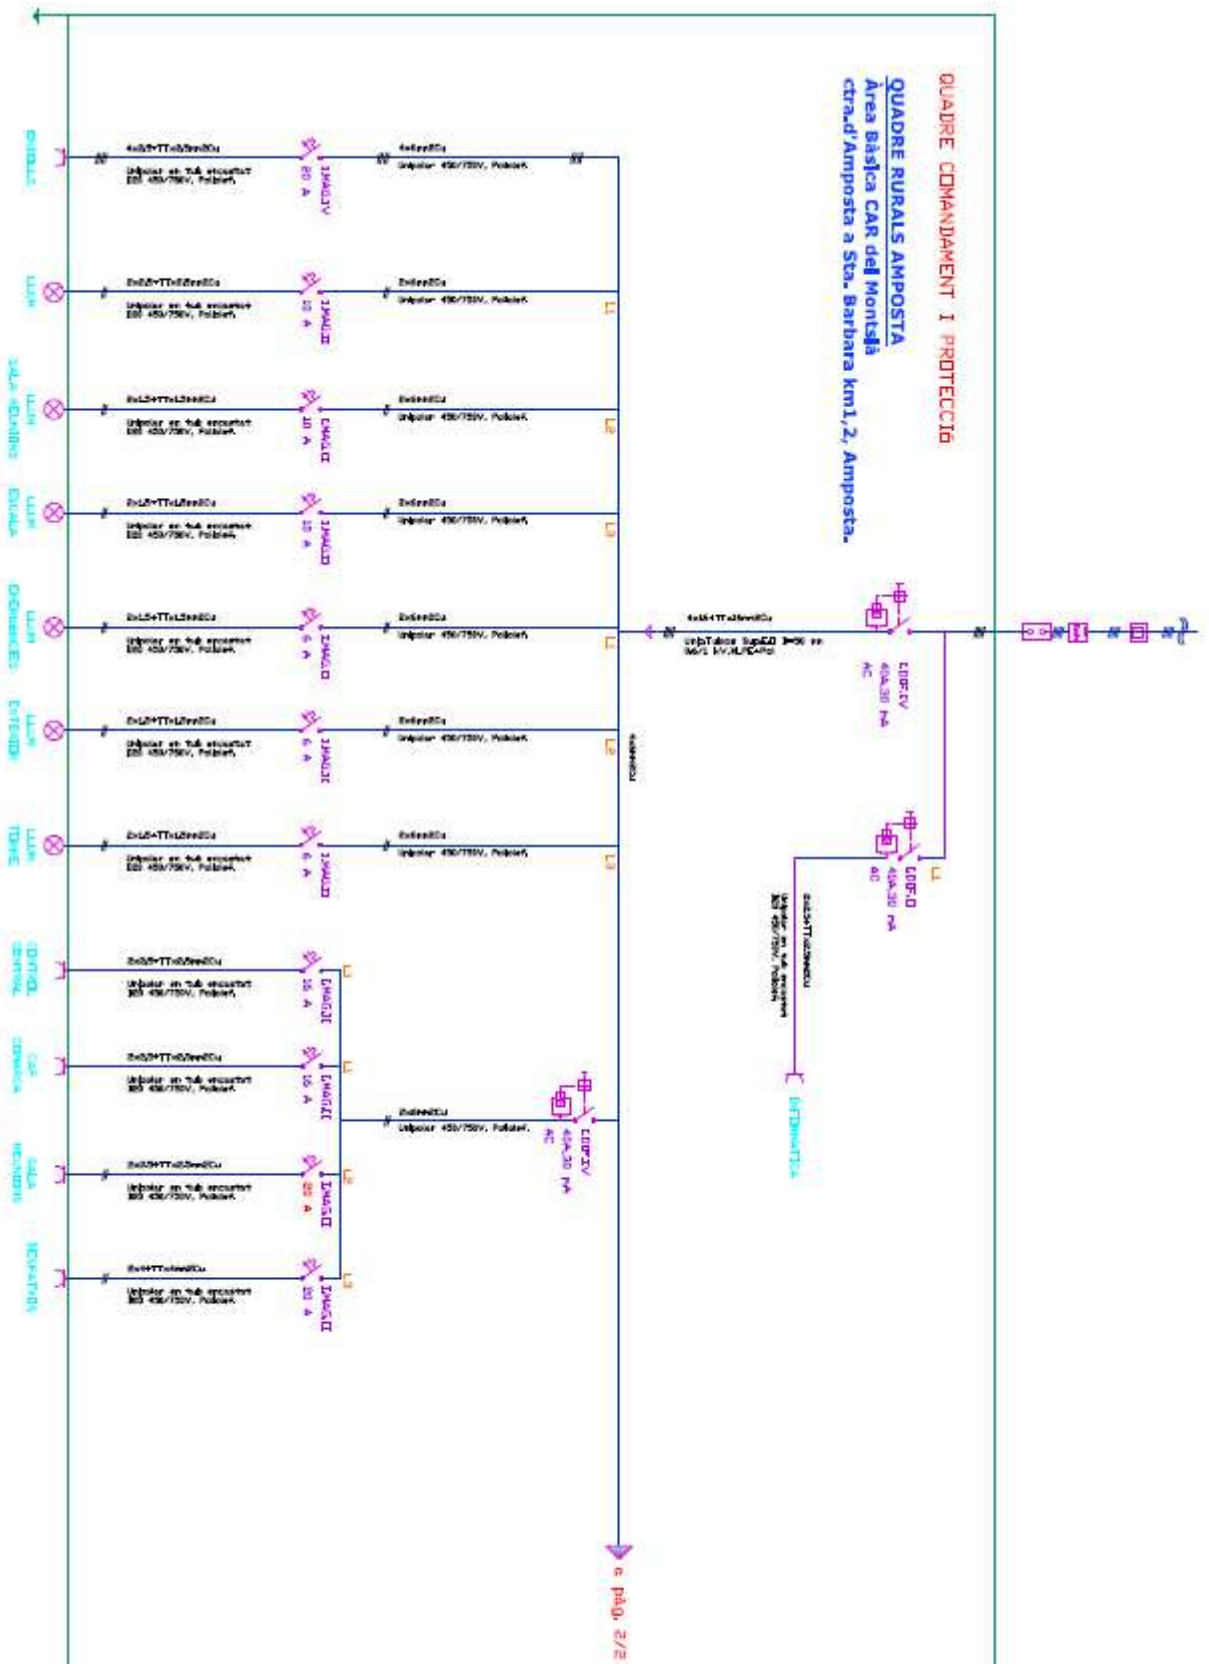

QUADRE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

QUADRE RURALS AMPOSTA
 Àrea Bàsica CAR del Montsià
 Ctra d'Ampost a Sta. Bàrbara km1,2, Ampost.

