



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MÒDULS SANITARIS A CALELLA

1. Definició de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquest Plec és el subministrament, inclòs el transport, col·locació i la instal·lació de dos mòduls sanitaris a Calella, concretament un mòdul per donar servei al Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt de Calella i un mòdul al Passeig Garbí de Calella.

El subministrament és durà a terme d'acord amb les prescripcions tècniques d'aquest Plec.

L'Ajuntament de Calella, en tots aquells actes i esdeveniments que organitza i en aquells en els quals hi dona suport o subvenciona, i per complir amb la normativa de seguretat i sanitat aplicable, necessita disposar de la cobertura del servei de subministrament de dos mòduls sanitaris, un ubicat al Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt i un altre al Passeig Garbí.

2. Característiques dels mòduls sanitaris

D'acord amb l'article 99 de la LCSP, la present contractació es divideix en 2 lots:

- **LOT 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL SANITARI AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL TOMÀS CLARAMUNT DE CALELLA.**
- **LOT 2: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL SANITARI AL PASSEIG GARBÍ DE CALELLA.**

Tot seguit es detallen les característiques de cada lot:

- **LOT 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL SANITARI AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL TOMÀS CLARAMUNT DE CALELLA.**

Objecte i dimensions:

Subministrament, transport, col·locació i la instal·lació d'un mòdul sanitari 3+1, el mòdul tindrà unes mides 4,89 metres x 2,44 metres i una alçada lliure interior de 2,34 metres. Les mides interiors estan pensades per a la comoditat d'una persona amb cadira de rodes.

Estructura:

El material del mòdul serà d'estructura metàl·lica de color blanc o gris, vista construïda, decoració interior blanc, instal·lació elèctrica 230V.

Comptarà amb dues portes batents d'entrada de pas lliure (amb pany i clau), una col·locada a la part dels tres serveis sanitaris i l'altre col·locada al servei per a minusvàlids.





Les portes tindran una alçada mínima de 2,00 metres i d'obertura cap a l'exterior amb un abatiment de 180° amb sistema de fixació/retenció de porta oberta en aquest angle; totes dues obertures se situaran en una de les seves cares llargues (4,89 metres). La resta de cares seran opaques.

Comptarà amb dues finestres d'una sola fulla cap a l'exterior, una col·locada a la part dels tres serveis sanitaris i l'altre col·locada al servei per a minusvàlids.

El mòdul estarà aïllat del terra, del sostre i de les parets amb lana mineral per tal d'oferir un clima fresc i còmode al seu interior. Paviment Surestep, paviment de les parets amb PVC.

Accessoris:

Tots els accessoris interiors tindran els cantons arrodonits per evitar danys físics als usuaris. Els accessoris interiors comuns constaran de: 2 miralls intrancables, suport paper higiènic, paperera sanitària, penjadors i dues piques amb tots els seus accessoris.

Al ser un servei per a minusvàlids disposarà de tots els accessoris anomenats anteriorment (1 mirall intrancable, suport paper higiènic, paperera sanitària, penjador i pica amb els seus accessoris) més barres de subjecció i un espai lliure com a mínim de 1,5 metres de diàmetre per a la cadira de rodes (segons normativa vigent).

Tant els tres compartiments més el compartiment per a minusvàlids disposaran del inodor químic corresponent més el suport paper higiènic.

Ferramenta:

Tota la part metàl·lica com fixacions i cargolaria seran d'acer inoxidable AISI/316, excepte les frontisses de les portes d'entrada que seran d'acer galvanitzat i estran fixades a l'estructura de les portes i a l'estructura portant del mòdul mitjançant soldadura.

Instal·lació:

Per al mòdul es preveu instal·lació elèctrica vista, protegida contra impactes, amb caixa de comandament i protecció, dos preses d'endoll i enllumenat de baix consum amb un mínim de dos punts de llum a sostre.

Escomesa:

Pel subministrament d'aquest mòdul caldrà que l'empresa adjudicatària realitzi els treballs necessaris en el terreny per la seva correcta instal·lació, tals com excavació de rasa per a tub d'aigua potable i corrent per a un modular WC sanitari d'aproximadament 100 metres d'allargada, pou de registre a l'inici de la xarxa, arqueta de 40x40 per a tub d'aigua, cates de localització de serveis, tub corrugat de 90, així com qualsevol altre tasca que sigui necessària.

Per la realització d'aquests treballs, l'empresa adjudicatària haurà de subcontractar obligatòriament a l'empresa municipal GESTAIGUA, SL, que és l'empresa encarregada de la gestió de l'aigua en el municipi de Calella.


Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:		
Codi Segur de Validació	3c167a00a51e402a97874a4ceb374873001	
Url de validació	https://carpetaciudadana.calella.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Altres -	



Lloc, emplaçament del subministrament:

Complex esportiu municipal Tomàs Claramunt
08370 Calella (Barcelona)

Situació i esquema:

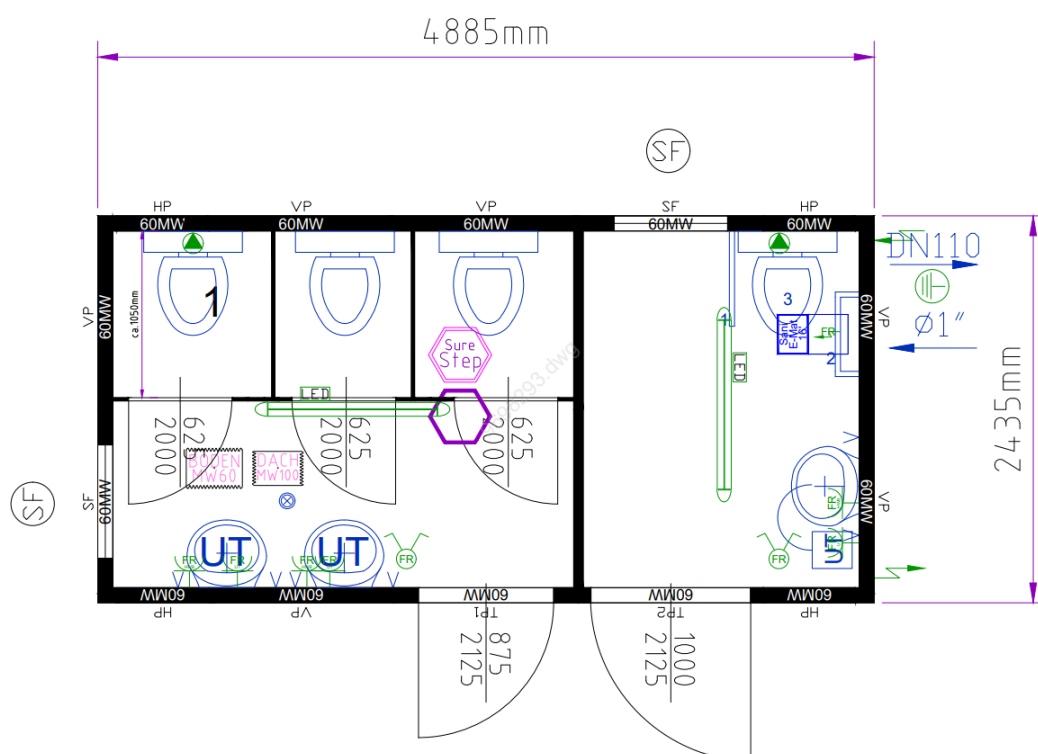

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:		
Codi Segur de Validació	3c167a00a51e402a97874a4ceb374873001	
Url de validació	https://carpetaciudadana.calella.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Altres -	



- **LOT 2: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL SANITARI AL PASSEIG GARBÍ DE CALELLA.**

Objecte i dimensions:

Subministrament, transport, col·locació i la instal·lació d'un mòdul sanitari prefabricat de fusta de mides 2,06 metres x 2,06 metres i una alçada mínima lliure interior de 2,50 metres per a lavabos unisex per a discapacitats. Les mides interiors estan pensades per a la comoditat d'una persona amb cadira de rodes.

Estructura:

Estructura vista construïda en fusta tractada a l'autoclau amb tauló de 70 x 70 mil·límetres. Parets exteriors, construïdes en fusta tractada a l'autoclau amb classe de risc nº 4 al buit i pressió amb sals de coure ecològiques sense arsènic segons la norma EN-335, amb un acabat exterior amb lasur protector amb filtre solar contra els raigs ultraviolades, encadellat de 130 x22 mil·límetres.

Parets interiors, construïdes en trespa, material que té les propietats de ser totalment llis, no té porus, altíssima densitat, gran duresa i resistència i total impermeabilitat que permet l'ús i abús d'aigua abundant i a pressió per possibles desinfeccions periòdiques. 4 mil·límetres d'espessor i pes 8,4 Kg/m², resistència a l'impacte valor 4, valor de l'índex EN 438-2 (11), absorció de l'aigua 0%, temperatura tèrmica -40°C +130°C. Reacció al foc segons norma UNE 237227/90.

Aïllament de coberta, parets i terra per oferir un clima fresc i còmode al seu interior. Sostre amb panell tipus "Termochip" amb revestiment interior d'encadellat de fusta. La coberta serà de planxa lacada d'una única pendent.

Terra metàl·lic antilliscant inoxidable d'alumini de 4 mm d'espessor, amb aliatge especial d'un 4% de magnesi que el fa resistent al salnitre.

Accessoris:

Tots els accessoris interiors tindran els cantons arrodonits per evitar danys físics als usuaris. L'inodor serà químic sense connexió a xarxa, o bé amb connexió a la xarxa fent instal·lació de l'aigua.

Els accessoris interiors constaran de: 1 mirall intrancable, suport paper higiènic, inodor químic, paperera sanitària, penjadors i tots els elements de la pica. Tots els accessoris seran antivandàlics.

Al ser un servei per a minusvàlids disposarà de tots els accessoris anomenats anteriorment més barres de subjecció i un espai lliure de 1,5 metres de diàmetre per a la cadira de rodes (segons normativa vigent).

Ventilació suficient i natural per sota i sobre de la porta.

Lloc, emplaçament del subministrament:

Passeig Garbí (a definir el lloc exacte)
08370 Calella (Barcelona)





Model i situació del mòdul de fusta:



3.Termini de lliurament del subministrament

El termini del lliurament i completa instal·lació dels mòduls sanitaris serà com a màxim de 2 mesos a partir de la data de formalització del contracte. No hi ha possibilitat de pròrroga del contracte. Es valorarà l'entrega anticipada a aquesta data màxima.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:		
Codi Segur de Validació	3c167a00a51e402a97874a4ceb374873001	
Url de validació	https://carpetaciudadana.calella.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Altres -	



4. Pressupost base de licitació

El preu definitiu del contracte serà aquell que resulti de l'oferta presentada per part del licitar que resulti adjudicatari, d'acord amb la seva proposició econòmica. A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen el preu del contractes i l'IVA i els demes tributs que li siguin d'aplicació segons normativa vigent.

Aquest preu inclou tot el subministrament, transport, col·locació i instal·lació així com qualsevol altra aspecte especificat al Plec de preinscripcions tècniques.

Amb tot això, el pressupost base de licitació es fixa en els següents imports:

LOT 1 – quantia de 15.300,00 € (exclòs IVA).

LOT 2 – quantia de 12.000,00 € (exclòs IVA).

5. Garantia

Els mòduls tindran un termini de garantia mínim de dos anys contra qualsevol tipus de desperfecte o deformació per l'ús habitual. El termini de garantia començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció dels mòduls. Es valorarà l'ampliació del termini de garantia.

Així, l'empresa adjudicatària substituirà les anomalies reconegudes com defectuoses, de construcció o de material, incloses les despeses de mà d'obra, materials i desplaçament, en el menor temps possible.

6. Gestió de residus:

Es preveu la carrega i transport dels residus generats amb el subministrament i la instal·lació autoritzada de gestió de residus i el cànon de la deposició controlada al dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts.

7. Control de qualitat

L'Ajuntament, a través dels tècnics corresponents, es reserva el dret a rebutjar aquelles ofertes que continguin elements que no compleixin les especificacions esmentades ja que es tracta d'uns mínims de qualitat requerit per poder garantir una correcta vida dels mòduls. Per això els licitadors hauran de presentar una fitxa tècnica dels materials dels mòduls per tal de poder verificar que compleixen amb aquests requisits mínims de qualitat exigits en la present contractació.

Calella, a la data de la signatura electrònica.

El tècnic d'Esports

Carlos Javier López Cazorla

