

PO SU 0268 2025.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS EQUIPATS PER PODER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA DURANT LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

ÍNDIX DE CLÀUSULES

- Primera: Antecedents
- Segona: Objecte del contracte, finalitat, descripció i marc normatiu d'aplicació.
- Tercera: Divisió en lots.
- Quarta: Descripció del servei.
- Cinquena: Seguiment del contracte.
- Sisena: Altres obligacions del contractista.
- Setena: Control de qualitat en la prestació dels serveis contractats.
- Vuitena: Confidencialitat.
- Novena: Visita als espais objecte del contracte

ÍNDIX D'ANNEXOS

- Annex 1: Compromís de compliment de procediment.
- Annex 2: Informe de No Conformitat.
- Annex 3: Declaració responsable i Compromís de confidencialitat de dades.
- Annex 4: Declaració responsable i Compromís confidencialitat de plànols.
- Annex 5: Declaració de visita realitzada als espais objecte del contracte

PO SU 0268 2025.

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS EQUIPATS PER PODER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA DURANT LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

CLÀUSULA PRIMERA.- Antecedents.

El CIRE, és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació – Ocupació – Inserció).

El CIRE, mitjançant els plans d'actuació amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria i l'adhesió a aquests plans per part de la resta de Departaments de la Generalitat i empreses públiques d'aquesta, promou l'ocupació laboral dels interns en els diferents espais que gestiona en els centres penitenciaris (tallers productius i tallers de serveis) així com en els serveis que realitza fora d'aquests. Aquests espais i serveis requereixen de reposició d'estrís, materials, equipament i maquinària, i el seu manteniment i adequació a la normativa establerta, ja que han de disposar de tot el necessari per portar a terme el correcte compliment dels serveis o subministraments encarregats.

Atès que cal fer obres de remodelació de la cafeteria del CP Brians 1, que està essent objecte d'una altra licitació, mentre durin aquestes obres, és necessari llogar els mòduls necessaris per tal d'instal·lar una cafeteria i menjador alternatiu als efectes de poder continuar garantint el servei de cafeteria per a personal professional.

CLÀUSULA SEGONA.- Objecte del contracte, finalitat, termini del lliurament i muntatge, coordinació amb l'empresa contractista de les obres de remodelació de la cafeteria marc normatiu d'aplicació.

Aquesta contractació està relacionada amb l'execució del projecte tècnic per a la reforma (obra civil i instal·lacions), per a l'adequació de la cafeteria del centre penitenciar Brians 1 i tal i com es descriu en el projecte tècnic que les empreses licitadores podran sol·licitar.

Durant l'execució de les obres (objecte de licitació de l'expedient PO OB 0262 2025), per tal de garantir el servei de la cafeteria exterior del centre penitenciar Brians 1, s'instal·laran uns mòduls prefabricats provisionals. Els terminis d'execució de les obres depenen de la instal·lació i posada en funcionament d'aquests mòduls.

El inici de les feines d'obra civil i instal·lacions serà de 1 mes, previ a la data d'instal·lació dels mòduls.

Es realitzarà com a mínim una reunió entre l'empresa adjudicatària dels mòduls i l'empresa adjudicatària de l'obra 1 mes abans de la instal·lació dels mòduls. Aquesta reunió es realitzarà a peu d'obra. Es replantejarà la ubicació exacta dels mòduls, la ubicació de camí de formigó, la ubicació acotada, en la façana del edifici de la cafeteria, d'on s'han de deixar les escomeses de les instal·lacions d'evacuació i aigua, i qualsevol dubte mes que pugui sorgir.

El termini total des del subministrament fins la posada en marxa haurà de ser de 10 dies hàbils.

El temps del lloguer dels mòduls és de 4 mesos a comptar des de la seva posada en marxa. Així doncs, les obres que afecten al funcionament del Servei de la cafeteria exterior, han de durar com a màxim, 3 mesos i 3 setmanes.

Un cop estiguin operatius el mòduls temporals de la cafeteria, s'iniciaran tota les partides de demolició i construcció de la cafeteria exterior. La duració màxima del termini, per totes les partides que afectin a l'interior de la cafeteria i no permetin una cafeteria operativa, es de 3 mesos i 3 setmanes.

Tota la maquinaria i equipament de la cafeteria exterior dissenyada son objecte de la licitació Expedient CB SU 0269 2025. Les escomeses i acabats necessaris per la instal·lació i posada en marxa de la maquinaria i equipament, estarà finalitzat als 3 mesos i 3 setmanes. De manera que l'empresa adjudicatària de l'equipament disposarà d'una setmana per tal que la cafeteria exterior sigui totalment operativa.

Un cop adjudicat el subministrament i instal·lació de la maquinaria a instal·lar, es facilitarà les condicions del espai on s'ubicaran.

L'empresa adjudicatària del subministrament i instal·lació de la maquinaria, estarà obligada a entregar al Tècnic de CIRE responsable de l'obra, la documentació tècnica del equipament a instal·lar per tal de que les escomeses de les diferents instal·lacions es puguin executar correctament.

Tan bon punt sigui possible, es realitzaran les reunions necessàries per tal de replantejar la ubicació exacta de la maquinaria i de les seves escomeses. A aquesta reunió assistirà totes les empreses adjudicatàries d'aquest expedient, de l'expedient PO OB 0262 2025 i de l'expedient CB SU 0269 2025, i la Direcció d'Obra. S'aixecarà plànol acotat exhaustiu i es signarà per part de tots els assistents.

2.1 Objecte del contracte: L'objecte d'aquest contracte és el subministrament en règim de lloguer, muntatge i posterior desmuntatge de mòduls equipats per poder desenvolupar amb normalitat el servei de cafeteria al centre penitenciari Brians 1, durant el termini de realització de les obres de remodelació de la cafeteria, establert en 3 mesos i 3 setmanes de durada.

La informació sobre la ubicació exacte de l'espai on ha de realitzar-se el muntatge i desmuntatge, es facilitarà a les empreses que realitzin la visita obligatòria als espais, prèvia signatura de la declaració de confidencialitat.

2.2 Finalitat: La finalitat d'aquesta contractació és la de disposar d'una empresa que realitzi de forma satisfactòria per al CIRE el subministrament en règim de lloguer, incloent el muntatge i, posteriorment, el desmuntatge dels mòduls per a poder elaborar els àpats, durant tota la durada de l'execució de l'obra de remodelació de la cafeteria del centre penitenciari Brians 1 d'acord amb les estipulacions d'aquest plec i del plec de clàusules administratives, per així poder continuant proporcionant el servei de cafeteria del centre, mentre s'executin les obres.

2.3 Descripció: Per a la realització de les obres de remodelació de la cafeteria del Centre Penitenciari Brians 1, es preveu la tramitació de quatre expedients de contractació: Un per a la **Direcció Facultativa (DF)**, un per a l'**execució de l'obra**, un per al **subministrament, instal·lació i retirada dels mòduls provisionals per a la cafeteria provisional** i, per últim, un per al **subministrament i instal·lació de l'equipament i mobiliari**.

Durant l'execució de les obres i amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei de cafeteria exterior del centre, s'instal·laran **mòduls prefabricats provisionals**. L'inici de les obres està condicionat a la instal·lació i posada en funcionament d'aquests mòduls, que hauran d'estar operatius **com a màxim el dia 1 de setembre de 2025**.

El període de lloguer dels mòduls serà de **quatre mesos** a partir de la seva posada en marxa, fet que determina el termini d'execució de les obres, que hauran de finalitzar abans del **31 de desembre de 2025**. Un cop els mòduls provisionals estiguin operatius, es procedirà a l'**enderroc de la cafeteria actual**. El termini d'execució per a totes les partides que afectin l'interior de la cafeteria i impedeixin el seu ús serà de **tres mesos i tres setmanes**. En cas que, per imprevistos de l'obra, els mòduls prefabricats no estiguin operatius l'1 de setembre de 2025, l'empresa responsable de l'execució de l'obra es compromet a iniciar aquells treballs que no afectin el funcionament de la cafeteria actual, com ara: l'acopi de material, l'excavació exterior, els enderrocs perimetrals, les instal·lacions o altres treballs que es considerin oportuns.

L'empresa encarregada de l'execució de l'obra haurà de finalitzar **les escomeses i els acabats necessaris per a la instal·lació i posada en marxa de l'equipament de la cafeteria** en un termini màxim de **tres mesos i una setmana** a partir de la data d'inici de l'obra. Això garantirà que l'empresa adjudicatària del subministrament de l'equipament disposi **d'almenys deu dies hàbils** per completar la instal·lació i assegurar que la cafeteria sigui plenament operativa.

L'empresa responsable del subministrament de la maquinària i l'equipament es compromet a coordinar-se amb l'empresa encarregada de l'obra civil per **replantejar la ubicació exacta de les escomeses** amb la suficient antelació i seguint les indicacions del CIRE i la DF.

El seguiment de l'obra serà obligatori per a tots els agents implicats, amb el **compromís de complir els terminis i requisits establerts**, així com d'assistir a les visites d'obra detallades a l'apartat de coordinació.

2.4 Termini del lliurament i muntatge: L'empresa contractista haurà d'iniciar el lliurament i el muntatge dels mòduls de la cafeteria provisional en el termini màxim d'1 mes a comptar des de la formalització del contracte de subministrament i haurà de finalitzar en el termini màxim de deu dies hàbils.

2.5 Coordinació amb l'empresa adjudicatària de l'execució de l'obra de remodelació de la cafeteria del CP Brians 1: Tots els agents implicats en l'obra hauran de coordinar-se per garantir el compliment dels terminis i requisits establerts en aquest contracte i el conjunt de l'obra. Amb aquest objectiu, es duran a terme les següents visites d'obra:

1. Visita de replanteig dels mòduls prefabricats: L'empresa responsable del subministrament i instal·lació dels mòduls durà a terme una reunió in situ com a mínim un mes abans de la instal·lació per replantejar la ubicació exacta dels mòduls, així com els recorreguts de les xarxes de subministrament i sanejament que s'executaran en el marc del mateix contracte

2. Visita de planificació: Amb una antelació mínima de cinc dies hàbils abans de l'inici de l'obra, es realitzarà una reunió de planificació per coordinar la posada en marxa dels mòduls prefabricats i l'entrada de l'equip d'obra. Així mateix, es definirà la coordinació amb l'equipament de cafeteria i qualsevol altre aspecte rellevant per als diferents agents implicats.

A aquesta visita hi assistiran **l'empresa adjudicatària de l'execució de l'obra, així com les empreses responsables dels mòduls prefabricats i del subministrament de l'equipament de cafeteria.**

3. Visita de replanteig de l'equipament: Seguint el calendari d'actuacions del projecte executiu, entre la tercera i la quarta setmana de l'obra, es durà a terme una reunió per validar la ubicació i l'alçada de les escomeses de la maquinària i l'equipament de la cafeteria. Durant aquesta visita, es presentarà in situ el replanteig dels paraments verticals i la ubicació de l'equipament amb la definició precisa de les escomeses.

A aquesta reunió hi assistirà **l'empresa encarregada de l'execució de l'obra i l'empresa responsable del subministrament de l'equipament de la cafeteria.** Com a resultat, aquesta última elaborarà un plànol acotat exhaustiu de les escomeses, que haurà de ser signat per tots els assistents.

4. Visites setmanals d'obra: Des de l'inici dels treballs fins a la seva finalització, es realitzaran visites setmanals de seguiment de l'obra. A aquestes reunions hi assistiran els agents i subcontractes necessaris per al correcte desenvolupament de l'obra.

Totes les visites es faran de manera presencial a peu d'obra i comptaran amb l'assistència de la **Direcció Facultativa i dels representants del CIRE, del Centre Penitenciari i del Departament de Justícia.**

2.6 Marc normatiu d'aplicació: Les empreses adjudicatàries hauran de complir amb tota la normativa de seguretat vigent al referit centre penitenciari, tant pel que fa a la regulació d'accés com envers els professionals i interns dels centres.

CLÀUSULA TERCERA.- Divisió en lots.

Aquest contracte no té divisió en lots donada la homogeneïtat del subministrament.

CLÀUSULA QUARTA.- Característiques tècniques del subministrament i instal·lació.

Composició dels mòduls necessaris per a la cafeteria temporal del CP Brians 1:

1. Zona de menjador
2. Zona cuarto fred
3. Zona de rentat
4. Passadís, magatzems i cambres
5. Zona de cocció

1.- Zona de menjador

Mòduls de llargada de 6 metres, ample interior de 2.40 metres.

Alçada interior: Ha de restar lliure una alçada mínima de 2.25 metres, per a que sigui zona apte de treball.

Paviment, doble tauler hidròfug amb PVC continu.

Amb finestres a l'exterior.

Ha de permetre la interconnexió amb els altres mòduls.

Disposa de quadre general suficient per a les connexions elèctriques i d'escomeses d'aigua i desaigua que siguin necessàries.

Ha d'incloure extintor d'eficàcia mínima 21A-113B

Incloure insectocutor per al control d'insectes

Ha d'incloure farmaciola

Amb senyalització d'evacuació i enllumenat d'emergència

Ha d'incloure climatització.

Composició:

- 11 mòduls de lliure configuració
- 18 Taules multi usos plegables de 152 cm
- 72 cadires plegables de pvc
- 1 Self service tolva pa cobert
- 1 self service vitrina refrigerada
- 1 Carro escalfa plats
- 1 Bany maria
- 1 Carro calent capacitat 20 GN 2/1
- 1 Moble caixa registradora
- 1 moble cafetera
- 1 planxa fry top de 70 cm
- 3 Cubells escombraries
- 1 Descalcificador

Característiques tècniques equipaments necessaris:

Taula multi usos plegable de PVC

Amb bastidor d'acer. Superfície de polietilè d'alta qualitat. Us interior/exterior.

Dimensions 152 x 753 x 737 mm

Pes 12.5 kg



Cadires plegables de pvc



Serf service Tolva pa cobert

Self service per a distribució de pa. Amb estant per a estovalles i/o tovallons, estant per a safates i recipients per a coberts.

Dimensions Alt 1600 mm, ample 800 mm i profunditat 700 mm



1 self service vitrina refrigerada

Refrigeració mitjançant un sistema de ventilació que manté uniforme la temperatura interior. Ha de disposar de portes corredisses en la banda dels treballadors i portes abatibles en el costat del servei. Control i regulació de la temperatura mitjançant termòstat electrònic de lectura digital. Temperatura de treball regulable de +4° a +12° amb una temperatura ambient de 32°C.

Dimensions 1600 x 700 x 1850 mm

Potència 230V – 3.5 kW

Alimentació: shucko



1 Carro escalfa plats

Carro escalfa plats elèctric amb capacitat de 90 plats de fins a 280 mm de diàmetre. Fabricat en acer inoxidable. Sistema de regulació per a diferents mides de plats mitjançant varilles.

Dimensions 920 x 495 x 895 mm.

Potència 230V – 0.96 Kw

Alimentació: Shuko



1 Bany maria

Bany maria sec. Capacitat 4 safates gastronòmiques 1/1 amb profunditat màxima de 150 mm. Reserva interior calent (aire forçat). Les resistències milloren el rendiment i redueixen el consum elèctric. Cuba embotida amb cantonades arrodonides per una millor neteja.

Model sec: Escalfament sense necessitat d'utilitzar aigua, resistència blindada protegida mitjançant reixeta d'acer inoxidable.

Temperatura de treball de 30° a 90 °C. Dotat amb contra safates (extraïble), amb rodes.

Potència 4900 W

Alimentació: shucko 230 V / 3 / 50-60 Hz



1 Carro calent capacitat 20 GN 2/1

Carro calent elèctric, per al manteniment i servei de menjars preparats. Capacitat per a 20 safates GN 2/1, separació entre guies 60 mm. Construcció en acer inoxidable. Dotat amb 2 nanses laterals. Calefacció mitjançant resistència i aire forzat. Cubeta amb sistema ant ioles, on es deposita l'aigua per a la creació d'humitat. Termòstat de control de 0°C a 90°C. Termòmetre exterior. Bisagres dotades amb mecanisme de tancament automàtic: quan la porta està en una posició menor a un angle de 90° es tanca totalment, evitant la pèrdua de temperatura i estalviant energia.

Amb 4 rodes giratòries, dues d'elles amb fre. Para xocs de goma, que no marca, a tota la base del carro.

Dimensions Alt 1640 mm, ample 799 mm i Fons 876 mm

Potència: 2 kW – 9.5 A – 220 v

Alimentació elèctrica: Shuko 230 v / 1N / 50-60 Hz



1 Moble caixa registradora

Moble de self service caixa a la dreta. Fabricat en acer inoxidable. Dissenyat per a suportar una caixa registradora i l'allotjament d'una cadira.

Dimensions 1200 x 700 x 850 mm



1 moble cafetera

Construcció en acer inoxidable 10/10. Acabat setinat. Disposa de tolva de recollida dels posos del cafè d'acer inoxidable, amb colpejador desmuntable. Calaixos auxiliars en acer inoxidable. Taulels amb peto a la part del darrera. Baldes d'acer inoxidable AISI 304 18/10. Potes d'acer inoxidable amb peus regulables en alçada.

Dimensions 1500 x 600 x 1045 mm



1 planxa fry top de 70 cm

Fry top llis. Per instal·lar en espais reduïts. Planxa de cocció en acer especial d'elevada transmissió tèrmica. Temperatura de treball 100°C a 300°C. Protecció lateral i per la part del darrera per les esquitxades. Safata per recollir el greix que es pugui extreure. Termostat de seguretat.

Dimensions Alt 440 mm, ample 700 mm i fons 740 mm

Potència elèctrica: 9kW – 400 V

Alimentació elèctrica: Cetac 16 A 3P-N-T



2.- Zona cuarto fred

Mòduls de llargada de 6 metres, ample interior de 2.70 metres, per permetre treballar als dos costats alhora.

Alçada interior: Ha de restar lliure una alçada mínima de 2.50 metres, per a que sigui zona apte de treball.

Equip de climatització que permeti una temperatura controlada per a la manipulació d'aliments, segons normativa sanitària entre 12° i 16°C.

Paviment antilliscant amb qualificació mínima R11 de 3 mm, muntat sobre taulell fenòlic.

Inclou embornal en el paviment d'acer inoxidable per una correcta neteja de l'espai i dels mateixos.

Motllures arrodonides a les cantonades. Inclou un extintor d'eficàcia mínima 21A-113B

Ha d'incloure rentamans, dispensador de sabó i cel·lulosa per a la correcta neteja del personal de cafeteria, segons normativa sanitària.

Ha d'incloure pica per a la correcta manipulació d'aliments. Inclou insectocutor per al control d'insectes.

Ha d'incloure farmaciola.

Ha de tenir quadre elèctric amb doble entrada de subministrament elèctric (220/380V), adaptada a la potència dels equips.

Ha de permetre la instal·lació d'equipament professional de manipulació d'aliments de fons mínim de 700 mm amb homologació CE.

Ha de permetre configurar l'equipament de manipulació d'aliments segons les necessitats productives.

Ha de permetre la connexió amb els altres mòduls.

El mòdul, al seu interior ha de disposar d'una distribució elèctrica amb les proteccions adients, a nivell de fontaneria i desaigua i les claus de pas necessàries. Totes les instal·lacions interiors han de confluïr en una única connexió elèctrica, una d'aigua i una de desaigua de red per mòdul. Ha de tenir la senyalització d'evacuació i enllumenat d'emergència.

Composició:

- 1 mòdul cuarto fred
- 1 taula central
- 1 taula refrigerada amb 2 portes

Característiques tècniques equipaments necessaris:

Taula central en acer inoxidable de 150 cm
 Taula refrigerada amb 2 portes 150 cm
 Taulell en acer inoxidable i peto al darrera. Trassera en acer galvanitzat. Baldes interiors de varilles plastificades fàcilment desmuntables per a la seva neteja. Ha de tenir suports de subjecció de les baldes regulables en alçada. Ha de tenir control electrònic de la temperatura amb visor digital. Temperatura de treball entre -2°C i + 8°C amb 32°C de temperatura ambient.
 Capacitat de 250 litres.
 Dotació 2 baldes (405 mm x 460 mm) regulables en alçada.
 Dimensions 1500 x 600 x 850 mm. Peto posterior de 100 mm d'alçada
 Potència elèctrica: 350 W – 2A
 Alimentació elèctrica: Schuko 220V – 50 Hz



3.- Zona de rentat

Mòduls de llargada de 6 metres, ample interior de 2.70 metres.
 Alçada interior: Ha de restar lliure una alçada mínima de 2.25 metres, per a que sigui zona apte de treball.
 Paviment antilliscant amb qualificació mínima R11 de 3mm, muntat sobre taulell fenòlic.
 Inclou embornal en el paviment d'acer inoxidable per una correcta neteja de l'espai i dels mateixos.
 Motllures arrodonides a les cantonades.
 Ha d'incloure rentamans, dispensador de sabó i cel·lulosa per a la correcta neteja del personal de cafeteria, segons normativa sanitària.
 Ha d'incloure extintor d'eficàcia mínima 21A-113B
 Incloure insectocutor per al control d'insectes
 Ha d'incloure farmaciola
 Ha d'incloure quadre elèctric amb doble entrada de subministrament elèctric (220/380V), adaptada a la potència dels equipaments.
 Ha de permetre la instal·lació dels equipaments de rentat professional per a la neteja i desinfecció (+85°C) homologats CE.
 Ha de permetre configurar els equipaments de neteja segons necessitats.
 Ha de permetre la connexió amb els altres mòduls.
 Ha de disposar de distribució elèctrica amb les proteccions adequades, a nivell de fontaneria, desaigua i claus de pas necessàries. Totes les instal·lacions interiors conflueixen en una única connexió elèctrica, una d'aigua i una de desaigua de xarxa per mòdul.
 Ha de tenir la senyalització d'evacuació i enllumenat d'emergència.

Composició:

- 1 rentaplats de capota

4 estanteries de 4 nivells
1 pica d'una cuba
1 descalcificador

Característiques tècniques equipaments necessaris:

1 rentaplats de capota
Ha de dur taula d'entrada i sortida. Producció 65/42/30 cistelles per hora
Dimensió de les cistelles 500 x 500 mm
Dotació de 2 cistelles per a plats, 2 cistelles per gots i 1 cistella per a coberts.
Dimensions 3240 x 820 x 1500 mm
Potència elèctrica 11.1 kW – 380 V
Alimentació elèctrica: Cetac 32A 3P-N-T
Alimentació aigua 3/4"
Alimentació d'aigua per a la taula d'entrada (freda i calenta) 3/8"



4 estanteries 4 nivells

Estanteries d'alumini adonitzat i baldes de polietilè alimentari.
Han de ser indicades per ús a cambres frigorífiques, magatzem de cafeteria, amb el compliment dels requeriments sanitaris.
Dimensions 1000 x 500 x 1750 mm



Pica d'una cuba

Aigüera fabricada totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10
Cuba embotida amb protecció insonoritzant.
Cuba amb vàlvula de desaigua i tub sobreeixidor. Desaigua 40 mm. Presa d'aigua 3/8".
El taulell està embotit en xapa d'1 mm d'espessor i peto posterior de 100 mm d'alçada, totalment soldat.

Dimensions cuba 800 x 500 x 375 mm
Dimensions 1000 x 700 x 850 (h) mm



1 descalcificador



5.- Passadís, magatzems i cambres

Mòduls de passadís i magatzem:

Mòduls de llargada de 6 metres, ample interior de 2.40 metres.

Alçada interior: Ha de restar lliure una alçada mínima de 2.25 metres, per a que sigui zona apte de treball.

Paviment, doble tauler hidròfug amb PVC continu.

Amb finestres a l'exterior.

Ha de permetre la interconnexió amb els altres mòduls.

Disposa de quadre general suficient per a les connexions elèctriques i d'escomeses d'aigua i desaigua que siguin necessàries.

Ha d'incloure extintor d'eficàcia mínima 21A-113B

Incloure insectocutor per al control d'insectes

Ha d'incloure farmaciola

Amb senyalització d'evacuació i enllumenat d'emergència

Ha d'incloure climatització.

Mòdul de cambres:

Mòduls de llargada de 6 metres, ample interior de 2.70 metres per permetre treballar als dos costats del mòdul al mateix temps.

Alçada interior: Ha de restar lliure una alçada mínima de 2.25 metres, per a que sigui zona apte de treball.

Mides exteriors: 3 metres x 6 metres x 3 metres

Paviment antilliscant amb qualificació mínima R12 de 3 mm, muntat sobre taulell fenòlic.

Motllures arrodonies a les cantonades.

Quadre elèctric amb doble entrada de subministrament elèctric (220/380V), adaptat a la potència dels equipaments.

Il·luminació exterior

Ha de permetre instal·lar estanteries.

Ha de permetre la interconnexió amb els altres mòduls.

Ha de disposar de distribució elèctrica amb les proteccions adequades, a nivell de fontaneria, desaigua i claus de pas necessàries. Totes les instal·lacions interiors conflueixen en una única connexió elèctrica,

Ha d'incloure alarma d'home atrapat.

Senyalització d'evacuació i enllumenat d'emergència.

Composició:

2 mòduls
10 estanteries de 4 nivells
1 mòdul per a la cambra mixta

Característiques tècniques equipaments necessaris:

10 estanteries 4 nivells

Estanteries d'alumini adonitzat i baldes de polietilè alimentari.
Han de ser indicades per ús a cambres frigorífiques, magatzem de cafeteria, amb el compliment dels requeriments sanitaris.
Dimensions 1000 x 500 x 1750 mm



6.- Zona de cocció

Mòduls de llargada de 6 metres, ample interior de 2.70 metres per permetre treballar als dos costats del mòdul al mateix temps.

Alçada interior: Ha de restar lliure una alçada mínima de 2.50 metres, per a que sigui zona apte de treball.

El mòdul de cuina és el mòdul amb major consum elèctric. Ha de disposar de doble xarxa de subministrament al quadre elèctric, el que permeti obtenir de la potencia subministrada pel generador en hores de producció, mentre que els treballs de neteja o serveis que requereixin subministrament permanent s'alimentin del subministrament aportat pel mateix centre.

Paviment antilliscant amb qualificació mínima R11 de 3 mm, muntat sobre taulell fenòlic.

Inclou embornal en el paviment d'acer inoxidable per una correcta neteja de l'espai i dels mateixos.

Motllures arrodonides a les cantonades.

Sistema d'extracció per panell lateral del mòdul per evitar possibles entrades d'aigua.

Campana extractora de fums amb aportació d'aire exterior.

Sistema automàtic d'extinció d'incendis per a campanes extractores de 1200 mm de profunditat.

Extintor d'eficàcia mínima 21A-113B i manta apaga focs.

Ha d'incloure rentamans, dispensador de sabó i cel·lulosa per a la correcta neteja del personal de cafeteria.

Ha d'incloure pica per a la correcta manipulació d'aliments.

Ha d'incloure insectocutor per al control d'insectes.

Ha de disposar de farmaciola

Ha de disposar de quadre elèctric de doble entrada de subministrament (220/380V), adaptada a la potència dels equipaments.

Ha de permetre la instal·lació dels equipaments de cocció professional de fons 900 mm amb homologació CE.

Ha de tenir la distribució elèctrica amb les proteccions adients, a nivell de fontaneria, desaigua i les claus de pas necessàries.

Totes les instal·lacions interiors conflueixen en una única connexió elèctrica, una d'aigua i una de desaigua de xarxa per mòdul.

Panel Sandwich amb llana de roca amb espessor de 80 mm, per oferir aïllament i comportament contra el foc.

Composició:

- 1 mòdul de cuina
- 1 forn mixte capacitat 10 GN 1/1
- 1 cuina de 4 plaques
- 1 planxa fry top de 90 cm
- 1 fregidora elèctrica
- 2 elements neutres
- 1 descalcificador
- 1 taula refrigerada de 2 portes

Característiques tècniques equipaments necessaris:

1 forn mixt capacitat 10 GN 1/1
 Amb capacitat per a 10 safates gastronòmiques 1/1, separació entre guies de 67 mm
 Ha de disposar de diferents tipus de cocció: vapor, regeneració, mixt i convecció (fins 300°)
 Amb 99 programes, 2 programes de recuperació de temperatura. Funció de manteniment, programa de rentat manual. Ventilació manual motoritzada. Auto-clima amb Fast-Dry.
 S'ha de connectar a una pressa d'aigua i desaiqua per poder utilitzar la opció de vapor.
 Dimensions 990 x 860 x 1790 mm, amb el suport inclòs.
 Potència elèctrica 20 kW-400V
 Alimentació elèctrica: Cetac 32A 3P-N-T 400V 50 HZ
 Pressa d'aigua ¾"
 Pressa de desaiqua 40 mm



1 cuina de 4 plaques
 Cuina elèctrica d'acer inoxidable.
 Amb 4 plaques independents de ferro fos (300 x 300 x 6 mm)
 Les plaques han de tenir regulació de la temperatura mitjançant un commutador de 6 posicions i pilot de llum il·luminat quan està sota tensió.
 Balda llisa d'acer inoxidable a la part inferior.
 Ha de disposar de 4 rodes giratòries, 2 d'elles amb fre.
 Dimensions 800 x 900 x 960 mm
 Potència elèctrica 16kW – 400 V
 Alimentació elèctrica: Cetac 32A 3P-N-T



1 planxa fry top de 90 cm

Construcció en acer inoxidable. Planxa de cocció en acer especial d'elevada transmissió tèrmica. Acabat en planxa llisa en fundació. Plaques d'acer de gran espessor amb vora anti esquitxades a tres costats, soldat hermèticament. Zona inferior oberta amb una balda. Temperatura de treball fins a 280°C. Dimensions 800 x 900 x 900 mm.

Dimensions de la planxa: 796 x 670 mm

Potència 400V – 13.2 Kw

Alimentació: Cetac 32A, 3P-N-T



1 fregidora elèctrica

Fregidora elèctrica d'una cuba. Capacitat de la cuba, entre 18 i 21 litres. Dotació de 2 cistelles. Regulació termostàtica de la temperatura de l'oli fins un màxim de 185°C. Termostat de seguretat, encesa i regulació de la temperatura. Resistències blindades per a facilitar la neteja completa de la cuba. Aixeta per buidar, amb 4 rodes giratòries (dues d'elles amb fre).

Dimensions 400 x 900 x 900 mm

Mides de la cistella 160 x 360 x 120 mm

Potència elèctrica 17 kW – 400v

Alimentació elèctrica: Cetac 32A 3P-N-T



2 elements neutres

Elements neutres adients als equipaments anteriorment descrits. De construcció en acer inoxidable. Part inferior oberta amb balda.
Dimensions Alt 900 mm, Ample 400 mm i fons 900 mm



1 taula refrigerada de 2 portes

Taula refrigerada de dues portes. Taulell en acer inoxidable i peto del darrera sanitari. Trassera en acer galvanitzat. Baldes interiors de varetes plastificades, amb desmuntatge fàcil per a la seva neteja. Amb suports de subjecció de les baldes regulables en alçada. Control elèctric de la temperatura amb visor digital. Temperatura de treball -2º +8º C amb 32ºC de temperatura ambient.
Capacitat de 250 litres. Dotació dos baldes (405 mm x 460 mm) regulables en alçada.
Dimensions 1500 x 600 x 850 mm. Peto posterior de 100 mm d'alçada.
Potència elèctrica: 350 W – 2A
Alimentació elèctrica: Shuko 220V – 50 Hz



Instal·lació elèctrica i de fontaneria exterior als mòduls: Per procedir a la instal·lació dels mòduls es requereix unes necessitats d'escomeses, aquestes necessitats es defineixen segons les característiques dels mòduls i els equipaments instal·lats, i han de ser executades per l'empresa contractista que subministrarà els mòduls.

Instal·lació elèctrica: La instal·lació elèctrica necessària per alimentar els mòduls serà executada per l'instal·lador i constarà d'una part fixe, que quedarà instal·lada de forma fixe i una part final que serà provisional i utilitzada exclusivament durant el temps d'ús dels mòduls provisionals:

L'origen de l'escomesa elèctrica s'ha d'anar a buscar al quadre general del centre penitenciari on s'instal·larà un quadre. Des d'aquest punt s'instal·larà la instal·lació elèctrica per l'interior de la galeria on s'haurà de suportar el cablejat, un cop a l'exterior es creuarà el pas conduint el cablejat per sota de

la passarel·la fins arribar al moll on es col·locarà un subquadre i es conduirà la instal·lació a la zona provisional dels mòduls i es col·locarà un tercer quadre que regularà les diferents escomeses fins els quadres individuals de cadascun dels mòduls.

Per a la instal·lació es requereix de mitjans d'elevació de tisora que permetran la instal·lació de la estructura elèctrica.

El material i recursos necessaris per a la instal·lació és la següent:

1 unitat	Quadre amb int. Automàtic 400A amb bobina toroidal ubicat a la sala de quadre general
1 unitat	Quadre amb int. De tall 400A ubicat a la zona de moll de carrega.
800 metres lineals (ML)	Cable LHA RZ1-K(AS) 1 x 240 mm 0,6/1KV (Bobina)
200 ml	Cable LHA RZ1-K(AS) 1 x 95 mm 0,6/1KV (Bobina)
120 ml	PEM ml safata reixeta 150 x 60 Endoll zincada EZ3 Rapide
150 ml	Tub rotllo 90 corrugat vermell canalització N
1	Lloguer tisora d'elevació
1 unitat	Quadre protecció general en quadre estanc IP65
40 ml	Cable LHA RZ1-K(AS) 3G 2,5 mm 0,6/1KV (Bobina)
30 ml	Cable LHA RZ1-K(AS) 3G 6 mm 0,6/1KV (Bobina)
30 ml	Cable LHA RZ1-K(AS) 5G 6 mm 0,6/1KV (Bobina)
35 ml	Cable LHA RZ1-K(AS) 5G 16 mm 0,6/1KV (Bobina)
160 ml	Cable LHA RZ1-K(AS) 1 x 50 mm 0,6/1KV (Bobina)
40 ml	Cable LHA RZ1-K(AS) 1 x 25 mm 0,6/1KV (Bobina)
36 unitats	Safates perforades 150 x 60 / 3M PVC-M1
36 unitats	Tapes 150 PVC-M1 Ral 7035
70 ml	Tub corrugat LHA M-25 320 NW
50 ml	Tub corrugat LHA M-32 320 NW
50 ml	Tub corrugat LHA M-50 320 NW

Aquesta instal·lació elèctrica s'haurà de legalitzar.

Instal·lació de l'escomesa d'aigua: El material i recursos necessaris per a la instal·lació és la següent:


50 ml	Polietilè baixa densitat PE40 10/32 1 rollo de 100 m
2 unitats	Manguito de llautó polietilè 32 x 32
4	Colzes 90 llautó polietilè
3	Enllaç rosca M llautó polietilè 32 x 1
2	Vàlvula tuler palanca HH 1 PN50 Teknik

Instal·lació de l'escomesa del desaigua: El material i recursos necessaris des de l'escomesa disponible fins a cadascun dels mòduls per a procedir a la instal·lació del desaigua és:

17	Tub evacuació 3M Ø110 PVC sèrie B UNE EN 1329
3	Derivació simple PVC HH 45 x 110
4	Colze PVC HH 87 x 110

Per a procedir a la instal·lació del desaigua seran necessàries dues bombes amb trituració.

Plànol dels mòduls de la cafeteria i menjador:

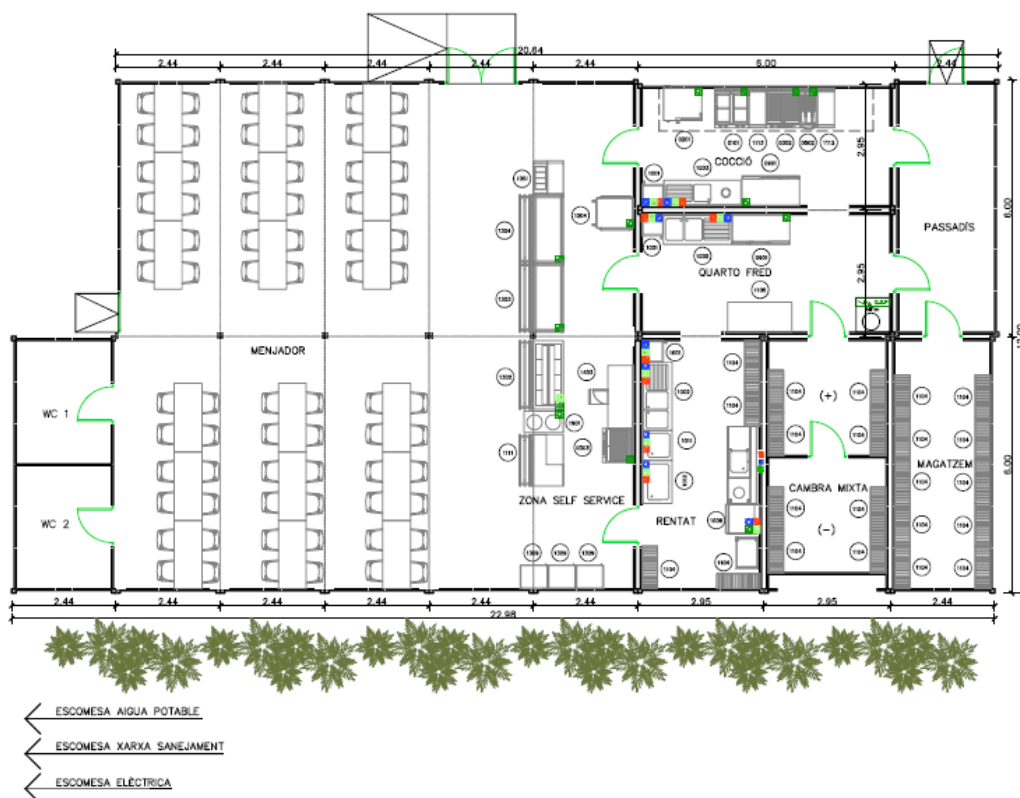

CLÀUSULA CINQUENA.- Seguiment del contracte.

L'empresa adjudicatària haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que es coordinarà amb el responsable de CIRE designat a aquesta feina i que tindrà entre les seves obligacions:

- Actuar com a interlocutor de l'empresa contractista davant de CIRE, canalitzant, d'una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrat de l'equip de treball adscrit al contracte.
- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrat de l'equip de treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.
- Informar a CIRE sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

CLÀUSULA SISENA.- Altres obligacions del contractista.

La/les empresa/es contractista/es haurà/n de complir, a més de les estipulacions establertes al llarg d'aquest plec, amb les obligacions següents:

- Comunicar a CIRE, abans de l'inici del contracte, el personal destinat a tal efecte si així es requereix.
- Realitzar aquelles actuacions prèvies a l'inici del contracte, com ara tramitació dels passis per accés a centres penitenciaris, plans de treball o de lliurament si es demanen, etc.

- Posar a disposició de CIRE els mitjans materials i personals, propis o subcontractats, necessaris per al correcte compliment del contracte així com la substitució d'aquells si per averia o mal funcionament en el cas dels mitjans materials i per indisposició, permisos o vacances en el cas dels mitjans personals requereixen ser coberts de nou.
- Facilitar a CIRE aquella documentació que li sigui requerida en referència al compliment del contracte (albarans, documentació tècnica, etc.)
- Comunicar a la persona interlocutora en CIRE qualsevol incidència que afecti al correcte compliment del contracte adjudicat.
- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, i en concret i respecte la prevenció de riscos, garantir que les persones que presten el servei disposen de la formació adequada per fer-ho.

CLÀUSULA SETENA.- Control de qualitat en els subministraments contractats.

Procediment de gestió de No Conformitat: L'empresa adjudicatària s'ha de fer responsable de què els subministrament i instal·lació objecte d'aquesta licitació, es realitzin d'acord amb els requeriments d'aquest Plec, amb el Plec de clàusules administratives particulars i en el marc de tota la normativa aplicable a l'objecte d'aquest contracte. Queda exempta de responsabilitat en els casos en els que no hagi estat possible per causes de força major degudament justificades o imputables a CIRE.

L'empresa licitadora haurà de disposar d'un procediment de gestió de no conformitats de client que es pugui generar durant l'execució del contracte el qual haurà de presentar a la seva oferta. En cas que les empreses licitadores no disposin d'un procediment de gestió de no conformitat de client propi, haurà de presentar el **compromís de compliment del procediment** segons **Annex núm.1** del present Plec.

El procediment plantejat és el següent: Qualsevol persona del CIRE podrà detectar desviacions en el compliment del contracte. Aquestes desviacions, quan es donin per primera vegada, es catalogaran d'incidències i correspondran a incompliments de requisits, especificacions, procediments, instruccions de treball o de prescripcions contingudes en la present licitació. Aquestes desviacions es comunicaran i tractaran amb l'empresa adjudicatària amb l'objectiu d'evitar una possible reiteració.

En cas de reiteració en els incompliments, el CIRE obrirà un **Informe de no conformitat**, segons **Annex 2**, en el qual es descriurà la desviació detectada. L'empresa adjudicatària haurà de respondre en un **termini màxim de 3 dies naturals** a comptar des de la data de l'enviament de l'Informe de no conformitat, seguint aquest mateix format.

La resposta a la no conformitat tan sols serà vàlida pel CIRE si conté la següent informació:

- Les accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa adjudicatària.
- L'anàlisi i descripció de les causes que han motivat l'incompliment.
- El Pla de mesures correctives que s'activarà per a cada causa detectada.
- La indicació dels responsables que activaran les mesures correctives si els terminis de compliment de les mateixes.

L'incompliment del termini de resposta així com la manca de continguts en l'informe de no conformitat suposaran l'obertura d'un nou informe de no conformitat, sense perjudici de les possibles sancions que se'n puguin derivar.

Les empreses licitadores que presentin el seu Procediment de gestió de no conformitat, hauran de complir amb els continguts especificats en el propi informe (accions immediates, anàlisi de causes, mesures correctives, etc.), així com el compliment del termini de resposta.

A posteriori, CIRE realitzarà una avaluació del seguiment del Pla d'accions correctives derivat dels Informes de no conformitat, fins arribar al tancament individualitzat de les accions proposades.

Així mateix es farà seguiment d'aquelles Recomanacions de millora detectades en el decurs del contracte, derivades de les visites i contactes del personal responsable de CIRE amb el contractista.

CLÀUSULA VUITENA.- Confidencialitat.

Les empreses licitadores hauran de presentar el compromís de confidencialitat, segons el model que s'adjunta com **Annex núm.3** i com **Annex núm.4** d'aquest plec, com a protecció de les dades que coneguin com a conseqüència de la visita als espais objecte de contracte i la prestació del servei encarregat.

CLÀUSULA NOVENA.- Visita dels licitadors als espais objecte del contracte.

Les empreses licitadores hauran de presentar el compromís de confidencialitat, segons el qual podran visitar les instal·lacions i equipaments objecte d'aquesta licitació

Tots els licitadors hauran de signar i presentar l' **Annex núm.3** i com l'**Annex núm.4** d'aquest plec, per tal de que en cap cas puguin al·legar el desconeixement dels espais i equipaments per al correcte compliment del contracte.

Els dies de les visites s'inclouran a l'anunci de licitació publicat a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. Els licitadors que realitzin les visites obligatòries emplenaran, signaran i presentaran al sobre de documentació corresponent el model que s'adjunta com **Annex núm.5** d'aquest plec.

Annex núm.1

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS EQUIPATS PER PODER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA DURANT LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 - PO SU 0268 2025.

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE PROCEDIMENT DE NO CONFORMITAT.

El/la senyor/a _____, amb
el NIF núm. _____ com a _____ de l'empresa _____
amb el NIF núm. _____.

DECLARA

Sota la seva responsabilitat, el compromís a respondre, en el **termini màxim de 3 dies naturals**, als informes de No Conformitats que puguin obrir-se durant l'execució del present contracte:

Així mateix, manifesta ser coneixedor que per la validesa de la resposta de l'empresa licitadora, davant dels Informes de no conformitats que es puguin trametre, aquests hauran de presentar el següent continguts:

- ☐ Accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa proveïdora
- ☐ Anàlisi i descripció de les causes que han motivat el incompliment
- ☐ Pla de mesures correctores que s'activarà per a cada causa detectada
- ☐ Indicació dels responsables que activaran les mesures correctores i els terminis de compliment de les mateixes

Lloc i data

ANNEX núm.2

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS EQUIPATS PER PODER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA DURANT LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 - PO SU 0268 2025.

INFORME DE NO CONFORMITAT.

Nº NC		NO CONFORMITAT TIPUS:	Escollir NC Tipus
-------	--	-----------------------	-------------------

DATA		CLIENT / PROVEÏDOR:	
NÚM. PEP		TÈCNIC:	

OMPLIR CAMP EN CAS D'EXISTIR CODIFICACIÓ DE NC PER PART DEL CLIENT

Nº NC CLIENT / PROVEÏDOR:	
---------------------------	--

Descripció de Producte:	
Quantitat Afectada:	

DESCRIPCIÓ NO CONFORMITAT

Què ha passat?

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE DETECCIÓ

Com s'ha detectat?

ACCIONS IMMEDIATES

Com hem actuat?

ANÀLISI CAUSES DE LA NO CONFORMITAT

Per què ha passat?

ACCIONS CORRECTIVES

Data d'aplicació d'accions: Posar Data Acció Correctiva

Què farem perquè no torni a passar?

VERIFICACIÓ EFICÀCIA

Comentaris?

La mesura ha estat eficaç?

☐ SI

☐ NO

La No Conformitat es dona per tancada?

☐ SI

☐ NO

ELIMINACIÓ I TANCAMENT D'ACCIÓ CORRECTIVA		
DATA DE TANCAMENT		
REVISAT PER EL RESPONSABLE DE QUALITAT		
Signatura Resp. Qualitat:		
Data:		

NOTA SOBRE IMATGES:

En cas que fos necessari documentar visualment alguna No Conformitat, les imatges s'han d'enviar com arxiu adjunt en un missatge de correu electrònic dirigit al responsable de Qualitat.

IMATGE 1	IMATGE 2
IMATGE 3	IMATGE 4



IMATGE 5



IMATGE 6

ANNEX NÚM.3

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS EQUIPATS PER PODER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA DURANT LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 - PO SU 0268 2025.

DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT DE DADES.

El Sr. / Sra., amb NIF núm., d'ara endavant la persona interessada, en nom de l'empresa cas de resultar adjudicatària d'aquest expedient, declara que té plena capacitat legal per a subscriure aquest document, i també per a complir les obligacions i assumir les responsabilitats que contrau amb la signatura.

Aquesta declaració responsable es regula per les clàusules següents:

Primera. Que cas de resultar adjudicatària en cap cas s'al·legarà com a causa d'incompliment de qualsevol de les clàusules del contracte el desconeixement dels espais i instal·lacions necessàries per tal de donar compliment a l'objecte d'aquest contracte.

Segona. Compromís de confidencialitat: La persona interessada assumeix, voluntàriament i en virtut d'aquest document, el compromís de confidencialitat sobre tota la informació relativa als centres de treball, i a les persones sotmeses a mesures judicials d'aquells, dels quals el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) li permeti l'accés. El compromís que assumeix la persona interessada inclou, també, l'obligació de fer-lo extensiu als seus treballadors/res, assessors/res, representants o qualsevol altra persona col·laboradora que, en nom o en benefici de la persona interessada, intervingui en la prestació de servei objecte del contracte. El compromís estableix les obligacions següents:

- La persona interessada es compromet a mantenir, en reserva i en rigorós secret, la informació que rebí dels centres penitenciaris durant l'execució del contracte, i mantenir-la degudament protegida de l'accés de persones no autoritzades a conèixer-la ni a fer-ne ús.
- La persona interessada es compromet a no divulgar ni utilitzar la informació dels centres per a finalitats diferents de les estrictament necessàries per realitzar els treballs objecte del contracte.
- La persona interessada no recavarà altra informació de les persones sotmeses a mesures judicials adscrites per CIRE a l'execució d'aquest contracte que aquelles que li siguin expressament facilitades.
- La persona interessada no farà divulgació d'aquesta informació fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest contracte.

Tercera. Condicions d'ús i de divulgació de la informació: La persona interessada només pot donar a conèixer la documentació i la informació dels centres de treball i persones sotmeses a mesures judicials als seus treballadors/res, directors/res, socis/es, associats/des, assessors/es, agents o representants, en la mesura estricta i necessària en què cadascú necessiti conèixer-la per realitzar els treballs previstos, o bé al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) en el cas que li requereixi, d'acord amb les lleis de procediment. L'obligació de la confidencialitat de la informació recau, com s'ha dit a la clàusula primera, en la persona interessada i en aquelles altres que, necessàriament, hagin de conèixer la informació per a la seva feina.

Quarta. Responsabilitat: De l'incompliment de qualsevol de les obligacions de confidencialitat i custòdia de les dades dels centres penitenciaris i persones sotmeses a mesures judicials, establertes en aquest document de compromís, se'n farà responsable a la persona interessada. Aquesta haurà d'atendre les sancions per l'incompliment de les obligacions i les responsabilitats, pels perjudicis ocasionats al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), o a terceres persones relacionades, directament o indirectament, amb la informació del centre, sempre que la vulneració del compromís sigui imputable a la persona interessada o als seus/seves col·laboradors/es.

Cinquena. Temporalitat: El compromís de reserva i de secret rigorós relatiu a la informació obtinguda per la persona interessada tindrà una vigència indefinida, llevat que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) alliberi la persona interessada d'aquests compromisos, de manera expressa i per escrit.

Sisena. Modificacions: El present document constitueix la totalitat del compromís assumit per la persona interessada com a obligació a favor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Per tant, el document no podrà ser modificat unilateralment. Per modificar-lo, caldrà l'acceptació mútua, expressa i escrita de les dues parts.

La persona interessada reconeix i manifesta que coneix la totalitat del contingut d'aquest document de compromís i que entén l'abast, les obligacions i les responsabilitats directes i indirectes que se'n deriven. Com a prova d'acceptació, la persona interessada el signa a la ciutat de, el d de 2025.

(Nom, segell i signatura)

ANNEX NÚM.4

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS EQUIPATS PER PODER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA DURANT LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 - PO SU 0268 2025.

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT – REBUDA DE PLÀNOLS.

El Sr. / Sra., amb NIF núm., d'ara endavant la persona interessada, en nom de l'empresa està autoritzada a conèixer els plànols dels espais destinats als treballs objecte d'aquesta licitació del Centre Penitenciari Brians 1, centre que depèn del Departament de Justícia i Qualitat Democràcia de la Generalitat de Catalunya.

En la data de la signatura d'aquest document, la persona interessada declara que demana la documentació relativa als plànols dels espais destinats al objecte d'aquesta licitació del Centre Penitenciari Brians 1 i amb la signatura d'aquest document acceptarà l'esmentada documentació i, assumirà el compromís de garantir-ne la confidencialitat.

La persona interessada declara i certifica que té plena capacitat legal per a subscriure aquest document, i també per a complir les obligacions i assumir les responsabilitats que contrau amb la signatura.

El compromís es regula per les clàusules següents:

Primera: El compromís:

La persona interessada assumeix, voluntàriament i en virtut d'aquest document, el compromís de confidencialitat sobre tota la informació relativa al centre de treball a la qual el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) li permeti l'accés. El compromís que assumeix la persona interessada inclou, també, l'obligació de fer-lo extensiu als seus treballadors/res, assessors/res, representants o qualsevol altra persona col·laboradora que, en nom o en benefici de la persona interessada, intervingui en els treballs abans esmentats. El compromís estableix les obligacions següents:

- 1.1 La persona interessada es compromet a mantenir, en reserva i en rigorós secret, la informació del centre, i mantenir-la degudament protegida de l'accés de persones no autoritzades a conèixer-la ni a fer-ne ús.
- 1.2 La persona interessada es compromet a no utilitzar la informació del centre per a finalitats diferents de les estrictament necessàries per realitzar els treballs abans esmentats en el centre.
- 1.3 La persona interessada s'obliga a no fer ni a permetre fer cap còpia o reproducció, total o parcial, dels documents d'informació del centre, sense el consentiment previ, expressat per escrit, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).
- 1.4 La persona interessada reconeix expressament que no té autorització per divulgar ni per utilitzar la informació del centre per a objectius que no s'estableixin en aquest document.
- 1.5 La persona interessada, quan hagi finalitzat els treballs pels quals ha estat contractada, es compromet a tornar tota la documentació del centre de treball rebuda del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

Segona: Condicions d'ús i de divulgació de la informació:

La persona interessada només pot donar a conèixer la documentació i la informació del centre de treball als seus treballadors/res, directors/res, socis/es, associats/des, assessors/es, agents o representants, en la mesura estricta i necessària en què cadascú necessiti conèixer-la per realitzar els treballs previstos, o bé a Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) en el cas que li requereixi, d'acord amb les lleis de procediment. L'obligació de la confidencialitat de la informació recau, com s'ha dit a la clàusula primera, en la persona interessada i en aquelles altres que, necessàriament, hagin de conèixer la informació per a la seva feina.

Tercera: Propietat de la informació:

La totalitat de la informació del centre, subministrada pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), a la qual tingui accés la persona interessada o els seus col·laboradors/es, és propietat del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Per això, qualsevol divulgació o utilització de la informació amb finalitats diferents de les que s'ha autoritzat a conèixer-la, no atorgarà cap dret, sense perjudici de les responsabilitats legals en què es pugui incórrer.

Quarta: Responsabilitat:

De l'incompliment de qualsevol de les obligacions de confidencialitat i custòdia de les dades del centre, establertes en aquest document de compromís, se'n farà responsable a la persona interessada. Aquesta haurà d'atendre les sancions per l'incompliment de les obligacions i les responsabilitats, pels perjudicis ocasionats al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), o a terceres persones relacionades, directament o indirectament, amb la informació del centre, sempre que la vulneració del compromís sigui imputable a la persona interessada o als seus/seves col·laboradors/es.

Cinquena: Temporalitat:

El compromís de reserva i de secret rigorós relatiu a la informació obtinguda per la persona interessada mitjançant plànols i documentació del centre tindrà una vigència indefinida, llevat que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) alliberi la persona interessada d'aquests compromisos, de manera expressa i per escrit.

Sisena: Modificacions:

El present document constitueix la totalitat del compromís assumit per la persona interessada com a obligació a favor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Per tant, el document no podrà ser modificat unilateralment. Per modificar-lo, caldrà l'acceptació mútua, expressa i escrita de les dues parts.

La persona interessada reconeix i manifesta que coneix la totalitat del contingut d'aquest document de compromís confidencialitat i que entén l'abast, les obligacions i les responsabilitats directes i indirectes que se'n deriven. Com a prova d'acceptació, la persona interessada el signa a aquest document a la ciutat de, el d de 20....

(Nom i signatura digital)

ANNEX NÚM.5

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS MÒDULS EQUIPATS PER PODER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA DURANT LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 - PO SU 0268 2025.

MODEL DE DECLARACIÓ SEGONS LA QUAL ELS LICITADORS MANIFESTEN HAVER VISITAT L'ESPAI PER INSTAL·LAR ELS MÒDULS EQUIPATS PER REALITZAR EL SERVEI DE CAFETERIA.

El Sr. / La Sra. amb
DNI núm. en representació de l'empresa
..... manifesta haver visitat les dependències dels
Centres Penitenciaris i/o educatius que tot seguit es relaciona, en compliment d'allò establert en el Plec de Prescripcions Tècniques o en aquesta licitació, per tal de poder confeccionar l'oferta econòmica i tècnica presentada en la licitació d'aquest expedient:

CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1	
Data de la visita:	
PER PART DE L'EMPRESA LICITADORA	PER PART DE CIRE
Nom, cognoms i signatura de la/les persona/persones que realitzen la visita	Tècnic/tècnics que acompanyen la visita.

Es poden imprimir i utilitzar tants fulls corresponents a aquest Annex com el licitador necessiti.

Amb la signatura d'aquest document s'accepta conèixer i acceptar l'estat de la maquinària objecte del lot a que es presenta.
