



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ DEL MÒDUL
DE SALVAMENT AMB TORRE DE VIGILÀNCIA I LAVABOS PER CALA
MONTGÓ**

Ajuntament de Torroella de Montgrí

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

1.1 Objecte del contracte

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament i la instal·lació del Mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos per a la platja de Cala Montgó.

En data de 30 de setembre del 2020, la Conferència Sectorial de Turisme va ratificar l'aprovació del "Plan de Sostenibilidad Turística en Torroella de Montgrí i l'Estartit", proposat per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. El projecte, de nom "Torroella de Montgrí i l'Estartit: Comprometidos con la Calidad, la Sostenibilidad y la Cultura", consta de 6 línies d'actuació, essent la número 1 destinada a la millora de l'oferta turística del municipi. L'actuació 1.1 correspon a la millora de la qualitat de les platges, apostant per la renovació d'alguns dels equipaments existents i l'adquisició de nou material, entre d'altres. El contracte pretén dur a terme aquesta actuació.

L'objectiu d'aquesta actuació és, doncs, millorar la qualitat de les platges, introduint-hi mobiliari urbà.

Les especificacions tècniques mínimes que han de complir els licitadors es troben descrites en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

L'objecte del contracte inclou, a càrrec de l'empresa subministradora, el cost i despeses associades als següents serveis:

- Transport del mòduls prefabricats fins al lloc d'instal·lació.
- Descàrrega i muntatge (si escau) dels mòduls amb mitjans i personal a càrrec de l'empresa subministradora.
- Primera instal·lació i connexió a la xarxa de serveis (aigua, electricitat i clavegueram) del mòdul al lloc establert pel consistori.

El contracte porta implícit, el cost i les despeses de descàrrega i lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al lloc convingut que hauran de ser a compte del contractista, així com qualsevol operació de muntatge i connexió a serveis que requereixi el material a subministrar. i desconexió, retirada i la gestió dels equipaments instal·lats actualment.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement**



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Els licitadors assumeixen la responsabilitat pels models, marques i patents que utilitzin, presumint-se per part de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí que compten amb les autoritzacions oportunes.

Objecte alineat amb els ODS següents:

- ☐ ODS 1 ☐ ODS 2 ☐ ODS 3 ☐ ODS 4 ☐ ODS 5 ☐ ODS 6
☐ ODS 7 ☐ ODS 8 ☐ ODS 9 ☐ ODS10 ☒ ODS 11 ☐ ODS 12
☐ ODS 13 ☒ ODS 14 ☒ ODS 15 ☐ ODS 16 ☐ ODS 17

1.2 Divisió en lots

No procedeix, per raons d'idoneïtat en l'execució global per a la prestació del servei, d'acord amb les especificacions del Plec de prescripcions tècniques. El servei ha de contemplar una visió i metodologia de treball unificades, el que aconsella la no divisió en lots. Per altra banda, l'adjudicació a diferents empreses incrementaria el cost global i la coordinació eficient del servei.

En el cas del servei que es licita cal que es gestioni de forma unificada i sota una mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s'ha acordat la no divisió en lots.

Subministrament i instal·lació de mòduls prefabricats per a platges, en les següents localitzacions:

- Mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos, a platja de Cala Montgó

1.3 Codis CPV

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, són:

44211100-3 Prefabricats modulars

45223800-4 Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades

34928400-2 Mobiliari Urbà

45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà

1.4 Lloc i termini de lliurament

El lloc de lliurament és el següent:

Subministrament i instal·lació d'un mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos a Cala Montgó



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

La instal·lació del mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos es realitzarà a la platja de Cala Montgó definit al **mapa annex** sempre prèvia validació del serveis tècnics de l'Ajuntament.

El termini màxim de lliurament, per al mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos objecte del present contracte serà de 4 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

El present contracte serà improrrogable.

Justificació de la durada:

S'estableix aquesta durada del contracte atès que l'15/06/26 és la data d'inici de prestació del servei de salvament i socorrisme i es fa necessari comptar amb cert marge per tal de dur el material propi del servei,

Ahora, el termini concedit és habitual en contractes de subministrament amb instal·lació d'aquest tipus de productes, el qual es considera suficient per poder ser assumit per empreses especialitzades en la fabricació de mòduls prefabricats o similars.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL A SUBMINISTRAR

El material a subministrar, comprès en la present licitació és el següent:

2.1 Subministrament i instal·lació d'un mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos.

L'objecte del present lot és el subministrament i instal·lació d'un mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos per a Cala Montgó, ubicada sobre el Passeig Marítim de l'esmentada cala.

El mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos, haurà de disposar com a mínim de les següents característiques:

Condicions General de l'equipament:

Condicions generals i requisits a considerar per al disseny i fabricació del mòdul de salvament a subministrar i instal·lar a Cala Montgó:

- Estructura totalment desmuntable, no admetent-se l'ús de materials d'ofici de paleta ni formigó, prohibint-se qualsevol element d'obra fixa.
Tindran una estructura compacta, amb un sistema de subjecció que permeti una fàcil manipulació per poder ser retirats ràpidament i transportats còmodament.
- Utilització de materials de baix manteniment, no deformables i d'alta resistència a la corrosió per factors atmosfèrics i d'altres factors susceptibles de degradar o malmetre el material.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 3 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E

Ajuntament de
Torroella de MontgríGeneralitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i ConeixementGOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMOSECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

Dimensions	Ample: 2500mm Llarg: 6200mm Alçada: 2850mm
Espais i equipaments	1. Espai compost per: Sala d'atenció i cures sanitàries, equipat amb: pica rentamans amb armari inferior i superior per emmagatzematge, dispensador de paper de mans, sabonera, pica rentapeus, armari tancat amb portes i dotat de prestatgeries interiors, Divan de reconeixement, banc de vestuari de 90 cm., Làmpada halògena amb lupa de 5 augments, etc. Office i zona d'estada pel personal del servei de socorrisme, equipada amb: taula de treball i pels equips de comunicació, cadira d'escriptori, espai lliure per ubicar-hi frigorífic -baix-i armari a la part superior amb prestatge per col·locar microones. Fabricació de mobiliari a mida, encastat en las estàncies, per un millor aprofitament de l'espai. A la part exterior, donant al Passeig marítim, s'instal·larà un toldo extensible sistema cofre 2. WC interior unisex, d'ús exclusiu pel personal de servei, equipat amb: inodor, pica rentamans, mirall, sabonera per sabó líquid, aixeta amb polsador a pressió tipus "presto", maneta, porta-rotlles de paper higiènic, paperera, penjador. 3. WC PMR unisex d'ús pel usuàries de la platja. El lavabo PMR estarà equipat amb sanitaris de porcellana vitrificada i accessoris de lavabo (mirall d'acer inoxidable antivandàlic, paperera, porta-rotlle de paper, dosificador, penjadors, escombreta de neteja i agafadors abatibles i fixos homologats, canviador de nadons). Aixetes amb polsador a pressió tipus "presto", palanca o cèl·lula fotoelèctrica. Amb reductor de cabal i/o airejador. Cisternes dels vàters amb sistema de doble descàrrega. Tots els accessoris interiors han de tenir els cantons arrodonits per evitar danys físics als usuàries. 4. Torre de vigilància. A la coberta, el mòdul disposarà d'escaleres per poder accedir a la torre de vigilància. Aquesta torre tindrà l'espai òptim per al resguard dels socorristes, protegint-los de la incidència directa del sol sense pèrdua del camp visual, essent a més un espai segur on emmagatzemar equips de salvament, comunicació i senyalització.
Materials (iguals o qualitat superior)	Fet completament de fusta laminada amb classificació estructural GL 24h i fusta massissa amb classificació estructural C24 de pi nòrdic, tractada en autoclau classe d'ús 3, excepte l'estructura de base realitzada amb bigues de pi nòrdic massís d'escaire de 200x70 mm, tractades en autoclau classe d'ús 4. El paviment del mòdul serà mitjançant tauler contraxapat marí antilliscant de 15 mm de gruix (cara superior amb làmina vinílica antilliscant en color gris i cara inferior amb revestiment protector vinílic), a més la unió entre el paviment i el parament vertical es rematarà mitjançant sòcol de 100 mm d'alçada x 8 mm de gruix, el qual tindrà una funció estètica i impermeable. Tancament exterior mitjançant tauler compacte HPL d'alta pressió ignífug de 8 mm de gruix (color a determinar), estructura portant de fusta laminada amb



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 4 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

	classificació estructural GL 24h, aïllament tèrmic de llana de roca de 50 mm de gruix i tancament interior de tauler plastificat antihumitat de 16 mm de gruix. Serigrafia exterior en vinil (s'acordarà tota la vinilació amb l'Ajuntament) La coberta serà plana amb pendent interior a una aigua, realitzada amb tauler marí WBP de 18 mm de gruix (vist des de l'interior, sostre ras, realitzat mitjançant tauler plastificat antihumitat de 16 mm de gruix), estructura portant, quitranat complet de la mateixa mitjançant mastic bituminós i revestiment exterior mitjançant manta asfàltica contínua POLITABER autoprotegida amb grànuls minerals, termosellada i fixada mitjançant grapes d'acer inoxidable. Torre de vigilància: a la zona on es col·locarà la zona de vigilància es col·locaran llistons ancorats a les encavallades estructurals de la coberta en forma cònca, revestits superficialment mitjançant dues de fusta de pi nòrdic, tractades en autoclau classe d'ús 4. La pèrgola comptarà amb estructura sistema mecanos, perquè es pugui muntar i desmuntar de forma senzilla, realitzada en fusta laminada amb classificació estructural GL 24h de pi nòrdic i amb revestiment de coberta mitjançant lona ignífuga (M1) resistència al foc, en color crema amb propietats ultraviolades. Per accedir a la torre de vigilància el mòdul incorpora escala desmuntable. Les portes d'accés són massisses de 60 mm de gruix i estaran compostes per pany de seguretat d'acer inoxidable, frontisses d'acer inoxidable antivandàliques i maneta d'acer inoxidable. Les finestres estaran fabricades amb fusta de pi nòrdic i comptaran amb metacrilat de 5 mm de gruix transparent que evitarà la seva fragmentació davant de trencaments, persianes de làmines d'alumini a l'interior, contra finestra exterior realitzada mitjançant tauler compacte d'alta pressió d'HPL de 8 mm i reixa de seguretat de ferro galvanitzat encastada a l'estructura del bastidor de la finestra. Ferramenta d'acer inoxidable i cromo.
Instal·lació elèctrica i altres	Les instal·lacions elèctriques hauran de quedar ocultes a l'interior dels revestiments, fals sostre, etc. construïdes segons normativa de baixa tensió i altra legislació aplicable. El quadre de distribució no podrà quedar accessible des de l'exterior. Instal·lació interior d'il·luminació i endolls suficients amb una capacitat de 3,3 Kw.: cal preveure la il·luminació de les diverses estances i la dotació de suficients endolls per connectar tot tipus d'aparells elèctrics: walkietalkie, PC, carregador de mòbil, electrodomèstics, etc. Il·luminació automàtica amb detector de presència als lavabos i llums tipus LED de baix consum. Tota la instal·lació interior de fontaneria.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 5 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E

Ajuntament de
Torroella de MontgríGeneralitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i ConeixementGOBIERNO
DE ESPAÑAMINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMOSECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

La ubicació que es fa arribar per part de l'Ajuntament és orientatiu pendent de disposar la seva conformació, d'acord amb l'annex 1 el qual conté el plànol del mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos.

3. TERMINI GARANTIA DEL MATERIAL

El termini de garantia dels elements subministrats a comptar des de la data del document de lliurament serà de 5 anys, sens perjudici del termini de garantia que pugui afegir l'adjudicatari segons els criteris d'adjudicació.

4. DADES ECONÒMIQUES

4.1 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació total és de TRENTA-SET MIL CENT NORANTA AMB VUIT CÈNTIMS (37.190,08€), IVA exclòs, més SET MIL VUIT CENTS NOU AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (7.809,92 €) corresponents al 21% d'IVA, essent una despesa total de QUARANTA-CINC MIL (45.000,00 €).

El pressupost base de licitació es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes que a continuació es relacionen:

Concepte	Import total del contracte
Costos directes:	
Mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos	37.190,08 €
Total costos directes:	37.190,08 €
Costos indirectes:	
PRESSUPOST BASE (sense IVA)	37.190,08 €
IVA	7.809,92 €
Total costos indirectes	7809,9168
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	45.000,00 €

En tant que es tracta d'un subministrament, el pressupost base de licitació s'ha calculat tenint en compte els preus de mercat. En qualsevol cas, el pressupost base de licitació inclou la totalitat de costos directes i indirectes, com puguin ser les despeses de transport, entrega i instal·lació, despeses generals i benefici industrial i altres conceptes vinculats als elements a subministrat, d'acord amb les especificacions del present PPT.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 6 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

6. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATÀRIA

L'empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda diligència, amb l'estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d'altres, les obligacions següents:

- Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a terme, amb la deguda eficàcia, l'objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els presents plecs.
- Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
- Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d'assegurança per responsabilitat civil.

7. ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATÀRIA

Seràn obligacions del contractista:

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a l'execució del contracte s'ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

L'adjudicatari és el responsable de senyalitzar els treballs a realitzar, amb mitjans propis i fins al límit que determinin el tècnic municipal i les normes vigents en matèria de salut laboral i seguretat ciutadana.

b) Obligacions respecte del personal

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d'aplicació.

L'Ajuntament és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l'esmentat personal, quedant en conseqüència l'Ajuntament exempta de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seràn d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, pel personal al seu càrrec.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 7 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



**Ajuntament de
Torroella de Montgrí**



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Empresa
i Coneixement**



A nivell general, el personal de l'entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat d'acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l'Ajuntament a l'efecte de preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 8 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



Ajuntament de
Torroella de Montgrí



Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO


ANNEX:

1. Mapa ubicació Mòdul de salvament amb torre de vigilància i lavabos:

La instal·lació es farà sobre el passeig marítim de la platja de Cala Montgó.

Podeu consultar la ubicació exacta al següent enllaç:

📍 Ubicación en Google Maps

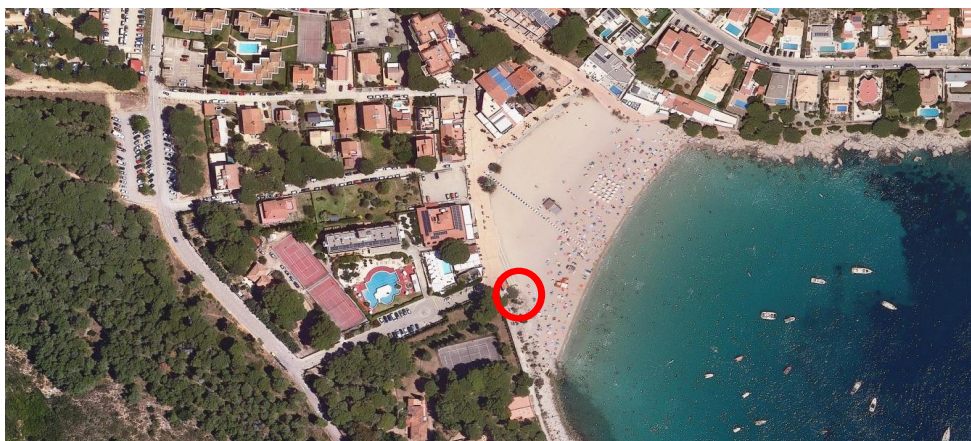

2. Fotos Caseta salvament a substituir:



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 9 de 10



SIGNAT PER

Lidia Alonso Collado
Cap de la unitat de Promoció i Turisme
11/12/2025



Ajuntament de
Torroella de Montgrí

NIF: P1721200B

Contractació

Expedient 190857E



Ajuntament de
Torroella de Montgrí




Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa
i Coneixement



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

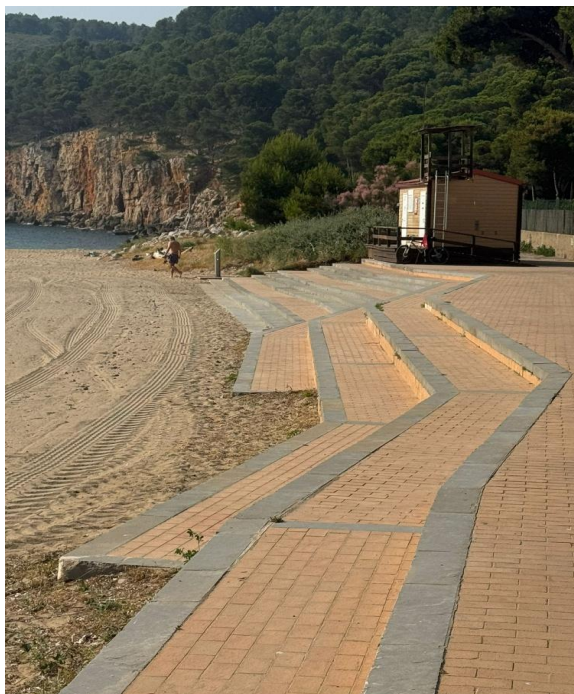

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ARTK H9RV EQH9 4K7A

Plec de prescripcions tècniques - SEFYCU 176178

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 10 de 10
