



EXP. X2025002912. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'UNA CONSTRUCCIÓ MODULAR AMB ELEMENTS PREFABRICATS PER A LES INSTAL·LACIONS DELS VESTIDOR I ANNEXES DEL CAMP DE FUTBOL PEDRASANTA. PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNQUES PARTICULARS.

ÍNDEX

MEMORIA	2
1. CONSIDERACIONS GENERALS	2
1.1. Objecte del plec	2
1.2. Localització	2
1.3. Subministrament	3
1.4. Modificacions de les instal·lacions	3
2. CONDICIONS D'EXECUCIÓ I REQUERIMENTS DE L'OFERTA A PRESENTAR	3
2.1. Especificacions tècniques	4
2.2. Mòdul vestuari jugadors	5
2.3. Mòdul vestuari àrbitre	7
2.4. Mòdul oficina/magatzem	9
2.5. Mòdul BAR	10
2.6. Mòdul LAVABOS	12
2.7. Seguiment i control dels treballs	13
2.8. Materials	13
2.9. Seguiment del contracte	13
3. SEGURETAT I SALUT	14
4. OMISSIONS	14
5. DISCONFORMITAT	14
6. INICI DEL CONTRACTE	14
7. DURADA I TERMINI DE LLIURAMENT	15
8. VALORACIÓ DE LES OFERTES	15
8.1. Oferta Econòmica (Fins A 40 Punts)	15
8.2. Subministrament de mòduls addicionals (fins a 30 punts)	15
8.3. Acabat en color a determinar per la direcció facultativa (fins a 10 punts)	15
8.4. Vinilat exterior dels mòduls prefabricats (fins a 10 punts)	15
9. PREU	16
ANNEX 1 – PROPOSTA D'EMPLAÇAMENT	17

Ajuntament



de Tremp

MEMORIA

1. CONSIDERACIONS GENERALS

Els actuals vestuaris i serveis del camp de futbol municipal presenten un estat obsolet i no compleixen amb la normativa vigent en matèria d'higiene, seguretat i accessibilitat. Les instal·lacions existents presenten deficiències greus, com ara:

- Problemes de salubritat: humitats, ventilació insuficient i deteriorament dels acabats.
- Instal·lacions deficientes: xarxes elèctriques i de fontaneria en mal estat, amb risc per als usuaris.
- Incompliment normatiu: manca d'adaptació a la normativa d'accessibilitat i seguretat.
- Capacitat insuficient: els espais actuals no responen a les necessitats dels equips i usuaris.

Aquestes condicions afecten negativament la qualitat del servei esportiu i la seguretat dels usuaris, per la qual cosa és imprescindible substituir els vestuaris existents per uns mòduls prefabricats que garanteixin:

- Compliment de la normativa vigent (accessibilitat, seguretat i higiene).
- Rapidesa en la instal·lació i posada en servei.
- Eficiència econòmica i funcional.
- Adaptabilitat a les necessitats actuals i futures del camp de futbol.

1.1. Objecte del plec

Aquest plec té com a objecte fixar les prescripcions tècniques del subministrament d'un conjunt de mòduls amb sistema d'il·luminació, d'instal·lacions necessàries per al seu funcionament i dels equips energètics eficients com a espais de:

- Vestidor amb dutxes i lavabo
- Serveis higiènics per als espectadors
- Espai/Magatzem per a les entitats usuàries
- Zona de Bar

1.2. Localització

L'actuació s'emplaça a l'explanada situada a l'entrada del Camp de Futbol Pedrasanta. Aquesta superfície serà pavimentada i les instal·lacions necessàries de tal manera que un cop siguin subministrats els mòduls prefabricats, es col·locaran en les ubicacions indicades en aquest document i es connectaran a les xarxes de sanejament, d'aigua potable i d'instal·lació elèctrica.

Codi Segur de Verificació:
3e7f211d-790d-42fb-b875-270396328518
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2025_9943835
Data d'impressió: 24/12/2025 08:18:41
Pàgina 3 de 17

SIGNATURES
1.- Sandra Rigol Balocas (SIG) (ENGINYERA), 19/12/2025 13:01



1.3. Subministrament

L'objecte del contracte és el subministrament i col·locació a l'emplaçament indicat mòduls necessaris per al correcte funcionament de l'equipament Camp de Futbol Pedarsanta. Aquests mòduls estan definits a l'apartat 2 i hi ha una descripció gràfica aproximada.

El preu del contracte inclou:

- El transport d'entrega i el muntatge dels mòduls amb tots els elements inclosos a la descripció.
- L'elaboració de plànols amb una descripció exacta del conjunt mòduls, per dur a terme el control i el seguiment del subministrament a realitzar. Haurà d'incloure els punts de sortida i entrada de les instal·lacions.
- L'assessorament tècnic necessari respecte a la composició de conjunts modulars, l'ús i el seu manteniment davant problemes específics.

1.4. Modificacions de les instal·lacions

Si l'empresa adjudicatària considerés oportú realitzar modificacions en les instal·lacions amb l'objectiu de millorar la realització del subministrament, haurà de comunicar la seva petició al Departament d'Obres i Serveis. Sense el consentiment del qual no es podran realitzar els canvis esmentats.

2. CONDICIONS D'EXECUCIÓ I REQUERIMENTS DE L'OFERTA A PRESENTAR

L'objecte de la present licitació és el subministrament, transport i muntatge de mòduls d'elements prefabricats per a la implantació dels vestuaris del camp de futbol i serveis annexes, del Camp de Futbol Pedarsanta de Tremp.

Els treballs d'infraestructura NO formen part també de l'objecte d'aquest contracte, però el subministrador haurà de definir les necessitats d'escomeses per tal que la preparació del paviment sigui la necessària pels mòduls a instal·lar.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 0051-000020-2025
Codi Segur de Verificació: 3e7f211d-790d-42fb-b875-270396328518 Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2025_9943835 Data d'impressió: 24/12/2025 08:18:41 Pàgina 4 de 17		SIGNATURES 1.- Sandra Rigol Balocas (SIG) (ENGINYERA), 19/12/2025 13:01



La connexió del mòdul a la xarxa de clavegueram, aigua potable i xarxa elèctrica NO quedarà en aquesta contractació.

El subministrament ha de contemplar els següents mòduls prefabricats:

- 4 mòduls de VESTUARIS JUGADORS.
- 2 mòduls de VESTUARIS ÀRBITRE.
- 2 mòduls de OFICINA I MAGATZEM.
- 1 mòdul de Bar.
- 1 mòdul LAVABOS
- 1 mòdul LAVABO ADAPTAT

2.1. Especificacions tècniques

La construcció modular estarà constituïda de varis elements prefabricats i haurà de complir els següents paràmetres:


- 4 mòduls de vestuaris per jugadors
- 2 mòduls de oficina i magatzem
- 2 mòduls de vestuaris àrbitre
- 1 mòdul de Bar
- 1 mòdul banys que inclogui bany adaptat

En tots els casos, el pes i la resta de característiques dels components hauran de permetre el seu transport i col·locació sense la utilització de mitjans extraordinaris i per les vies ordinàries de circulació rodada.

El subministrador aportarà la documentació que permeti justificar la qualitat dels components del producte ofert.



2.2. Mòdul vestuari jugadors

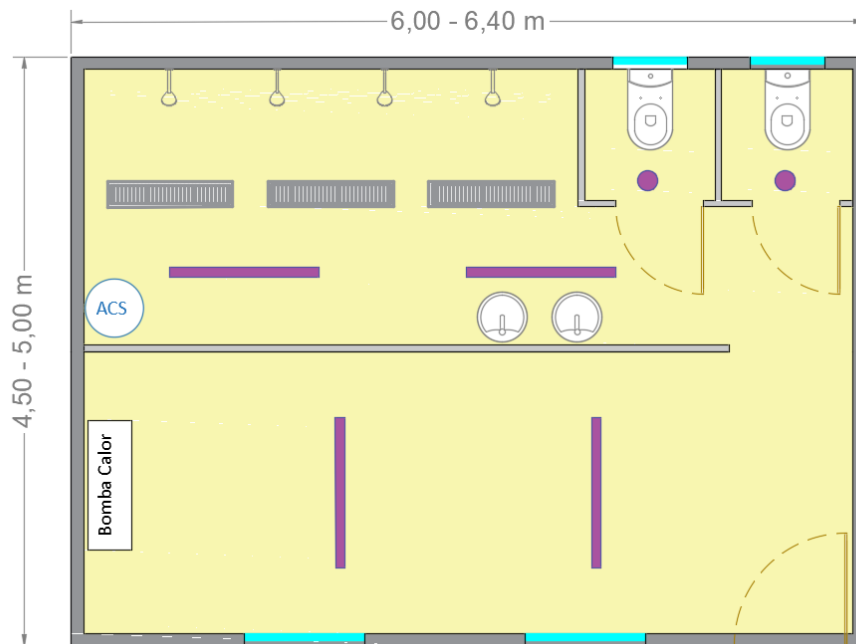

Cada unitat de mòdul vestuari tindrà les següents característiques:

- **Estructura**
 - Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm, adossable i apilable.
 - Mesures exteriors mínimes 4,50x 6,00 m / màx 5,00x 6,40 m
 - Base amb travessers UPN de 140 i travessers 80x80x4mm.
 - Imprimació anticorrosió i acabat amb esmalt setinat.
- **Cobertes**
 - Coberta de xapa galvanitzada trapezoïdal de 0,6mm.
 - Aïllament de llana mineral i barrera de vapor. Resistència tèrmica 1,25m²K/W.
 - Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats al interior de cadascuna de les cantonades del mòdul
- **Bases i paviments**
 - Paviment PVC en continu, POLYFLOR STANDARD XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre tauler OSB anti-humitat o de similars característiques.
- **Tancament de façana**
 - Panell sandvitx 40 mm. de gruix i d'alçada 2.500 mm.
 - Aïllament interior de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Micronervat exterior i gofrat interior.
 - Blanc per ambdós costats.

Codi Segur de Verificació:
3e7f211d-790d-42fb-b875-270396328518
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2025_9943835
Data d'impressió: 24/12/2025 08:18:41
Pàgina 6 de 17

SIGNATURES
1.- Sandra Rigol Balocas (SIG) (ENGINYERA), 19/12/2025 13:01



- **Fusteries**

- Porta exterior cega de 1 full practicable en alumini blanc, en un únic panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirè d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90cm de pas).
- 2ut de finestres de 600 x 300m d'alumini lacat blanc pels lavabos
- 2ut de finestres de 970 x 500 mm d'alumini lacat blanc per la façana principal
- Molla tancaportes tipus "Telesco" o similar
- Finestres d'alumini lacat blanc i envidrament I amb vidres carglass (mínim 4 mm)
- Reixa d'alumini blanc

- **Fals sostre**

- Fals sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locat a 2.500 mm d'alçada respecte del paviment interior.

- **Envans i fusteria interior**

- Envà interior amb panell sandvitx de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
- Folrat amb material plàstic de fàcil neteja i blanc per ambdós costats.
- 2 portes interiors d'alumini blanc per tancar els lavabos de 620mm de pas.

- **Instal·lació elèctrica**


- 2 ut Pantalla plana LED de superfície 120 cm. 36w.
- 2 ut Pantalla estanca LED de superfície 120 cm. 2x18 w.
- 2 ut Plafó LED 10 w amb encesa mitjançant detector de presència.
- 2 ut d'enllumenat d'emergència
- 2ut Interruptor/commutador.
- 8 Endoll 16 A (IP65)
- Split mural de 3.000 / 3.250 frig./h. fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++. Control i programació mitjançant comandament.

- **Instal·lació fontaneria**

- 2 ut WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal.
- Zona de dutxes equipada amb 4 aixetes d'aigua freda i calenta i amb zona de recollida d'aigües
- 2 ut de Lavabo 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca, equipats amb aigua freda, i mirall antibandàlic.
- 1 ut d'escalfador de 200 litres
- 1 punt de desguàs al paviment de la zona de dutxes.



2.3. Mòdul vestuari àrbitre

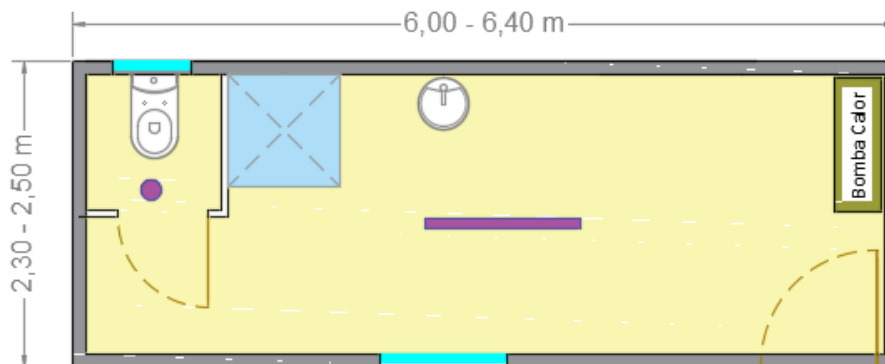

Cada unitat de mòdul vestuari tindrà les següents característiques:

- **Estructura**
 - Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm, adossable i apilable.
 - Mesures exteriors des de 2,30 x 6,00 m a 2,50 x 6,40 m.
 - Base amb travessers UPN de 140 i travessers 80x80x4mm.
 - Imprimació anticorrosió i acabat amb esmalt setinat.
- **Cobertes**
 - Coberta de xapa galvanitzada trapezoïdal de 0,6mm.
 - Aïllament de llana mineral i barrera de vapor. Resistència tèrmica 1,25m²K/W.
 - Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats al interior de cadascuna de les cantonades del mòdul
- **Bases i paviments**
 - Paviment PVC en continu, POLYFLOR STANDARD XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre tauler OSB anti-humitat o de similars característiques.
- **Tancament de façana**
 - Panell sandvitx 40 mm. de gruix i d'alçada 2.500 mm.
 - Aïllament interior de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Micronervat exterior i gofrat interior.
 - Blanc per ambdós costats.
- **Fusteries**
 - Porta exterior cega de 1 full practicable en alumini blanc, en un únic panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirè d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90cm depas).
 - 1ut de finestra de 600 x 300m d'alumini lacat blanc pels lavabos

Codi Segur de Verificació:
3e7f211d-790d-42fb-b875-270396328518
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2025_9943835
Data d'impressió: 24/12/2025 08:18:41
Pàgina 8 de 17


SIGNATURES
1.- Sandra Rigol Balocas (SIG) (ENGINYERA), 19/12/2025 13:01



- 1ut de finestra de 970 x 500 mm d'alumini lacat blanc per la façana principal
- Molla tancaportes tipus "Telesco" o similar
- Finestres d'alumini lacat blanc i envidrament l amb vidres carglass (mínim 4 mm)
- Reixa d'alumini blanc
- **Fals sostre**
 - Fals sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locat a 2.500 mm d'alçada respecte del paviment interior.
- **Envans i fusteria interior**
 - Envà interior amb panell sandvitx de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Folrat amb material plàstic de fàcil neteja i blanc per ambdós costats.
 - 1 porta interior d'alumini blanc per tancar els lavabos de 620mm de pas.
 - 1 ut Pantalla plana LED de superfície 120 cm. 36w.
 - 1 ut Pantalla estanca LED de superfície 120 cm. 2x18 w.
 - 1 ut Plafó LED 10 w amb encesa mitjançant detector de presència.
 - 1 ut d'enllumenat d'emergència
 - 1ut Interruptor/commutador.
 - 4 Endoll 16 A (IP65)
 - Split mural de 3.000 / 3.250 frig./h. fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++. Control i programació mitjançant comandament.
- **Instal·lació fontaneria**
 - 1 ut WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal.
 - 1 ut Plat dutxa de 900 x 700 mm, de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i calenta i mampara.
 - 1 ut de Lavabo 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca, equipats amb aigua freda, i mirall antibandàlic.
 - 1 ut d'escalfador de 50 litres.
 - 1 punt de desguàs al paviment de la zona de dutxes.



2.4. Mòdul oficina/magatzem

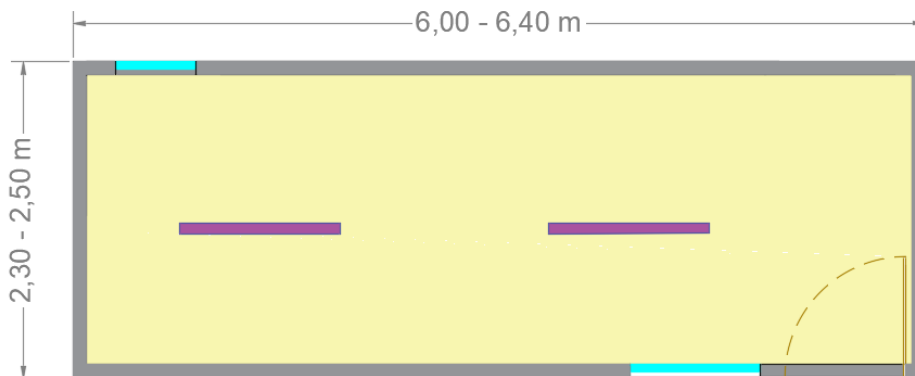


Cada unitat de mòdul vestuari tindrà les següents característiques:

- **Estructura**
 - Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm, adossable i apilable.
 - Mesures exteriors des de 2,30 x 6,00 m a 2,50 x 6,40 m.
 - Base amb travessers UPN de 140 i travessers 80x80x4mm.
 - Imprimació anticorrosió i acabat amb esmalt setinat.
- **Cobertes**
 - Coberta de xapa galvanitzada trapezoïdal de 0,6mm.
 - Aïllament de llana mineral i barrera de vapor. Resistència tèrmica 1,25m²K/W.
 - Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats al interior de cadascuna de les cantonades del mòdul
- **Bases i paviments**
 - Paviment PVC en continu, POLYFLOR STANDARD XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre tauler OSB anti-humitat o de similars característiques.
- **Tancament de façana**
 - Panell sandvitx 40 mm. de gruix i d'alçada 2.500 mm.
 - Aïllament interior de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Micronervat exterior i gofrat interior.
 - Blanc per ambdós costats.
- **Fusteries**
 - Porta exterior cega de 1 full practicable en alumini blanc, en un únic panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirè d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90cm depas).
 - 1ut de finestres de 600 x 300m d'alumini lacat blanc pels lavabos
 - 1ut de finestres de 970 x 500 mm d'alumini lacat blanc per la façana principal
 - Molla tancaportes tipus "Telesco" o similar
 - Finestres d'alumini lacat blanc i envidrament I amb vidres carglass (mínim 4 mm)



- Reixa d'alumini blanc
- **Fals sostre**
 - Fals sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locat a 2.500 mm d'alçada respecte del paviment interior.
- **Envans i fusteria interior**
 - Envà interior amb panell sandvitx de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Folrat amb material plàstic de fàcil neteja i blanc per ambdós costats.
- **Instal·lació elèctrica**
 - 2 ut Pantalla plana LED de superfície 120 cm. 36w.
 - 1 ut d'enllumenat d'emergència
 - 1ut Interruptor/commutador.
 - 4 Endoll 16 A (IP65)
 -

2.5. Mòdul BAR

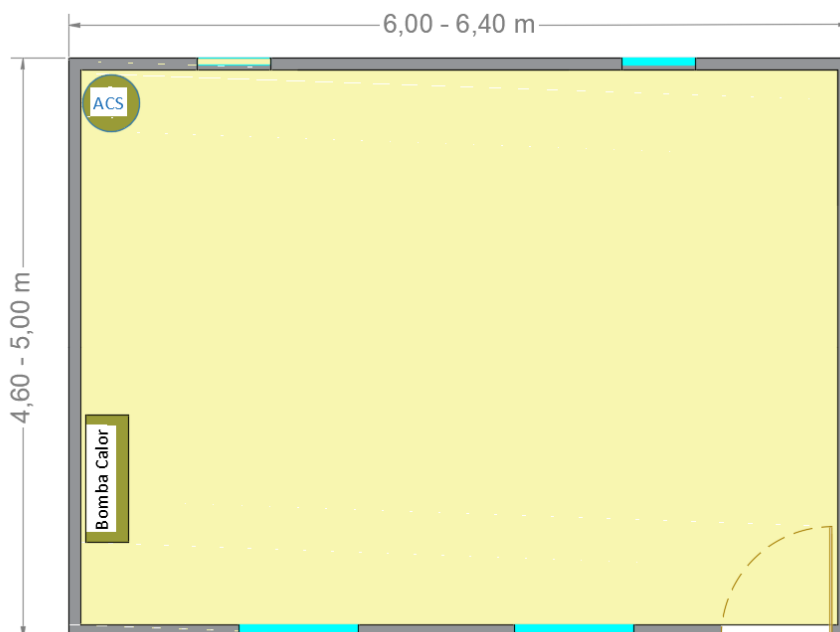

- **Estructura**
 - Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm, adossable i apilable.
 - Mesures exteriors des de 4,60 x 6,00 m a 5,00 x 6,40 m.
 - Base amb travessers UPN de 140 i travessers 80x80x4mm.
 - Imprimació anticorrosió i acabat amb esmalt setinat.
- **Cobertes**
 - Coberta de xapa galvanitzada trapezoïdal de 0,6mm.


DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 0051-000020-2025
Codi Segur de Verificació: 3e7f211d-790d-42fb-b875-270396328518 Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2025_9943835 Data d'impressió: 24/12/2025 08:18:41 Pàgina 11 de 17		SIGNATURES 1.- Sandra Rigol Balocas (SIG) (ENGINYERA), 19/12/2025 13:01



- Aïllament de llana mineral i barrera de vapor. Resistència tèrmica 1,25m²K/W.
- Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats al interior de cadascuna de les cantonades del mòdul
- **Bases i paviments**
 - Paviment PVC en continu, POLYFLOR STANDARD XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre tauler OSB anti-humitat o de similars característiques.
- **Tancament de façana**
 - Panell sandvitx 40 mm. de gruix i d'alçada 2.500 mm.
 - Aïllament interior de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Micronervat exterior i gofrat interior.
 - Blanc per ambdós costats.
- **Fusteries**
 - Porta exterior cega de 1 full practicable en alumini blanc, en un únic panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirè d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90cm de pas).
 - 2ut de finestres de 600 x 300mm d'alumini lacat blanc pels lavabos
 - 2ut de finestres de 970 x 500 mm d'alumini lacat blanc per la façana principal
 - Molla tancaportes tipus "Telesco" o similar
 - Finestres d'alumini lacat blanc i envidrament I amb vidres carglass (mínim 4 mm)
 - Reixa d'alumini blanc
- **Fals sostre**
 - Fals sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locat a 2.500 mm d'alçada respecte del paviment interior.
- **Instal·lació elèctrica**
 - 4 ut Pantalla plana LED de superfície 120 cm. 36w.
 - 1 ut d'enllumenat d'emergència
 - Quadre elèctric per futura distribució de bar amb:
 - Magnetotèrmic de 4p/20A
 - Diferencial de 4p/40/30mA
 - Split mural de 3.000 / 3.250 frig./h. fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++. Control i programació mitjançant comandament.
- **Instal·lació fontaneria**
 - 1 ut d'escalfador de 50 litres.
 - 1 punt de desguàs per rentaplats
 - 1 punt de desguàs per aigüera
 - 1 punt d'entrada d'aigua per ACS
 - 1 desguàs en paviment
 - 1 punt d'extracció de fums en la coberta



2.6. Mòdul LAVABOS

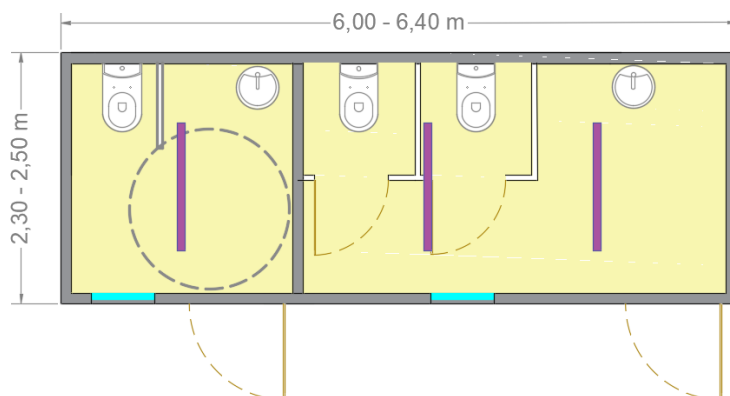

- **Estructura**
 - Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm, adossable i apilable.
 - Mesures exteriors des de 2,30 x 6,00 m a 2,50 x 6,40 m.
 - Base amb travessers UPN de 140 i travessers 80x80x4mm.
 - Imprimació anticorrosió i acabat amb esmalt setinat.
- **Cobertes**
 - Coberta de xapa galvanitzada trapezoïdal de 0,6mm.
 - Aïllament de llana mineral i barrera de vapor. Resistència tèrmica 1,25m²K/W.
 - Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats al interior de cadascuna de les cantonades del mòdul
- **Bases i paviments**
 - Paviment PVC en continu, POLYFLOR STANDARD XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre tauler OSB anti-humitat o de similars característiques.
- **Tancament de façana**
 - Panell sandvitx 40 mm. de gruix i d'alçada 2.500 mm.
 - Aïllament interior de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Micronervat exterior i gofrat interior.
 - Blanc per ambdós costats.
 - 2 ut Porta exterior cega de 1 full practicable en alumini blanc, en un únic panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirè d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90cm depas).
 - 2ut de finestra de 600 x 300 mm d'alumini lacat blanc per la façana principal
 - Molla tancaportes tipus "Telesco" o similar
 - Finestres d'alumini lacat blanc i envidrament I amb vidres carglass (mínim 4 mm)
 - Reixa d'alumini blanc



- **Fals sostre**
 - Fals sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locat a 2.500 mm d'alçada respecte del paviment interior.
- **Envans i fusteria interior**
 - Envà interior amb panell sandvitx de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m³ de densitat.
 - Folrat amb material plàstic de fàcil neteja i blanc per ambdós costats.
 - 2 portes interiors d'alumini blanc per tancar els lavabos de 620mm de pas.
- **Instal·lació elèctrica**
 - 3 ut Pantalla plana LED de superfície 120 cm. 36w.
 - 2 ut d'enllumenat d'emergència
 - 2ut Interruptor/commutador.
 - 2 Endoll 16 A (IP65)
- **Instal·lació fontaneria**
 - 2 ut WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal.
 - 1 ut WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal i apte per PMV (accessible)
 - 1 ut de Lavabo 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca, equipats amb aigua freda, i mirall antibandàlic.
 - 1 ut de Lavabo 52 cm de porcellana vitrificada blanca, equipats amb aigua freda, i mirall antibandàlic. i apte per PMV (accessible)

2.7. Seguiment i control dels treballs

L'empresa adjudicatària nomenarà, del seu personal, una persona responsable del contracte que actuarà com a referent i interlocutor davant de l'Ajuntament de Tremp, per tal de resoldre els possibles dubtes relacionats amb l'execució del contracte. Així, com per garantir l'execució del mateix en els termes establerts.

2.8. Materials

Els materials emprats per la prestació del servei de subministrament, pel que fal als mòduls i els seus elements interns (instal·lacions tècniques, inodors, lavabos, etc), hauran de complir amb les exigències marcades en la legislació corresponent que els sigui d'aplicació, i hauran de garantir els mínims de qualitat necessaris pel correcte desenvolupament de l'activitat a les d'un equipament esportiu.

2.9. Seguiment del contracte

L'Ajuntament de Tremp es reserva el dret a realitzar aquelles proves i/o anàlisis dels productes que consideri necessari per comprovar la qualitat dels productes subministrats i confirmar el compliment de les característiques dels mateixos. Al plec de clàusules administratives particulars es detalla una documentació específica que s'ha de presentar per a fer el seguiment del contracte.



3. SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació vigent.

L'adjudicatari haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut per a la prestació del servei de subministrament, que contemplarà com a mínim els següents punts:

- Riscos professionals possibles associats a les tasques derivades de l'objecte del contracte.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció personal (EPI) i col·lectiva.
- Serveis de prevenció de l'empresa.

En tot cas, l'adjudicatari es compromet a donar estricte compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i a tota la seva normativa de desenvolupament; així, com a la legislació vigent que pugui derogar o complimentar-la. L'adjudicatari haurà de portar a terme els tràmits administratius i de gestió necessaris per tal de portar a terme la coordinació empresarial en termes de seguretat i salut seguint les directrius de l'Ajuntament de Tremp.

4. OMISSIONS

Les omissions del Plec de Prescripcions Tècniques o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per portar a terme correctament les treballs de subministrament, no eximeixen a l'adjudicatari de la seva execució, que s'haurà de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte d'aquest contracte, com si haguessin estat efectivament descrits en el present plec.

5. DISCONFORMITAT

En el supòsit que l'Ajuntament de Tremp estigui disconforme amb el servei de subministrament prestat per l'adjudicatari, li comunicarà de manera fefaent els motius de la seva disconformitat per tal que aquest pugui prendre les mesures correctores oportunes.

6. INICI DEL CONTRACTE

Un cop signat el contracte, l'empresa adjudicatària i la persona responsable del contracte per part de l'Ajuntament de Tremp, determinaran tots els aspectes tècnics dels subministraments per tal de definir amb exactitud les indicacions de fabricació dels mòduls. S'aixecarà acta d'aquestes indicacions i aquest document iniciarà el termini de lliurament dels mòduls.

Codi Segur de Verificació:
3e7f211d-790d-42fb-b875-270396328518
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01010014_2025_9943835
Data d'impressió: 24/12/2025 08:18:41
Pàgina 15 de 17

SIGNATURES
1.- Sandra Rigol Balocas (SIG) (ENGINYERA), 19/12/2025 13:01

Ajuntament de Tremp



7. DURADA I TERMINI DE LLIURAMENT

El contracte tindrà un termini de lliurament de **TRES (3) MESOS** comptat des del dia següent al de la signatura de l'acta que definirà les indicacions de fabricació dels mòduls i que serà signada per l'empresa adjudicatària i la persona responsable del contracte per part de l'Ajuntament.

L'acta s'haurà de signar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del següent a la formalització del contracte.

8. VALORACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes es valoraran d'acord amb els criteris següents, fins a un màxim de **100 punts**, tots ells **avaluables mitjançant fórmules automàtiques**, de conformitat amb l'article 145 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

8.1. Oferta Econòmica (Fins A 40 Punts)

Es valorarà el preu total ofert, IVA exclòs.

La puntuació s'atorgarà aplicant la fórmula següent:

$$P = \frac{P_{min}}{P_{of}} \times 40$$

On:

P = puntuació obtinguda

P_{min} = preu més baix admès

P_{of} = preu de l'oferta valorada

8.2. Subministrament de mòduls addicionals (fins a 30 punts)

Es valorarà el compromís del licitador de subministrar **fins a un màxim de dos (2) mòduls prefabricats addicionals**, sense increment del preu ofert del tipus OFICINA/MAGATZEM que es detalla en el punt 2.4 d'aquest PPTP.

La puntuació s'assignarà de la manera següent:

- Cap mòdul addicional: **0 punts**
- 1 mòdul addicional: **15 punts**
- 2 mòduls addicionals: **30 punts**

8.3. Acabat en color a determinar per la direcció facultativa (fins a 15 punts)

Es valorarà el compromís del licitador d'executar sense cost addicional l'**acabat exterior del mòdul** en un color a escollir per la direcció facultativa, d'entre la carta de colors del fabricant, incloent-hi tots els treballs i materials necessaris.

- Sense possibilitat de tria del color: **0 punts**
- Amb possibilitat de tria del color per la direcció facultativa: **15 punts**

8.4. Vinilat exterior dels mòduls prefabricats (fins a 15 punts)

Es valorarà el compromís del licitador d'executar sense cost addicional el **vinilat exterior complet dels mòduls prefabricats**, amb materials aptes per a exteriors, resistent a la intempèrie i als raigs UV, d'acord amb el disseny, colors i ubicació que determini la direcció facultativa.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 0051-000020-2025
Codi Segur de Verificació: 3e7f211d-790d-42fb-b875-270396328518 Origen: Administració Identificador document: ES_L01010014_2025_9943835 Data d'impressió: 24/12/2025 08:18:41 Pàgina 16 de 17		SIGNATURES 1.- Sandra Rigol Balocas (SIG) (ENGINYERA), 19/12/2025 13:01



El vinilat haurà d'incloure, com a mínim, els elements següents:

- **Retolació per a cadascun dels accessos** als diferents mòduls.
- **6 figures esportives**, amb una alçada aproximada de **1,75 metres** cadascuna.
- **4 escuts**, amb una mida aproximada de **50 cm**.
- **Lletres corpòries o vinilades** amb el text "**Camp de Futbol Pedrasanta**", amb una **llargada total aproximada de 20 metres**.

La puntuació s'assignarà de la manera següent:

- No inclou el vinilat exterior amb els elements descrits: **0 punts**
- Inclou íntegrament el vinilat exterior amb tots els elements descrits: **15 punts**

Aquest compromís tindrà caràcter contractual i s'haurà d'executar dins del termini de lliurament ofert, sense increment del preu adjudicat.

Les mides indicades tenen caràcter orientatiu i podran ser ajustades per la direcció facultativa per motius d'adaptació al suport, sense que això suposi variació del preu ni del contingut de la millora.

9. PREU

El pressupost base de licitació és **CENT NORANTA-TRES MIL CINQ-CENTS VUITANTA EUROS (193.580,00 €)** que amb l'IVA inclòs del 21% correspon a un total de **DOS CENTS TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (234.231,80 €)**.

L'enginyera Municipal
Sandra Rigol Balocas

Document signat i datat electrònicament



ANNEX 1 – PROPOSTA D'EMPLAÇAMENT

