

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CASETES ALS TEATRE GREC DURANT EL GREC FESTIVAL DE BARCELONA

1. OBJECTE DEL PRESENT PLEC:

Aquest plec té per objecte definir les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a terme en el lloguer i muntatge de les 4 casetes que allotgen el personal i els equips tècnics, de seguretat, i de producció del Grec Festival de Barcelona al Teatre Grec.

2. LLOC D'INSTAL·LACIÓ

JARDINS DEL TEATRE GREC. Passeig de Santa Madrona nº 36 de Barcelona.

Les casetes s'ubicaran als jardins del Teatre Grec d'acord amb el plànol a l'annex 1

3. TEMPORALITZACIÓ

- Període de muntatge: primera setmana de juny
- Període de funcionament: juny i juliol
- Període de desmuntatge: primera setmana d'agost

Les dates de muntatge i desmuntatge poden variar en funció de la programació del festival.

Terminis de muntatge i desmuntatge: el període de muntatge no es podrà perllongar més de **4 dies** a partir de la data d'inici del servei. El període de desmuntatge no es podrà perllongar més de **3 dies**.

L'empresa adjudicatària s'adequarà als horaris de muntatge i desmuntatge que dictarà l'Institut de Cultura de Barcelona.

4. CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ

4.1. Requeriments tècnics dels equips i la instal·lació:

L'estructura haurà de ser rígida i resistent, tota la instal·lació i els materials hauran de complir amb les normatives de la CE i el RBT (Reglament de Baixa Tensió). No s'acceptaran connectors fora de normativa.

Tot el material es descarrega per l'accés als Jardins del Teatre Grec situat al final del Passatge Martras. Tots els elements que configuren les casetes cal que estiguin dimensionats per ser descarregats per aquest accés.

Característiques comuns a les casetes: seran modulars, cobertes, estanques i s'han de poder tancar amb clau, i ha de complir els següents requeriments:

Tarima de 10 cm a nivell
Sòcol perimetral pintat
Terra vinílic
Portes amb tanca amb claus independents per cada caseta
Totes les finestres amb persianes venecianes
Hauran de estar impermeabilitzades contra la pluja
El nivell de llum mínim haurà de ser de 400 LUX amb Tº Color de llum dia (5600 ºK)

4.2. Prestacions

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei, durant tot el període de durada del festival, és a dir, entre l'1 de juny i el 7 d'agost, els equipaments i les prestacions que s'especifiquen a continuació:


Caseta Oficines equip de Producció

Caseta de 3X6 metres i una alçada de 2,58 metres amb la següent distribució i característiques:

Esglaó fusta a l'entrada
Sostre aïllant i estanc
Dos forats per a sortida de tub del aparell d'aire condicionat

Instal·lacions elèctriques equipades:
4 endoll tipus schuco 16 A.
5 tubs led
2 interruptors
2 caixes de connexions elèctriques 32 A

Plànol orientatiu:

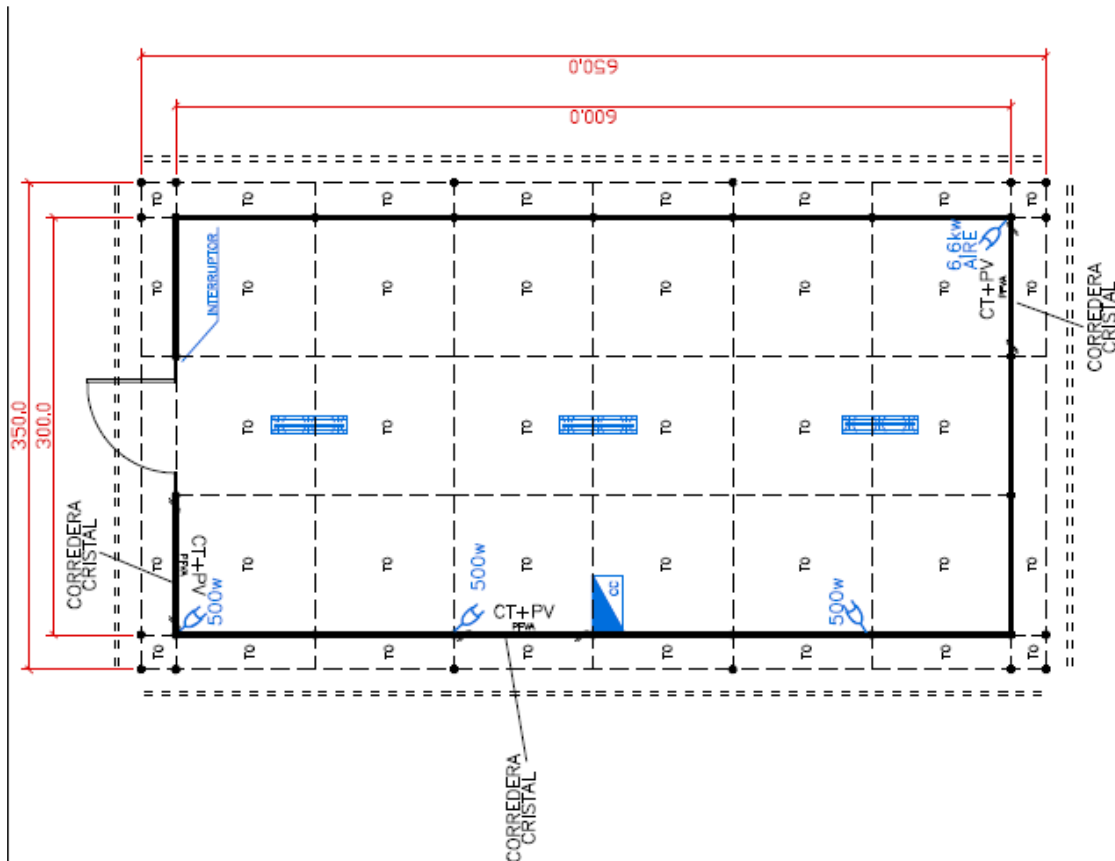

Caseta control tècnic (Llums)

Caseta de 2x2 metres de base i una alçada de 2,58 metres.

Paret frontal vitrina alta 100 cm.

Porta posterior abatible

Mostrador de 200x50x85 cm

Estanteria 200x50x85 cm


1 endoll tipus schuco 16 A.

1 tub led

1 interruptor

1 caixa de connexions elèctriques

Plànol orientatiu

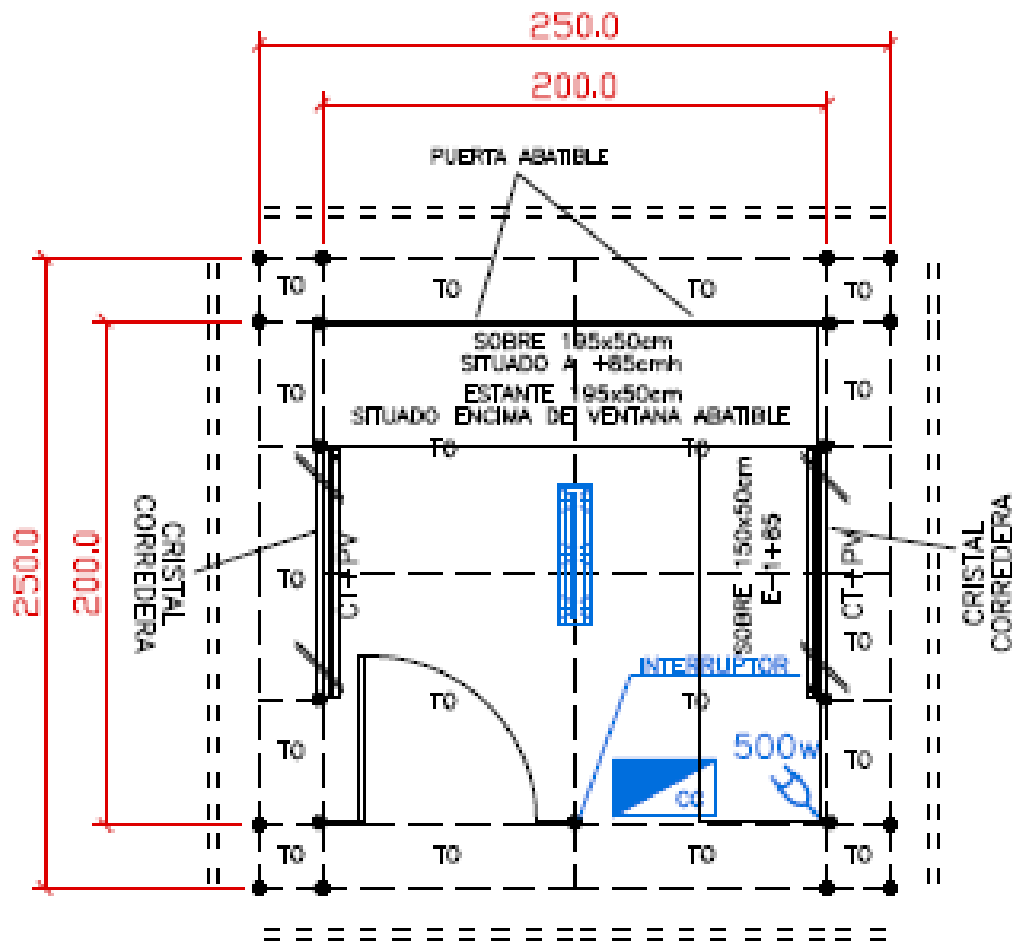

Caseta control tècnic (So)

Caseta de 3x3 metres i una alçada de 2,58 metres.

Sostre aïllant i estanc

Paret frontal vitrina alta 100 cm.

Porta posterior abatible

Mostrador de 200x100x85 cm


2 endoll tipus schuco 16 A.

1 tub led

1 interruptor

1 caixa de connexions elèctriques

Plànol orientatiu:

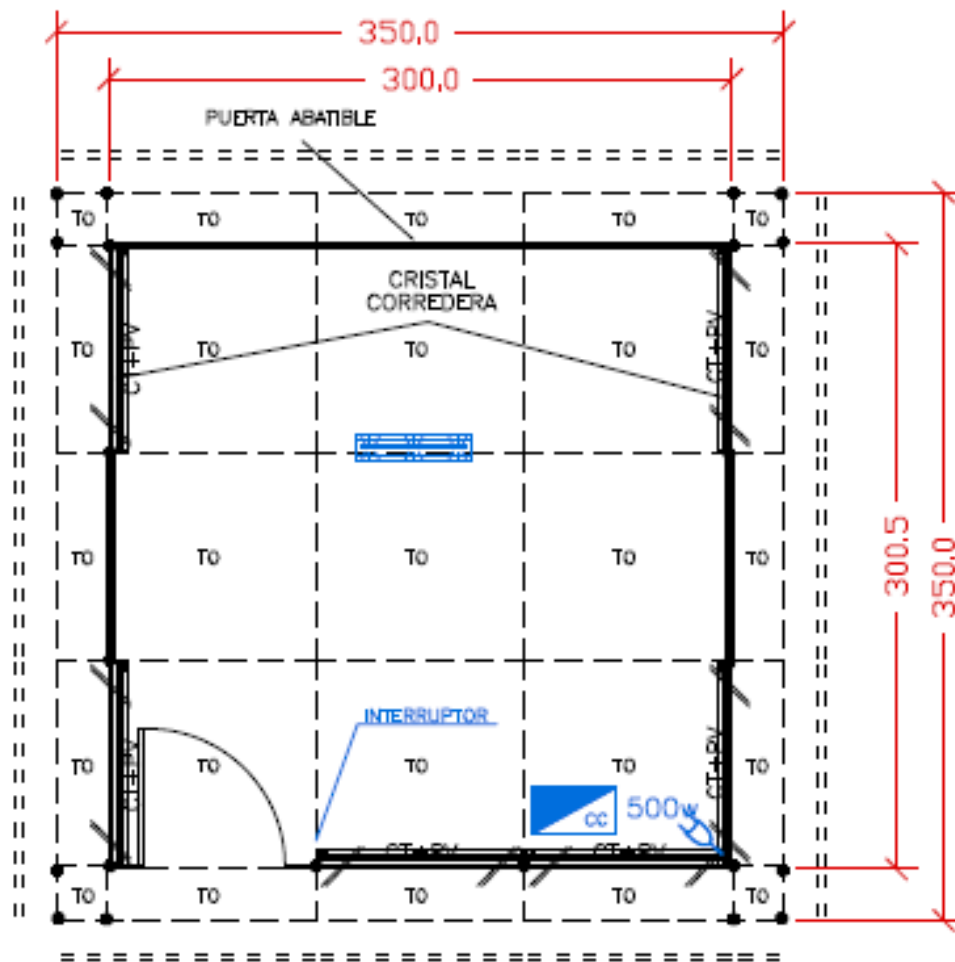

Caseta Vestuari equip de Vigilància

Caseta de 2x2 metres de base i una alçada de 2,58 metres.

Sostre aïllant i estanc

1 endoll tipus schuco 16 A.


1 tub led

1 interruptor

1 estanteria 4 mòduls blanca

1 caixa de connexions elèctriques

Plànol orientatiu

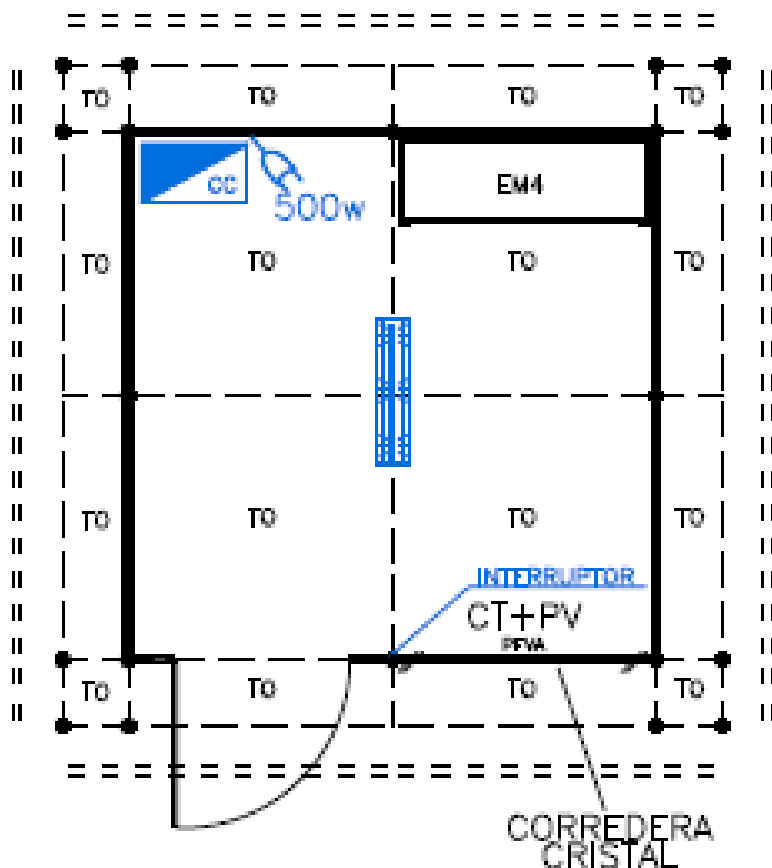

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- Els mitjans de transport necessaris per portar fins la seva ubicació exacta i per retirar els equipaments, incloent els estris i/o mecanismes necessaris a tal efecte (transpalet, carretons....).
- Les connexions elèctriques. Cal tenir en compte que als jardins del Teatre Grec no hi poden accedir vehicles. La porta de càrrega és la situada al Passatge Martras.

L'Institut de Cultura de Barcelona, mitjançant els responsables del Festival Grec, podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo o reparar-lo per en un temps no superior a **8 hores**.

4.3. Assistència tècnica especialitzada

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

- El personal tècnic qualificat necessari per al muntatge, connexionat elèctric i el desmuntatge.
Es preveu un equip mínim de 5 persones: 1 capatàs i 4 operaris.
S'estimen necessàries 7 jornades de capatàs, i 28 jornades d'operari.

- El personal de manteniment que sigui necessari al llarg del Festival per solucionar els possibles desperfectes que hi pugui haver (filtracions d'aigua, esquerdes, avaries del sistema elèctric...)

L'empresa adjudicatària haurà de preveure els recursos materials, humans i tècnics necessaris per tal de garantir possibles ampliacions del servei en supòsits d'emergència i/o necessitats sobrevingudes. En aquest cas s'haurà de fer el servei en un període no superior a **8 hores**.

ANNEX 1

Plànol d'ubicació de les casetes al jardins del Teatre Grec

