
Municipi
El Prat de Llobregat

Tipus d'actuació
Subministrament

Expedient
900199/26

Data
Gener 2025

Tipus de document
Plec tècnic

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Millora de l'accessibilitat i la confortabilitat a les parades de bus de l'Av. De la Verge de Montserrat i de la Carretera de la Marina: Subministrament de plataformes de bus a El Prat de Llobregat

Relació de documents i volums

01-03. Memòria i Annexos

04-04. Plànols i pressupost

04/04 Volums

Índex de volums

D1 Memòria i annexos

01-03

01

Memòria
Annex 01. Document tècnic de definició de la plataforma d'autobús amb marquesina i PSI de l'AMB.

02

Annex 02. Document tècnic de definició del panell solar informatiu (PSI) de l'AMB.
Annex 03. Document tècnic de definició de la marquesina de l'AMB.

03

Annex 04. Estudi de Seguretat i Salut.

D2 Plànols

04-04

04

EA0. Localitzacions
EA1. Estat actual Localització 1 i 2
EA2. Estat actual Localització 3 i 4
EA3. Estat actual Localització 5 i 6
EA4. Estat actual Localització 7, 8 i 9
PR1. Proposta Localització 1 i 2
PR2. Proposta Localització 3 i 4
PR3. Proposta Localització 5 i 6
PR4. Proposta Localització 7, 8 i 9



D3 Pressupost

04


04

01. Amidaments
02. Quadre de preus nº 1
03. Quadre de preus nº2
04. Pressupost
05. Resum de pressupost
06. Últim full

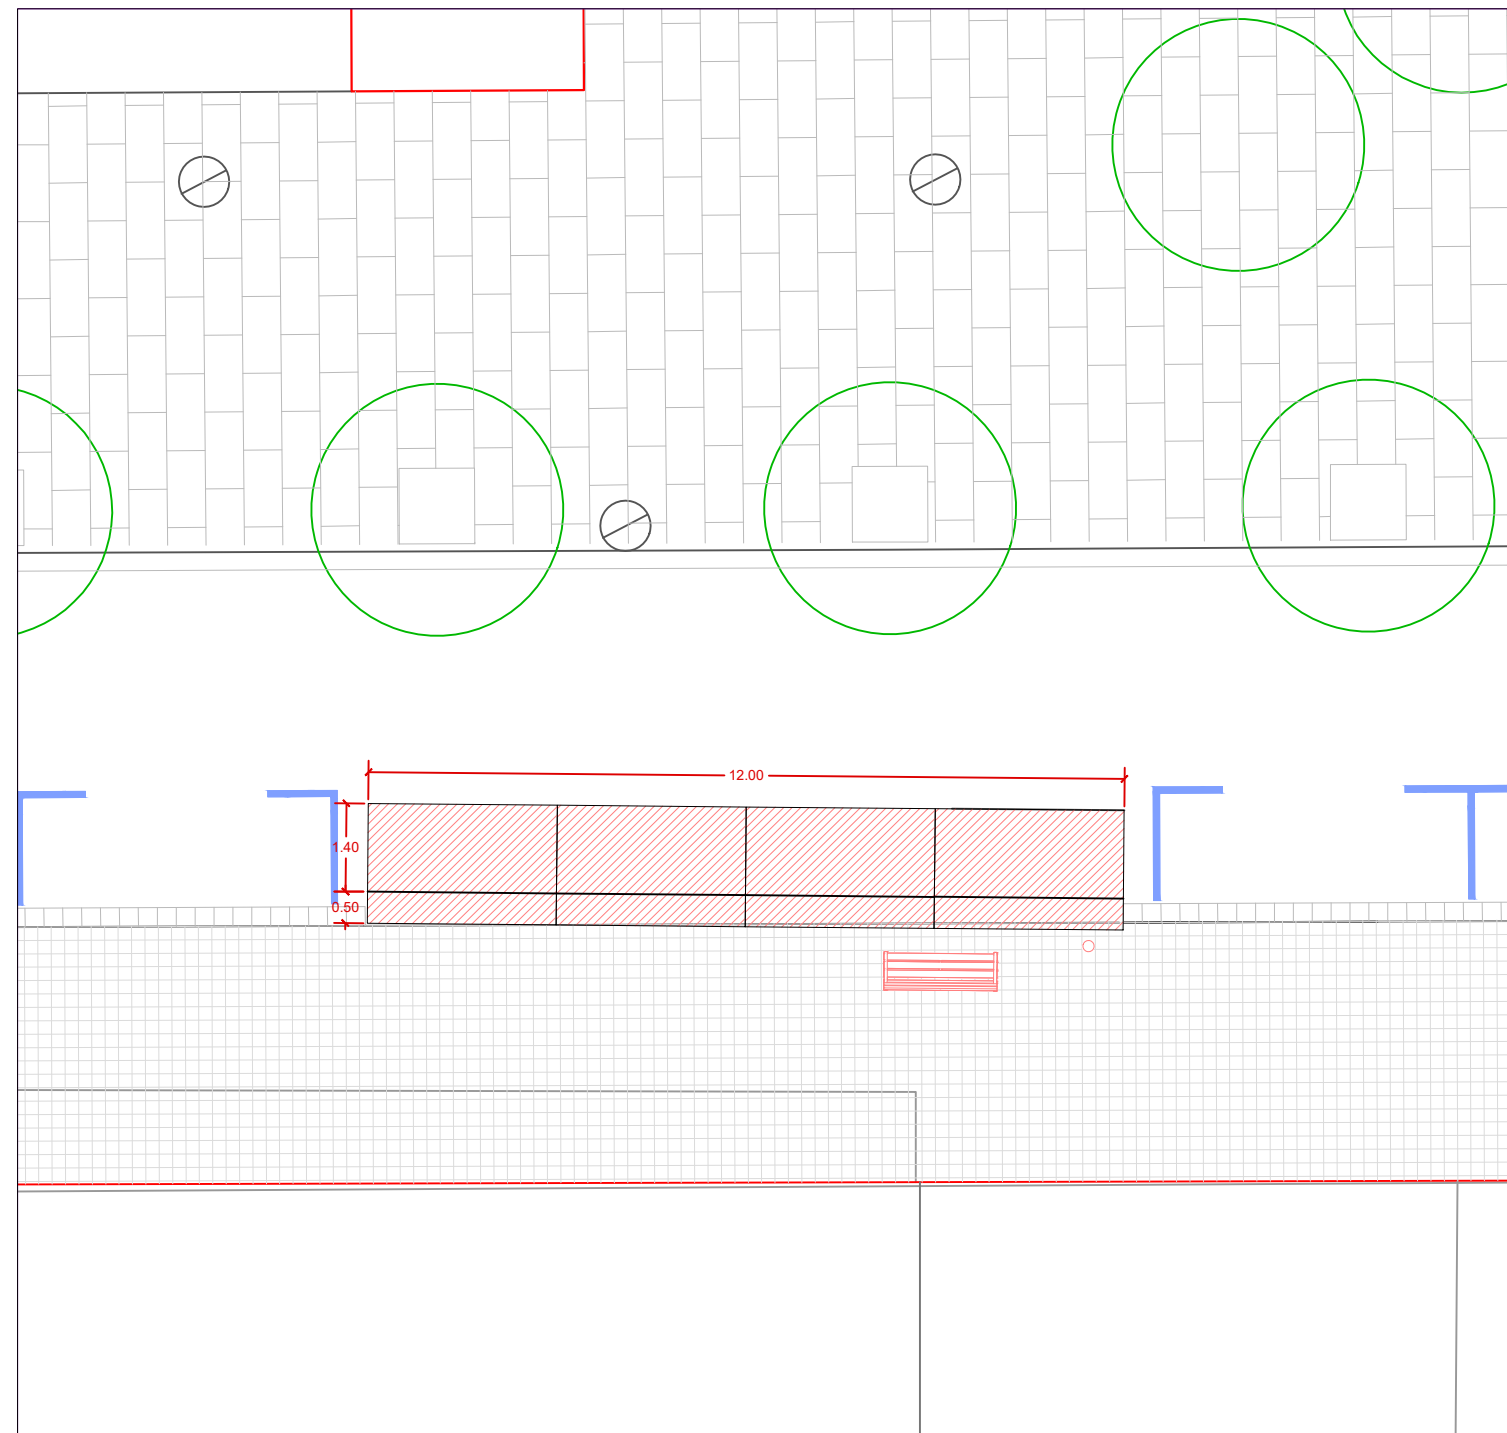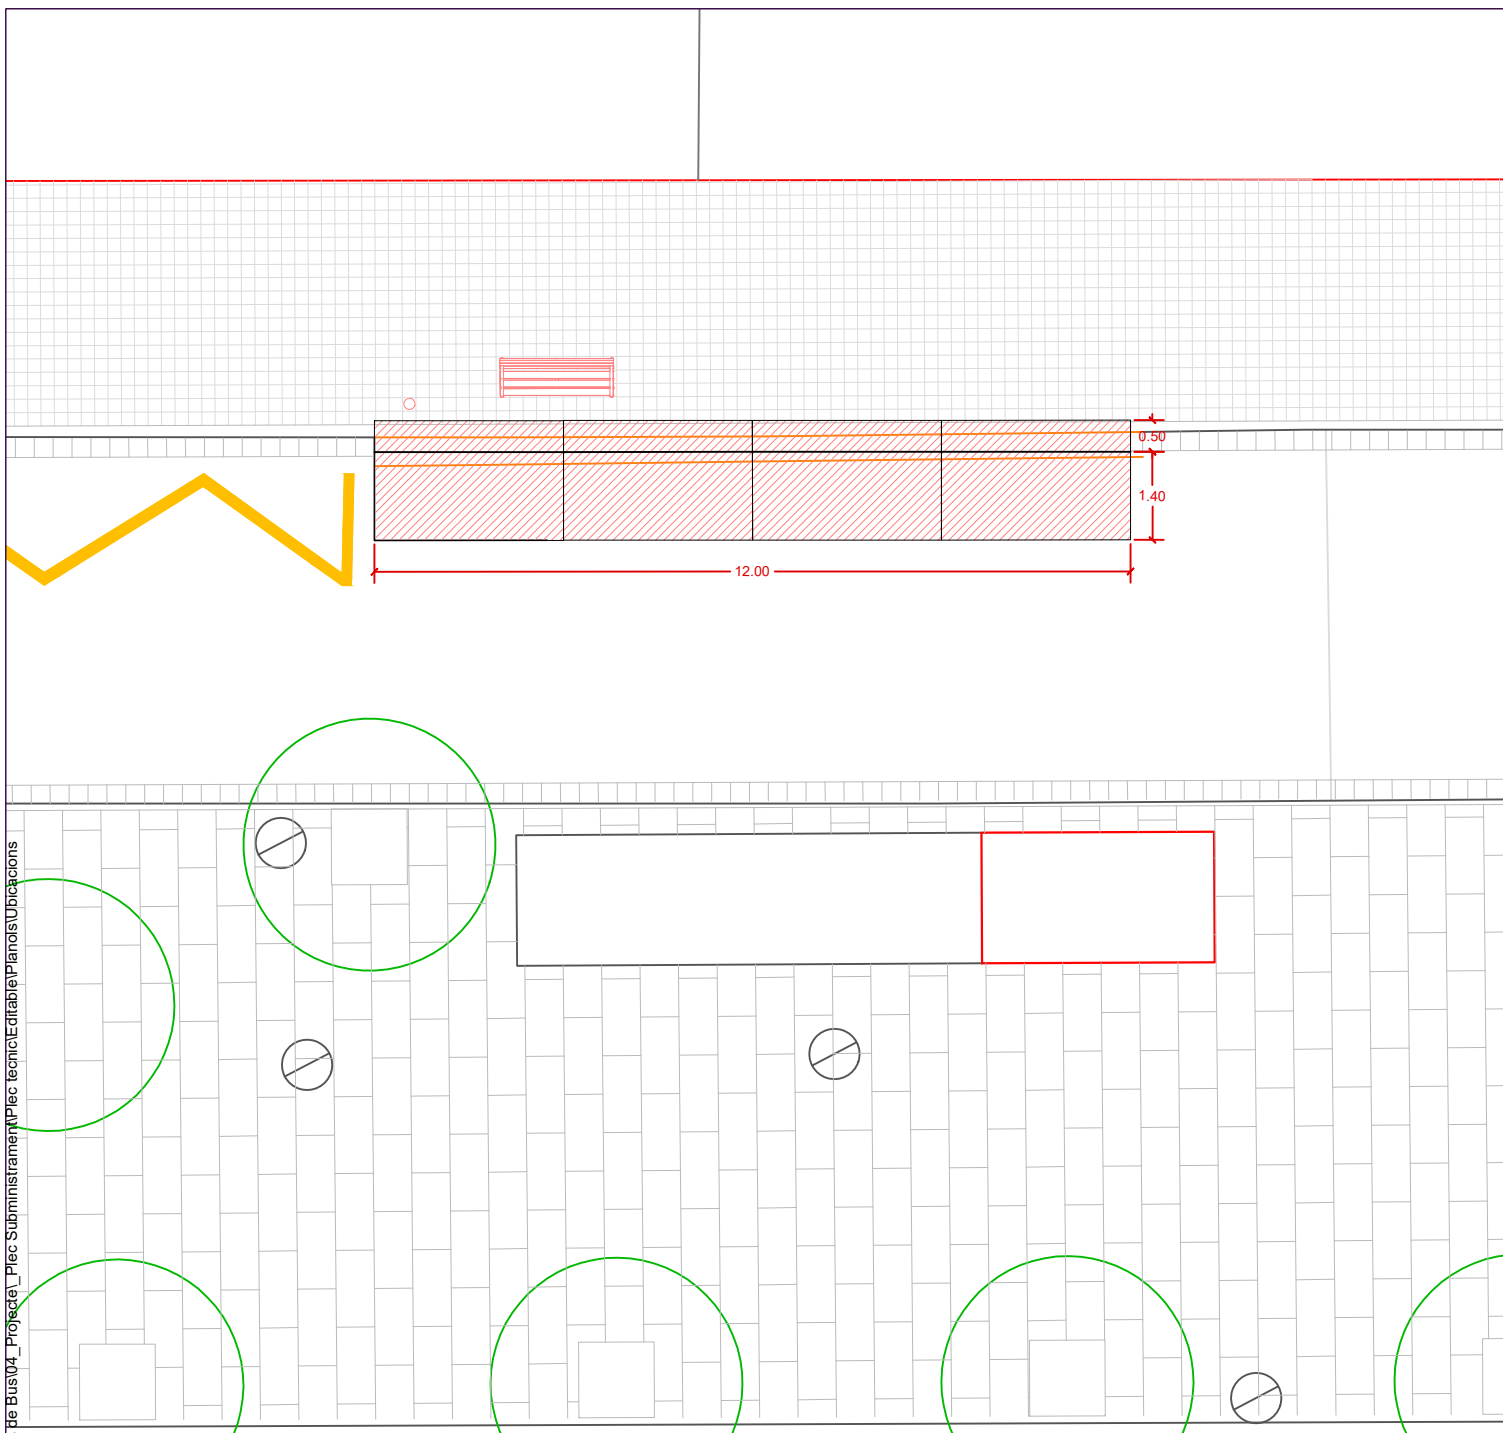


Plànols



N103_ACTUACIONS PSAEPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus04_Projecte_Piec Subministrament_Piec tecnoloficiablePlanoisUbicacions



Elements a eliminar:




-  Banc
-  Punt de parada
-  Plataforma existent

LOCALITZACIÓ 3: 001014




LOCALITZACIÓ 4: 001016



N:103_ACTUACIONS PSAE/LEPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus/04_Projecte_Piec Subministrament/Plac tecnolE difable/Planois/Ubicacions

Elements a retirar:

-  Banc
-  Punt de parada
-  Plataforma existent




Elements a retirar:

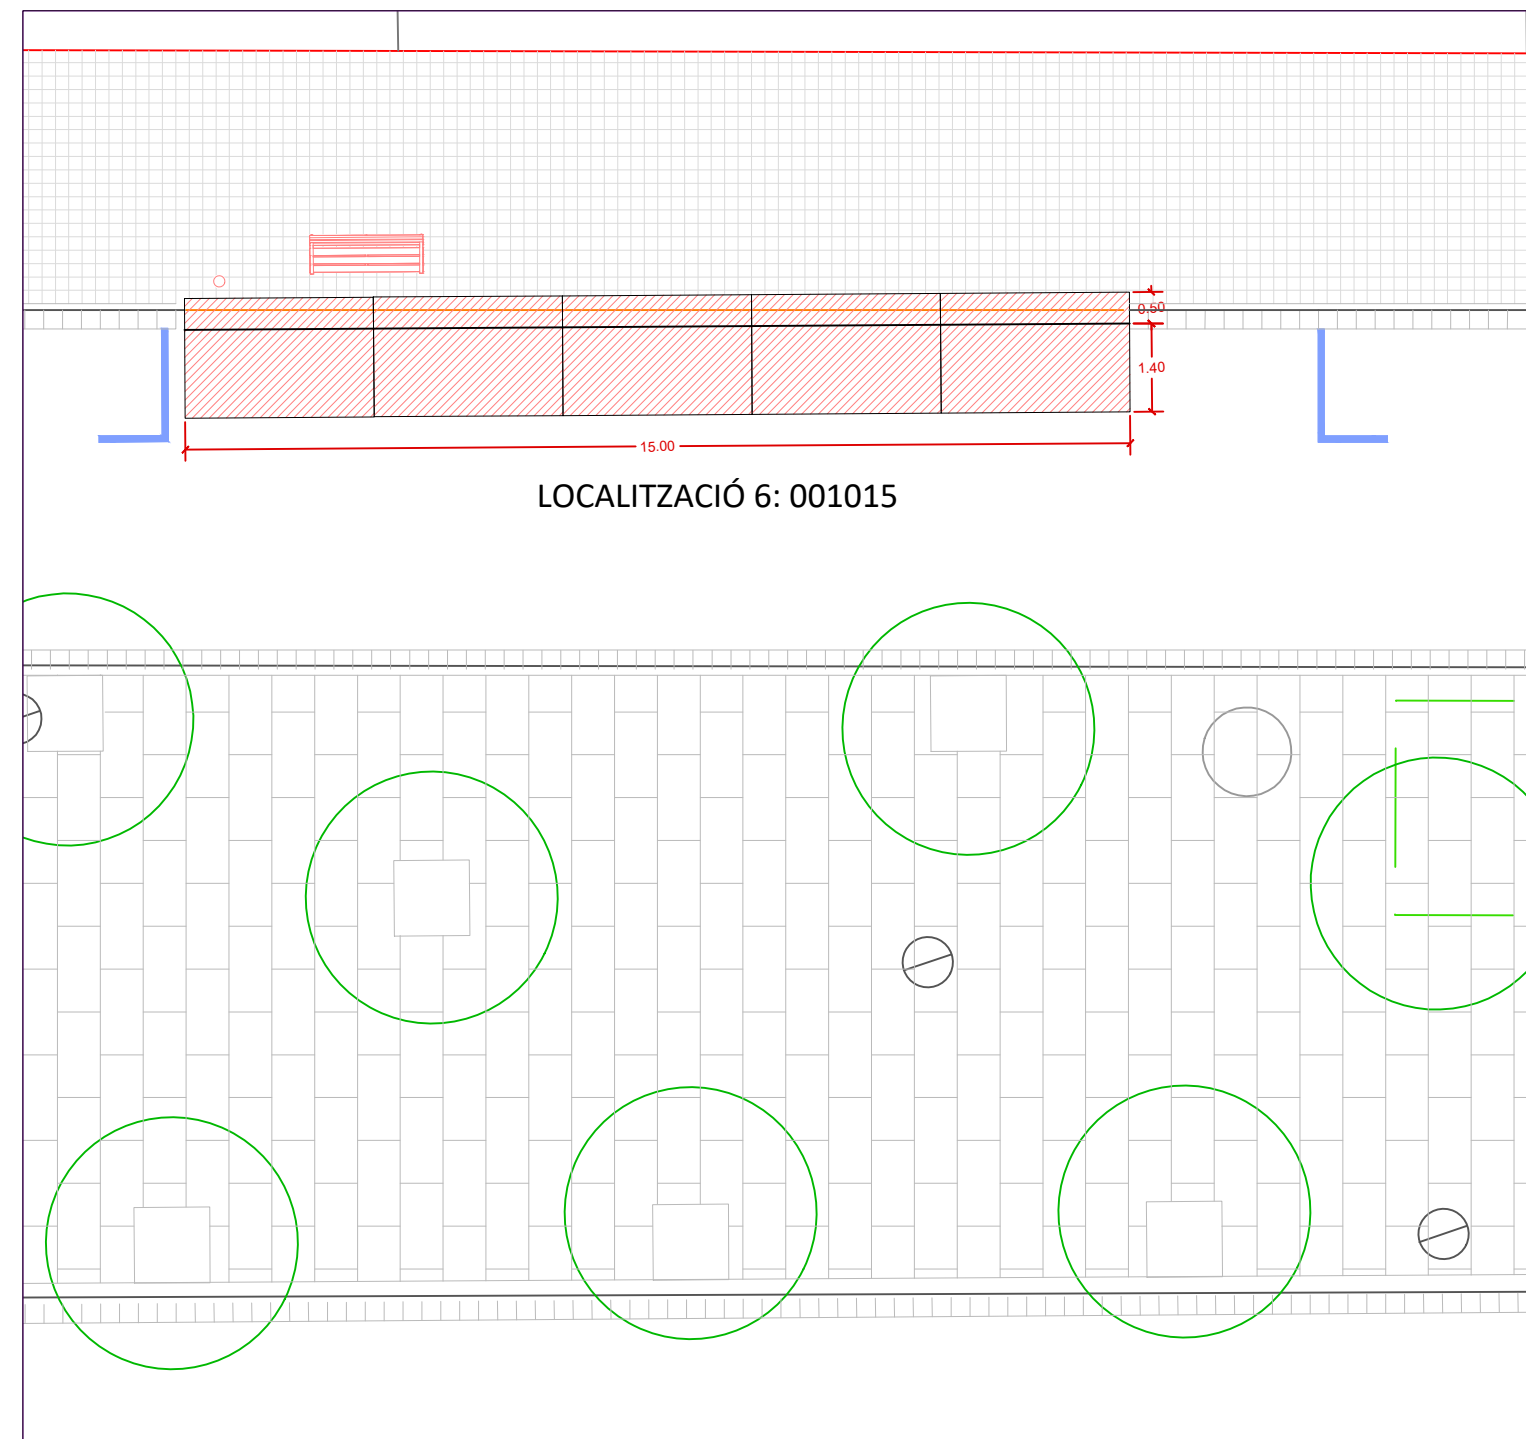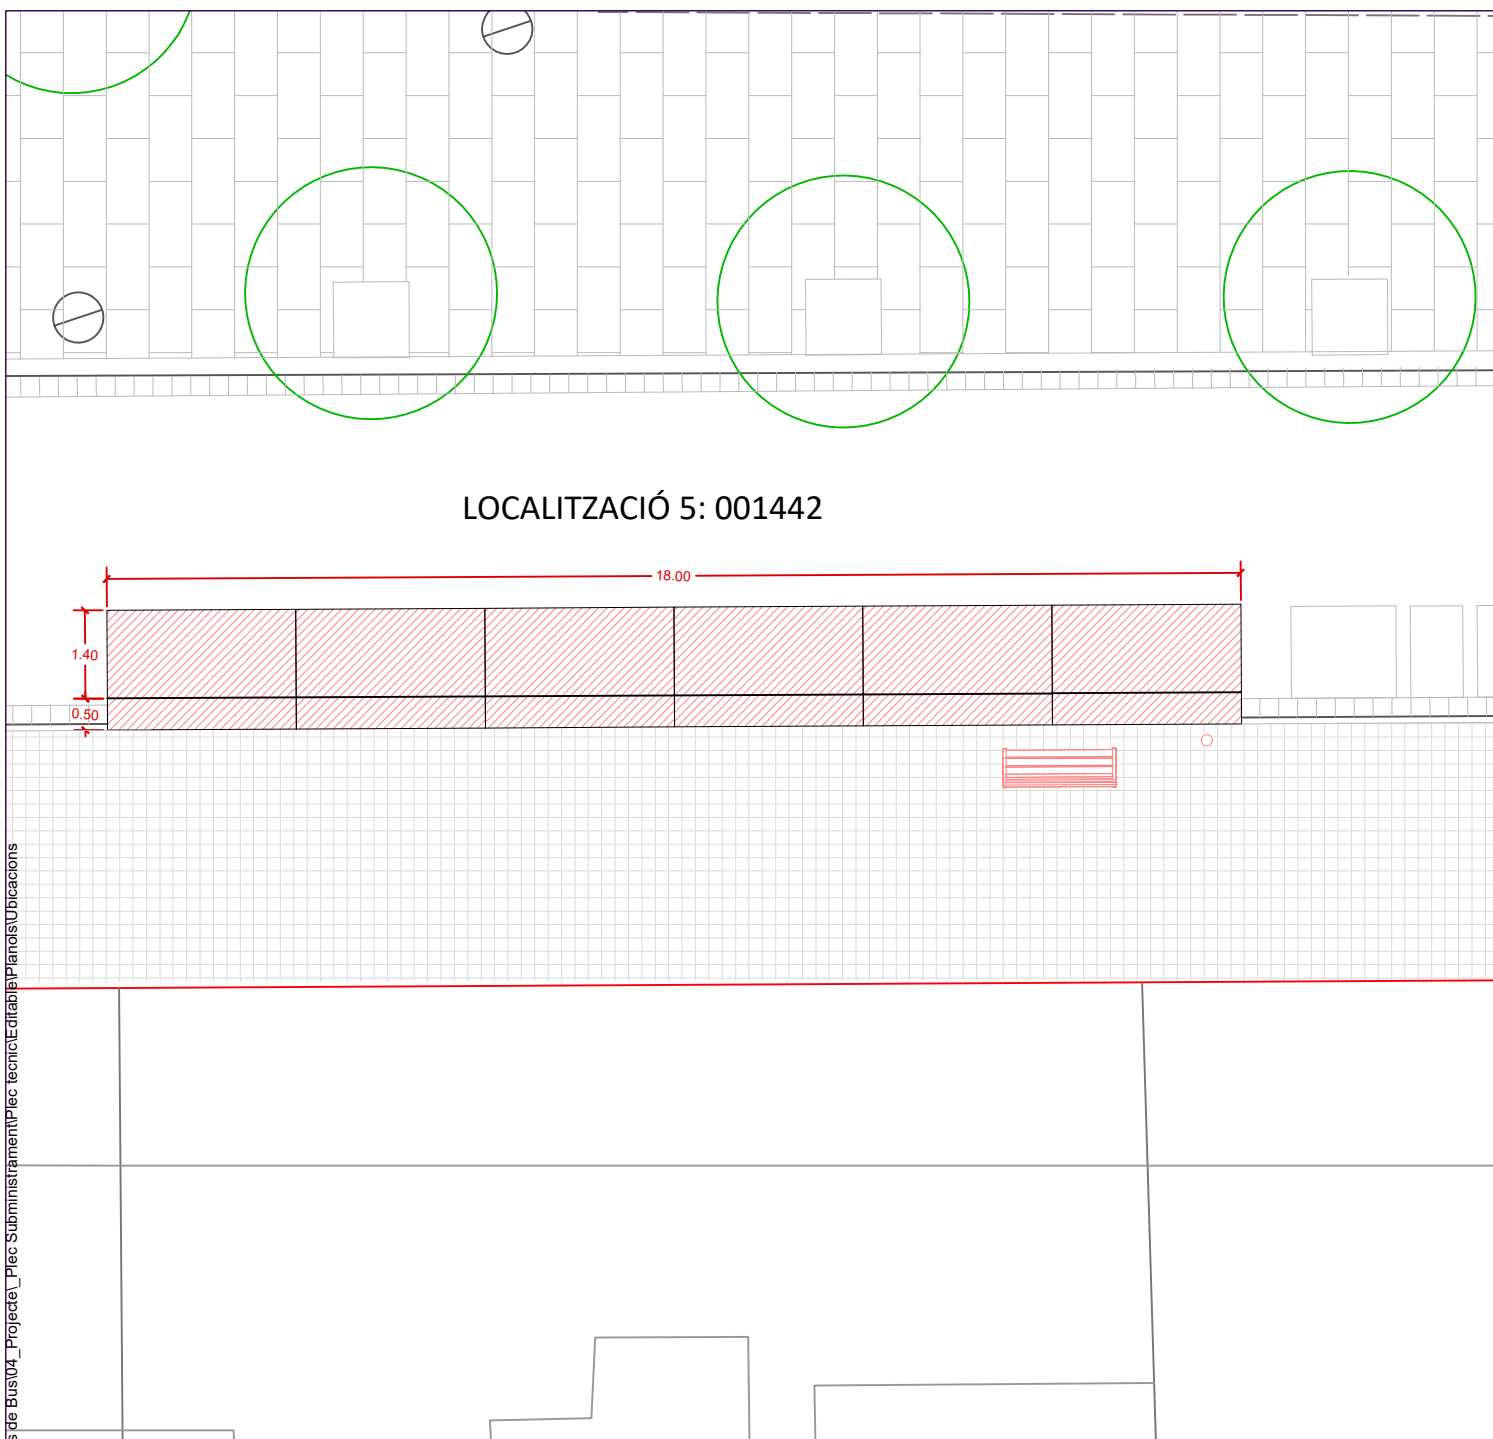-  Banc
-  Punt de parada
-  Plataforma existent






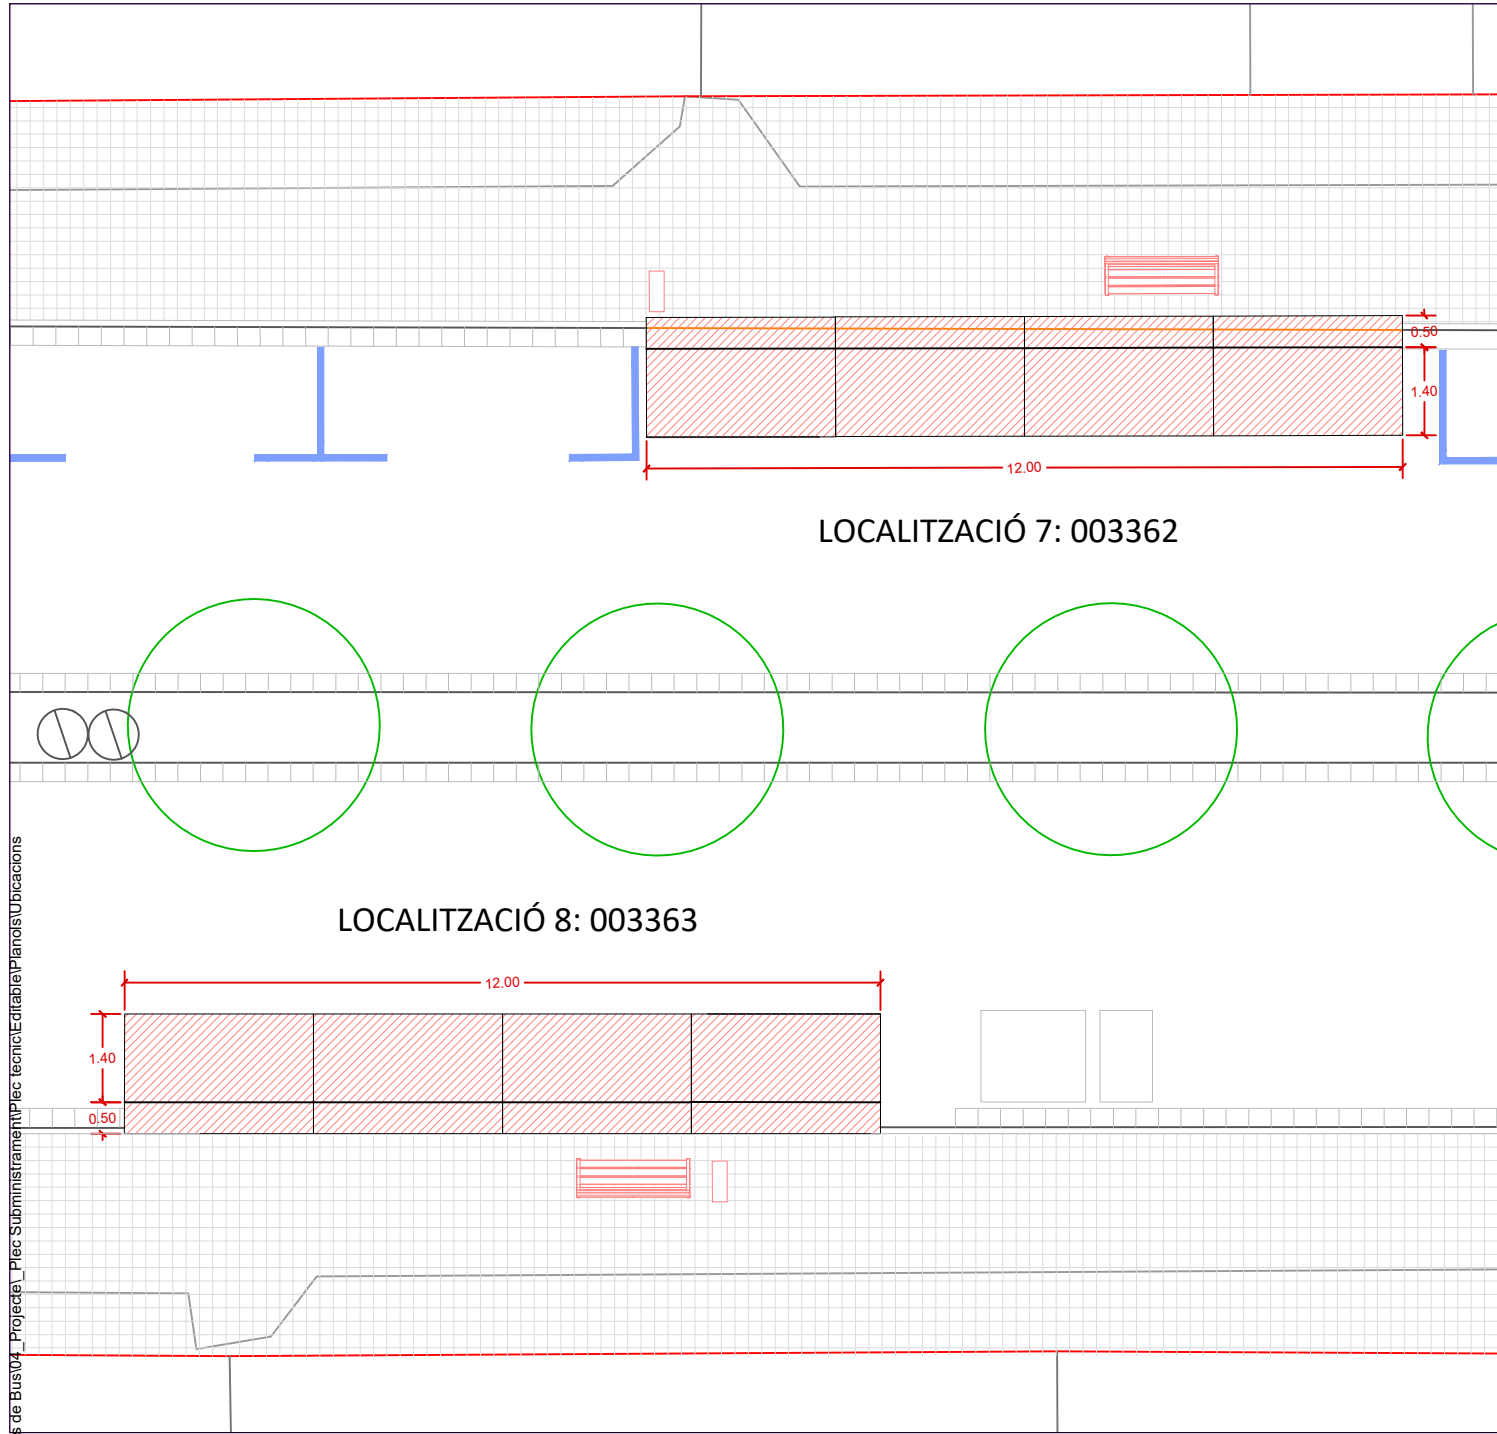
N:103 ACTUACIONS PSAEPIEPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus04_Projecte_Piec SubministramentPiec tecnolEctifabPiecUbicacions

Elements a retirar:

-  Banc
-  Punt de parada
-  Plataforma existent

Elements a retirar:




-  Banc
-  Punt de parada
-  Plataforma existent




LOCALITZACIÓ 7: 003362

LOCALITZACIÓ 8: 003363




Elements a eliminar:

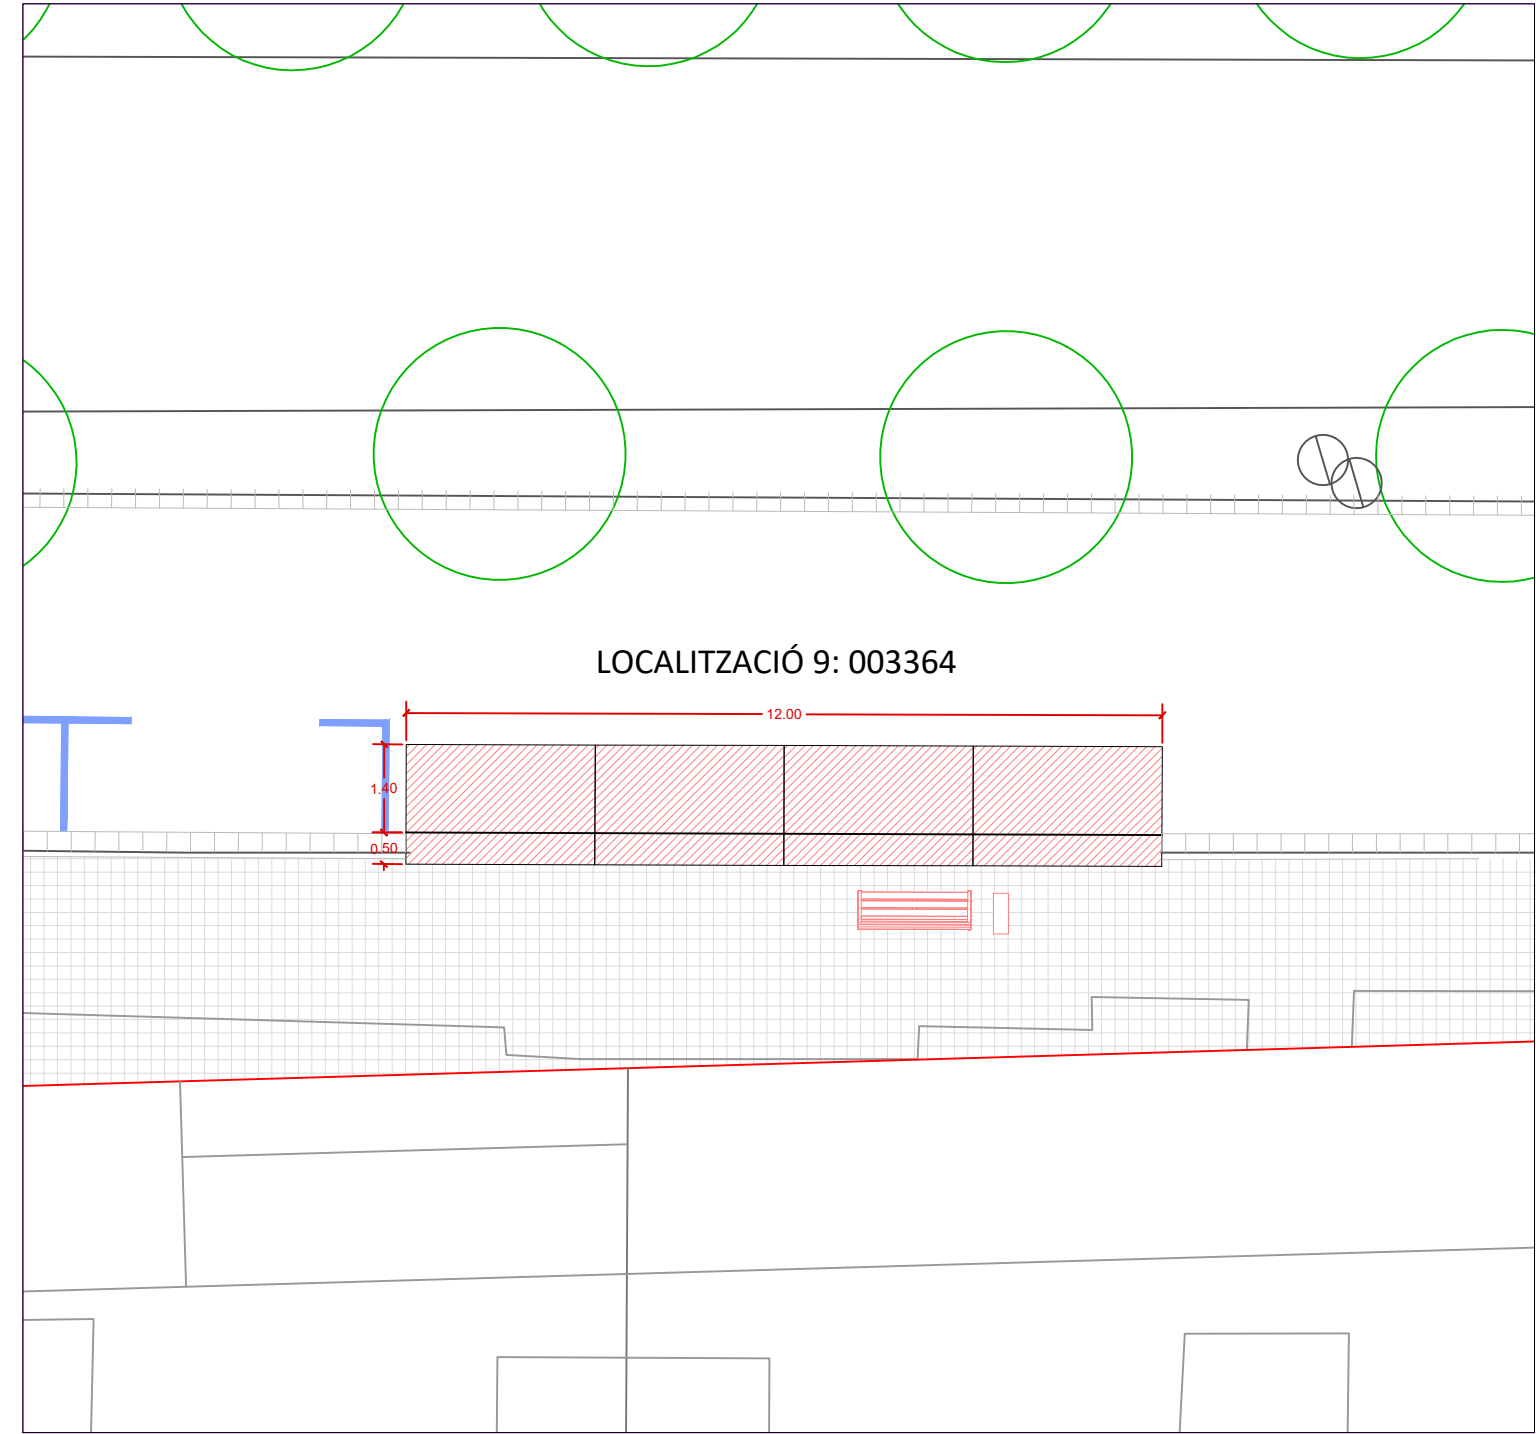-  Banc
-  PSI (Panell Solar Informatiu)
-  Plataforma existent







LOCALITZACIÓ 9: 003364

Elements a eliminar:


-  Banc
-  Punt de parada
-  Plataforma existent

N:103_ACTUACIONS PSALPELPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus04_Projecte_Piec Subministrament_Piec tecnoloficiablePianoisUbicacions

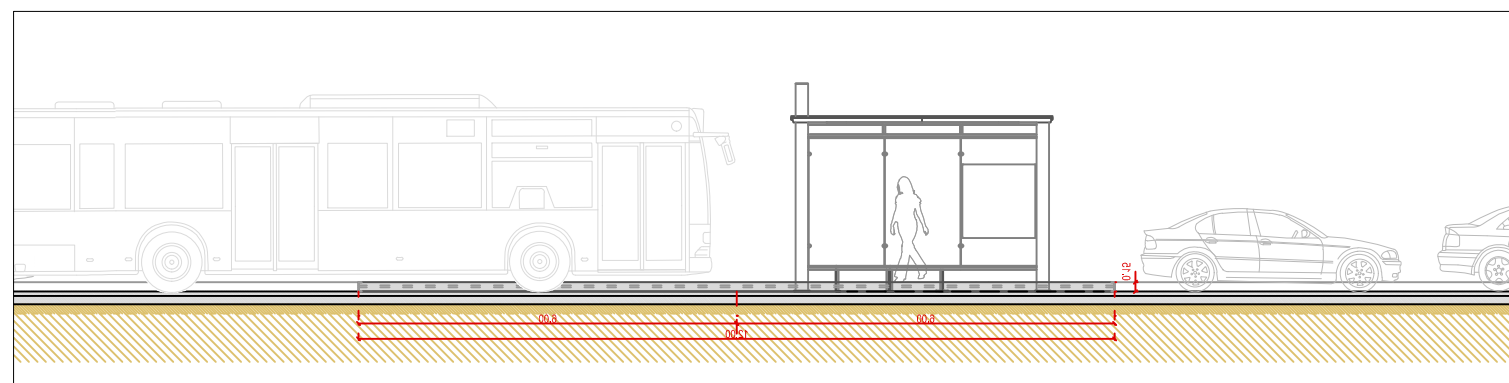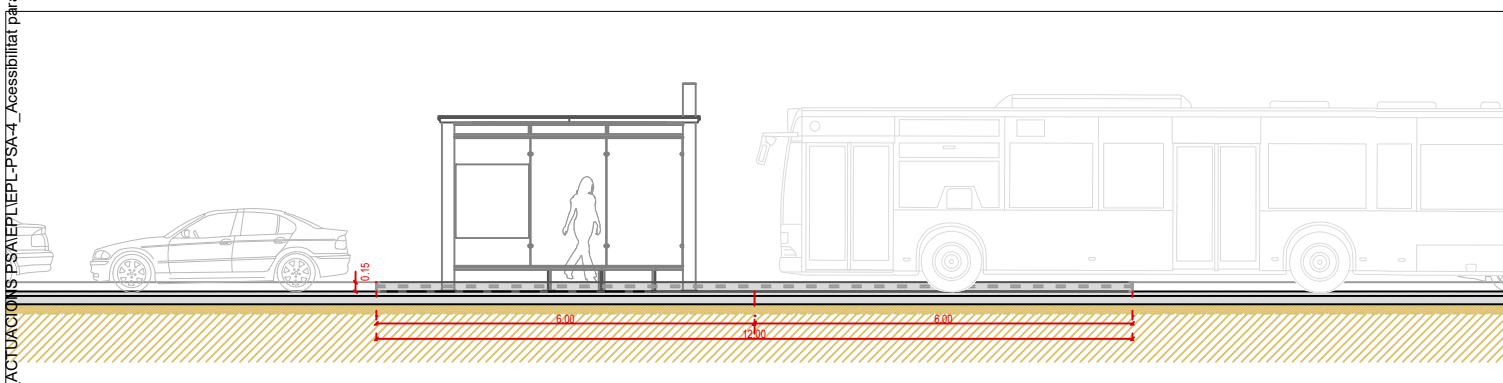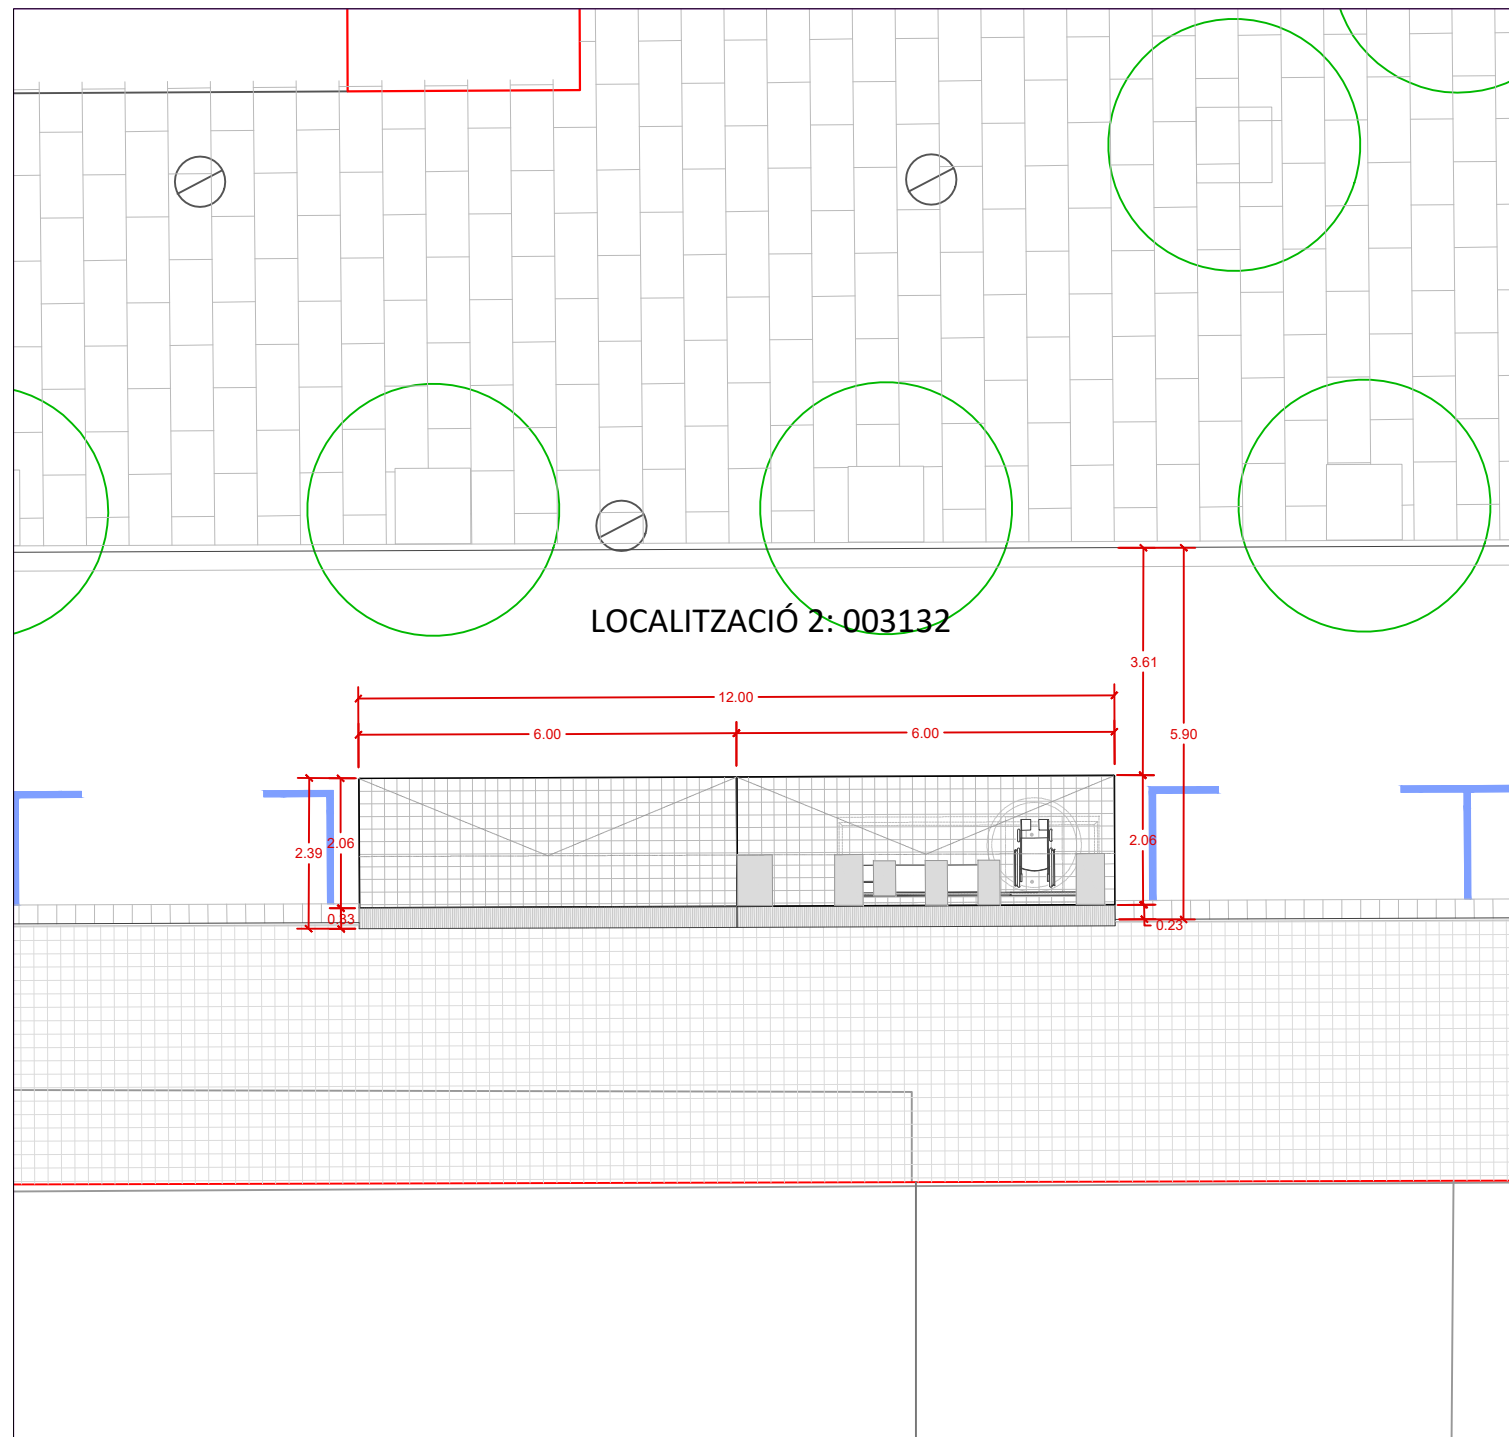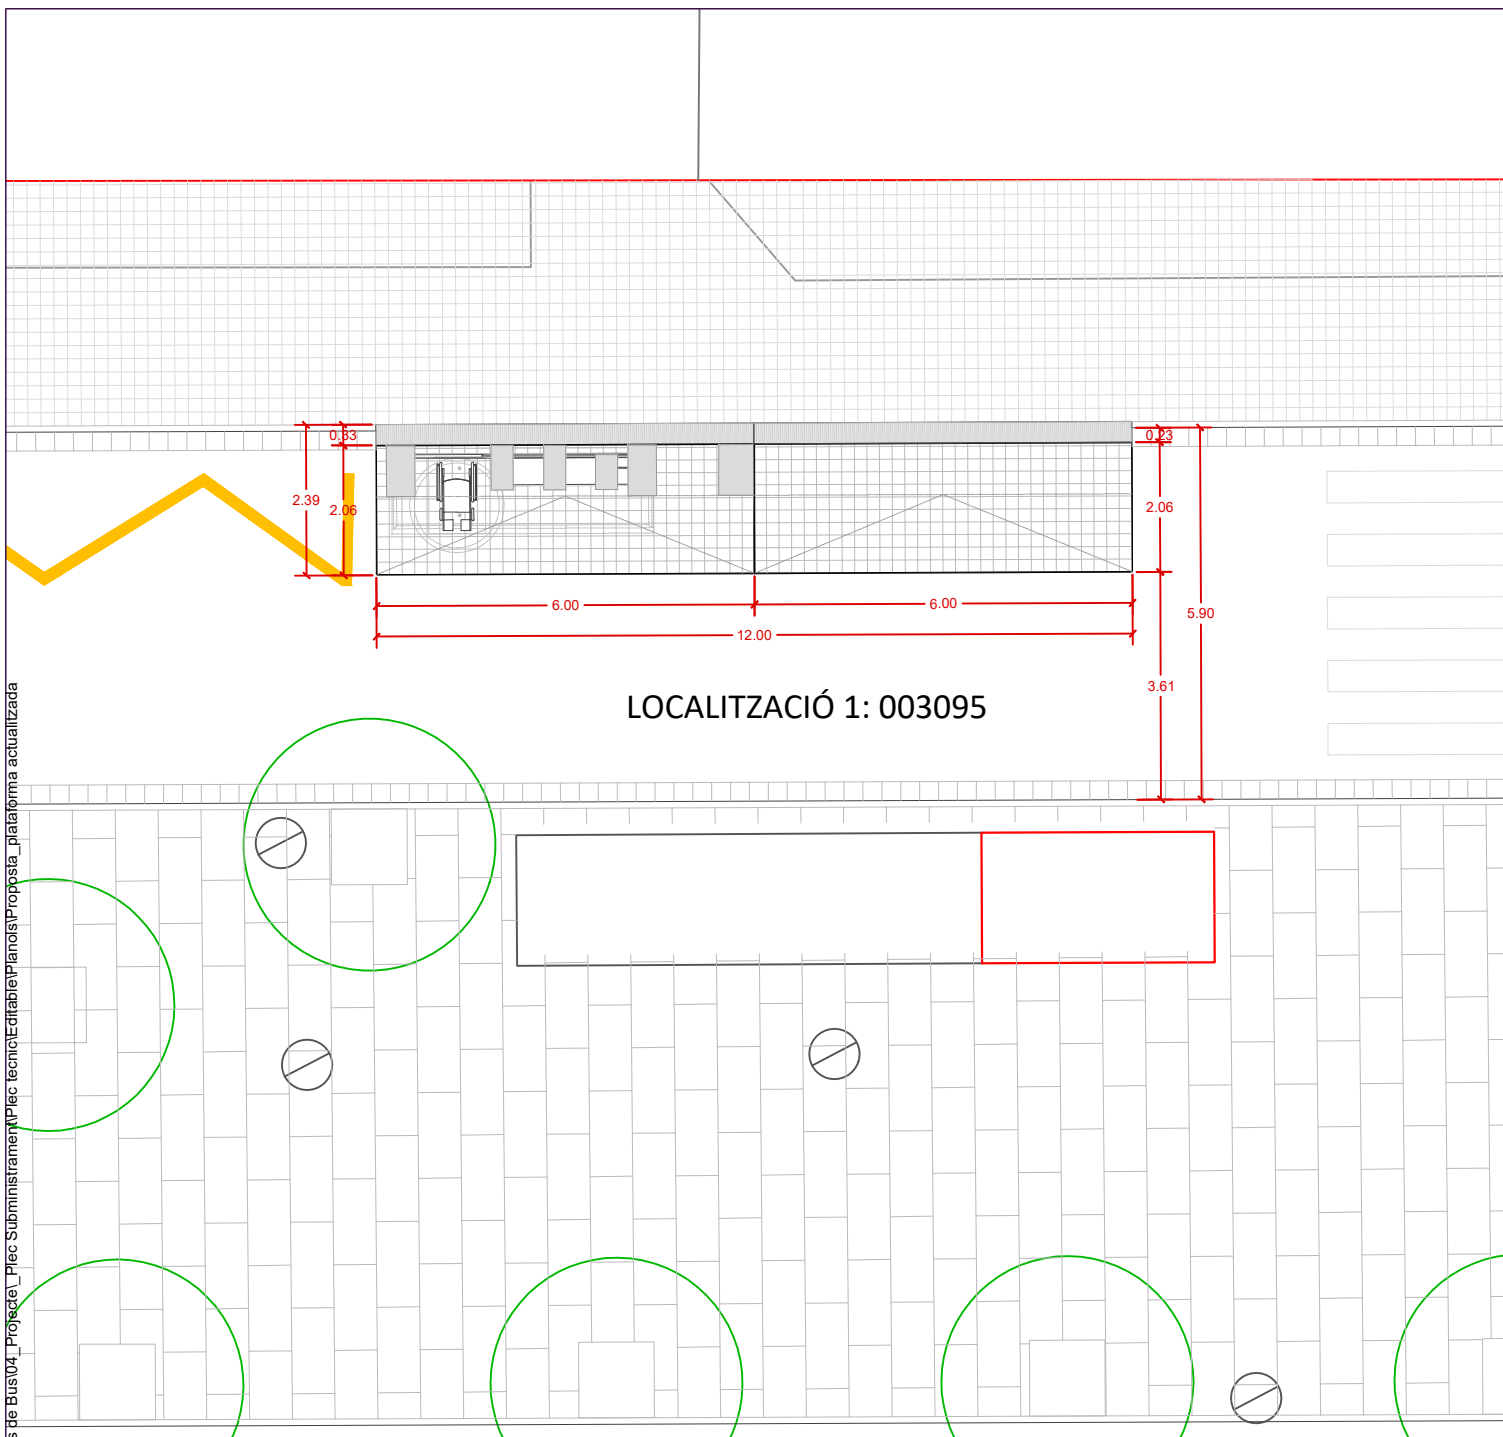


N.103 ACTUACIONS PSAE/PLEPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus/04_Projecte_Piec Subministrament/Plac tecnolEdifabie/Planois/Proposa_plataforma actualitzada



LOCALITZACIÓ 3: 001014




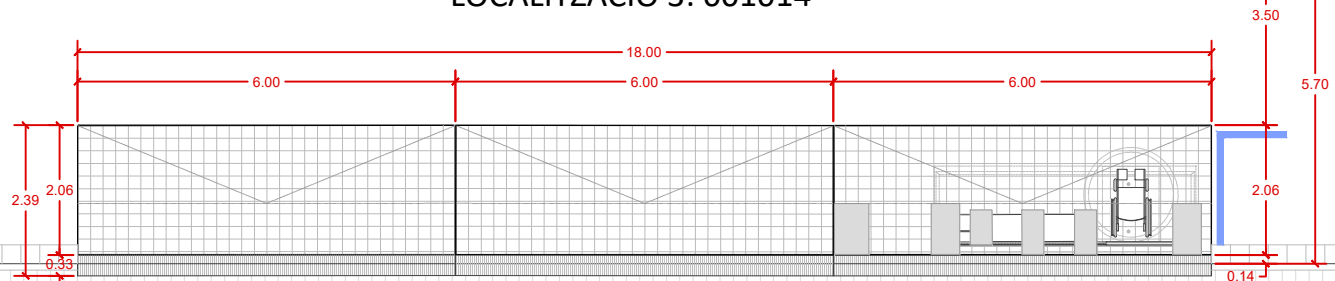


LOCALITZACIÓ 4: 001016


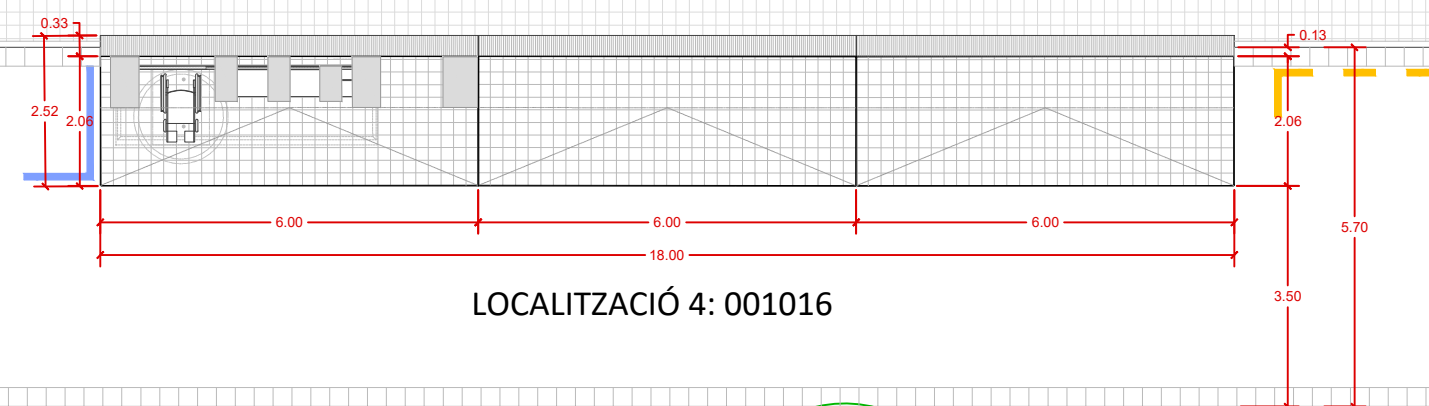


N:103 ACTUACIONS PSAE/PLEPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus/04_Projecte_Piec Subministrament/Plac tecnol.ditabje/Planois/Proposta_plataforma actualitzada

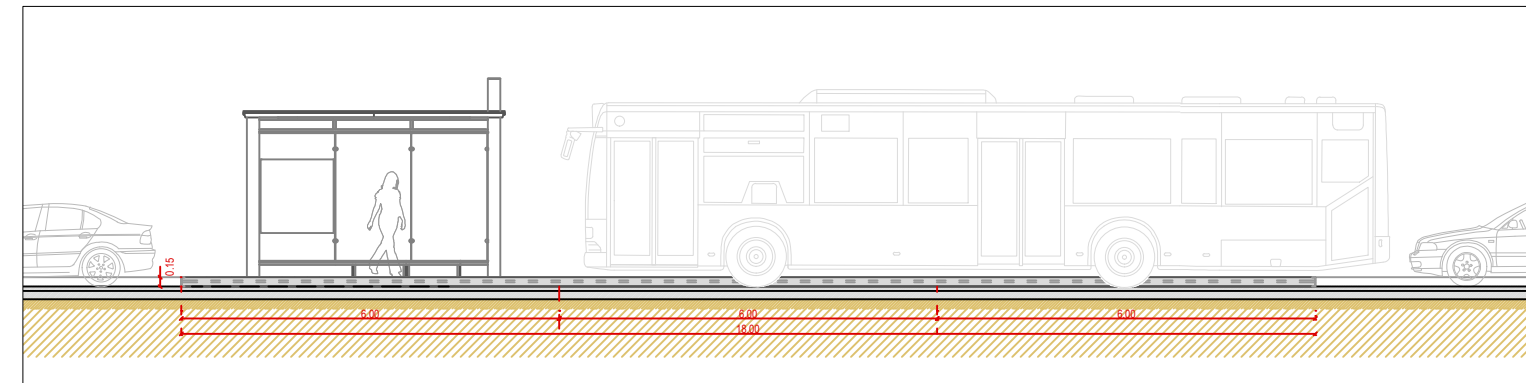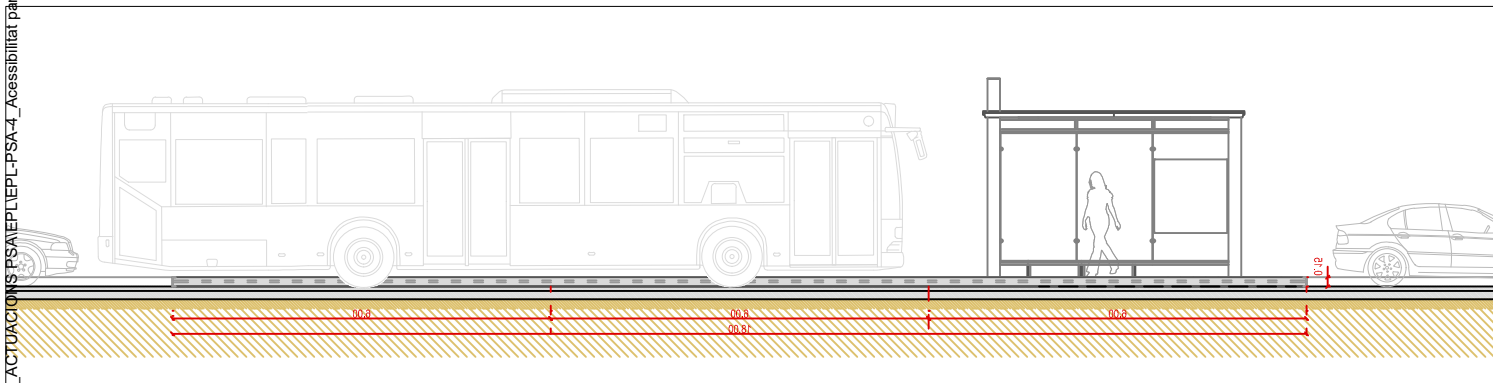

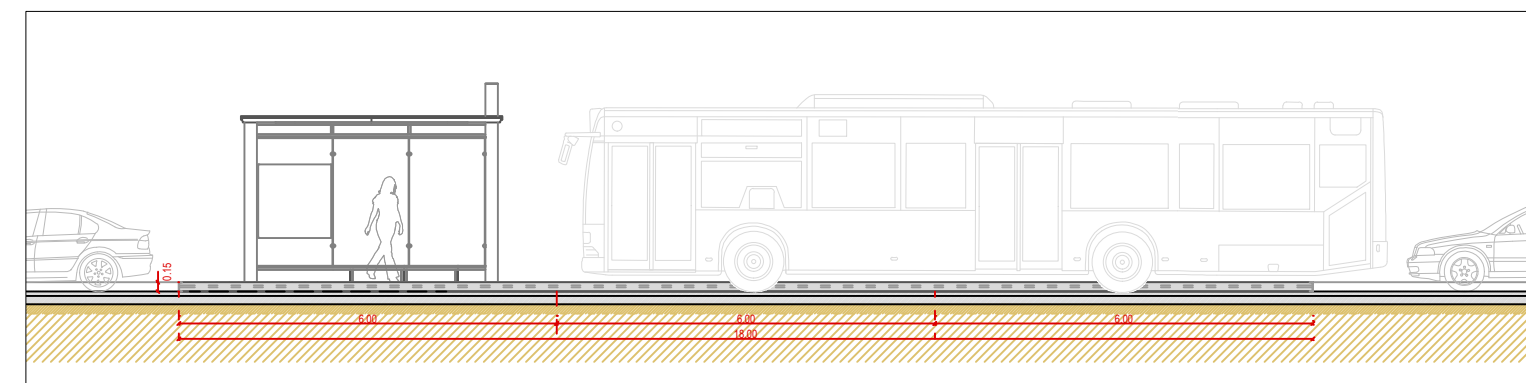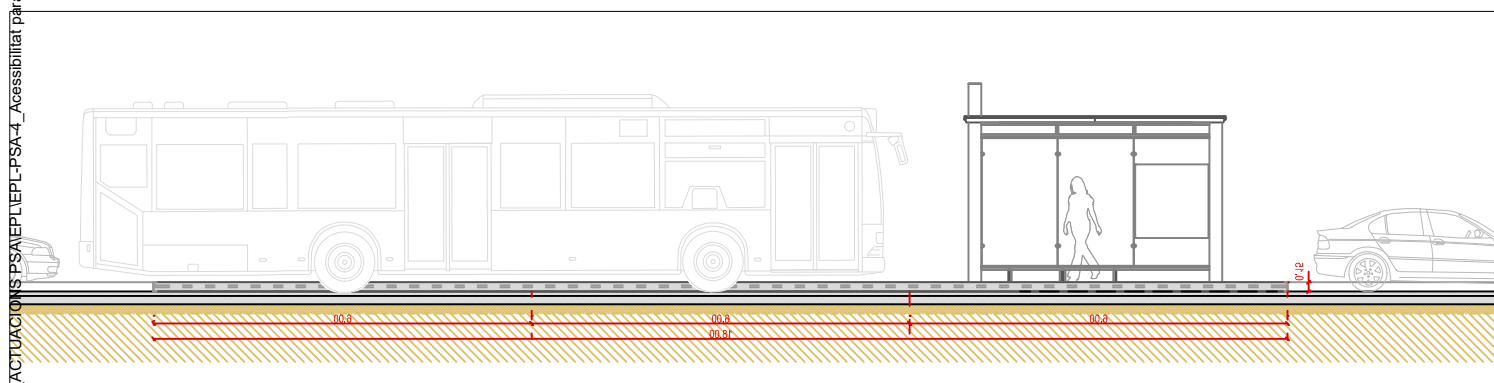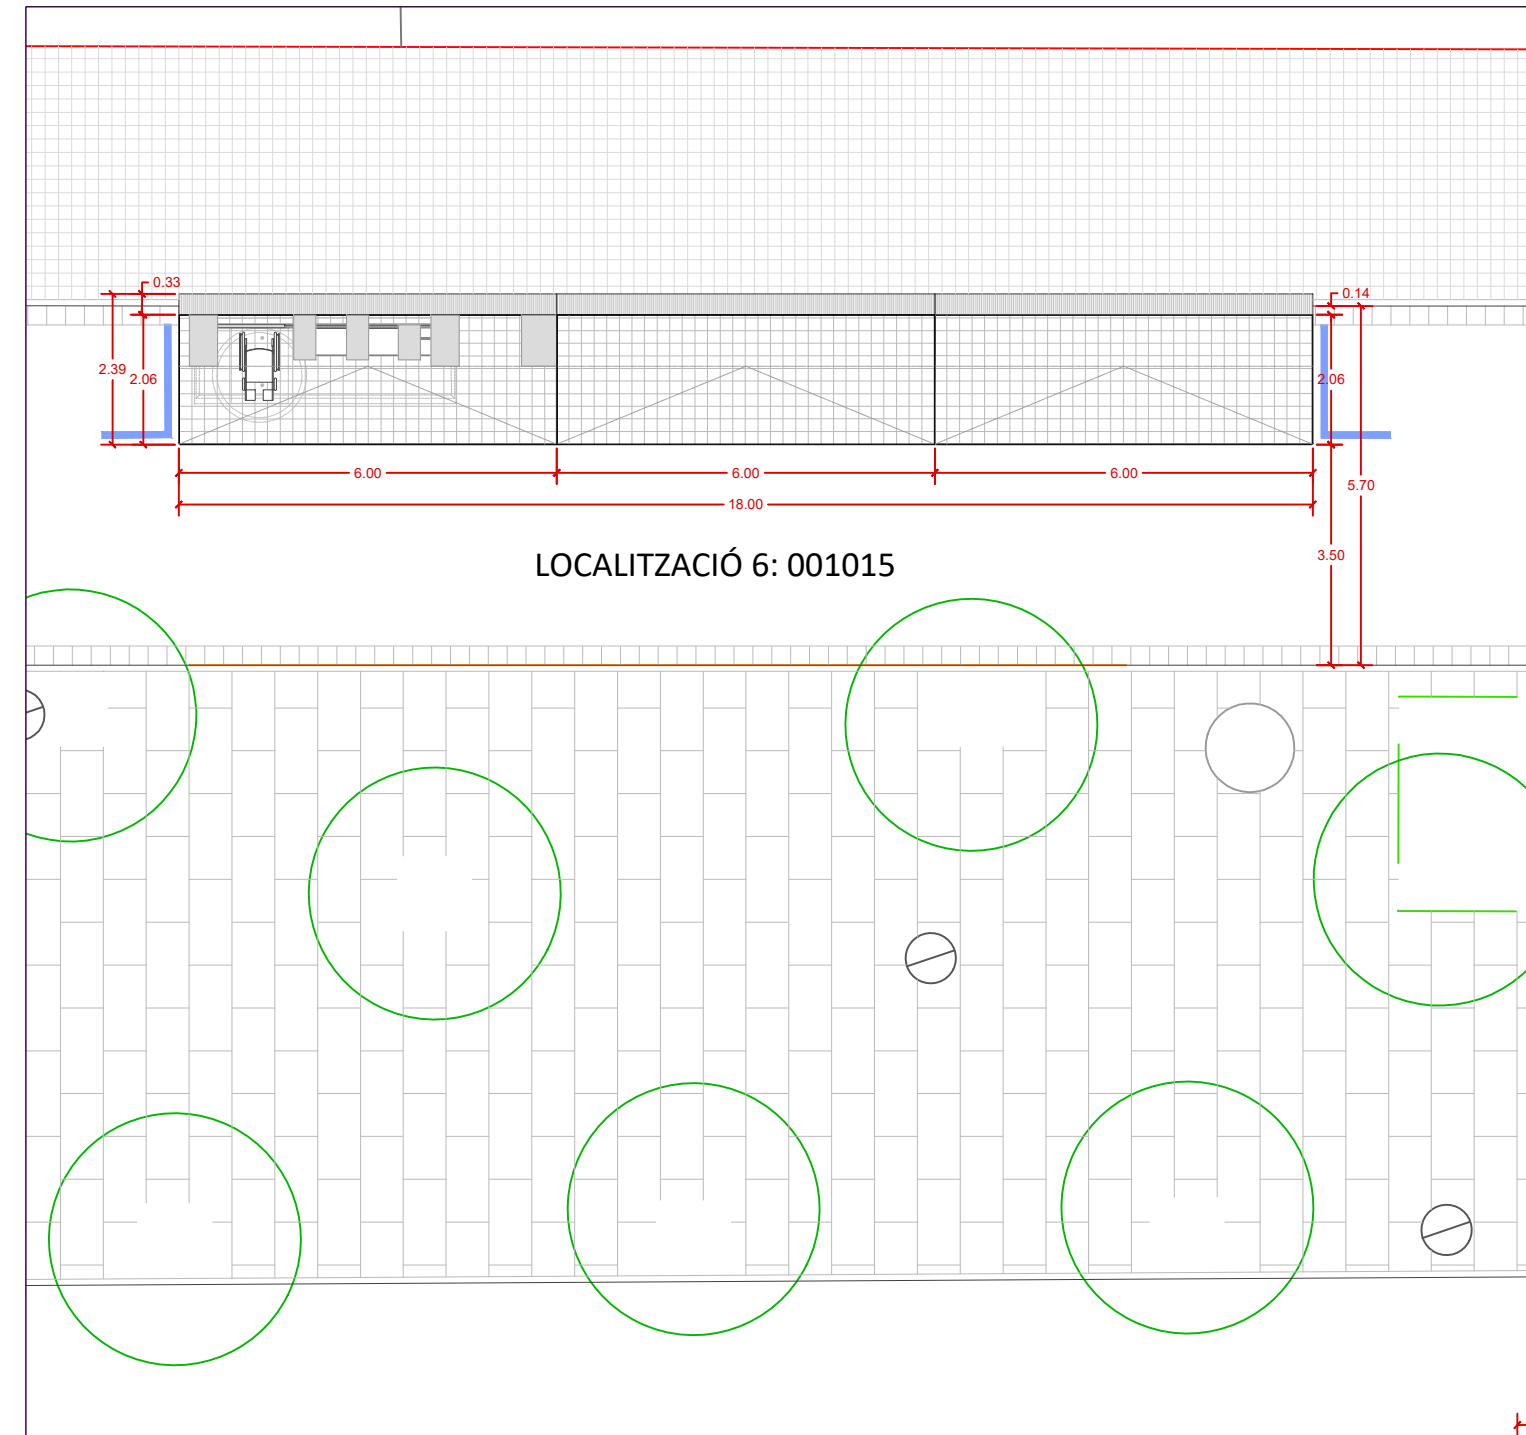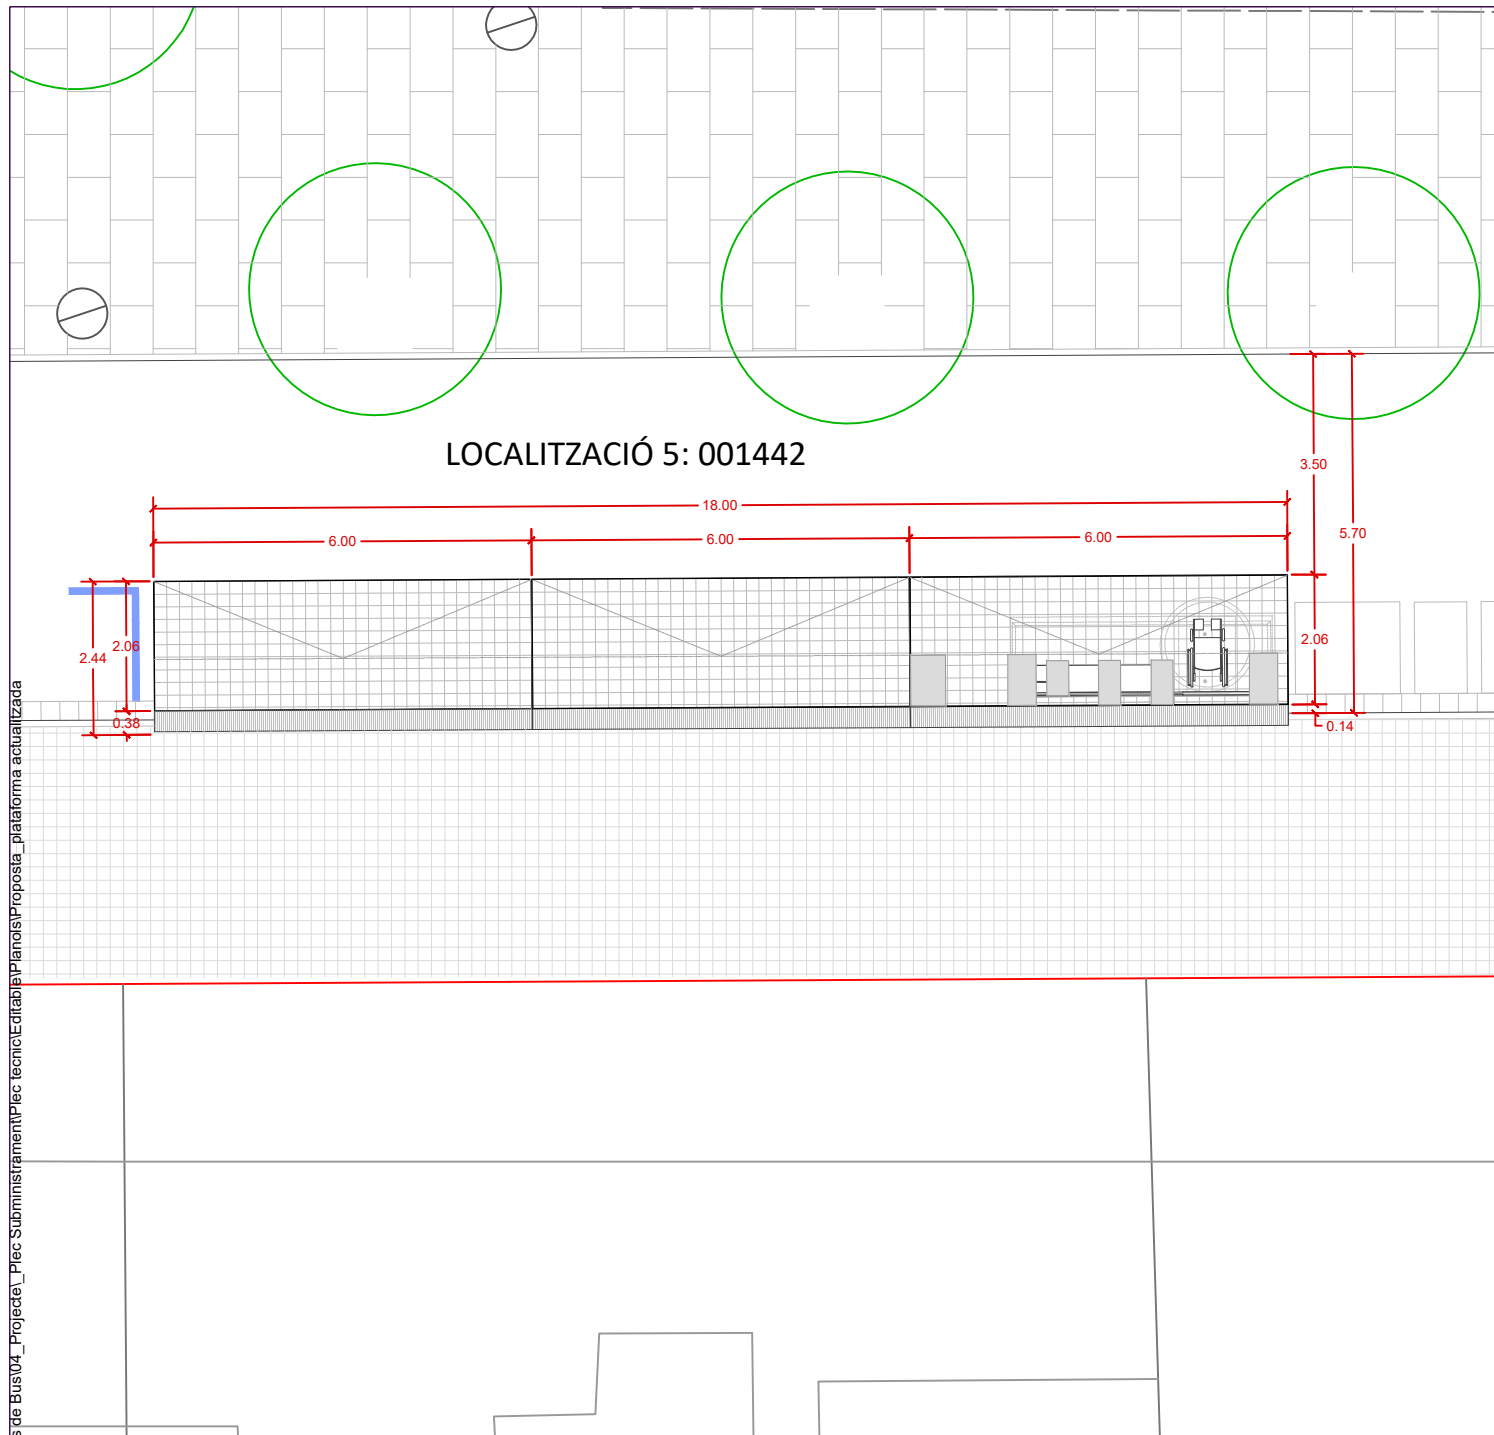

N.103 ACTUACIONS PSAEPIEPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus04_Projecte_Piec SubministramentPiec tecnolEctifabPiecPlanoisProposia_plataforma actualitzada

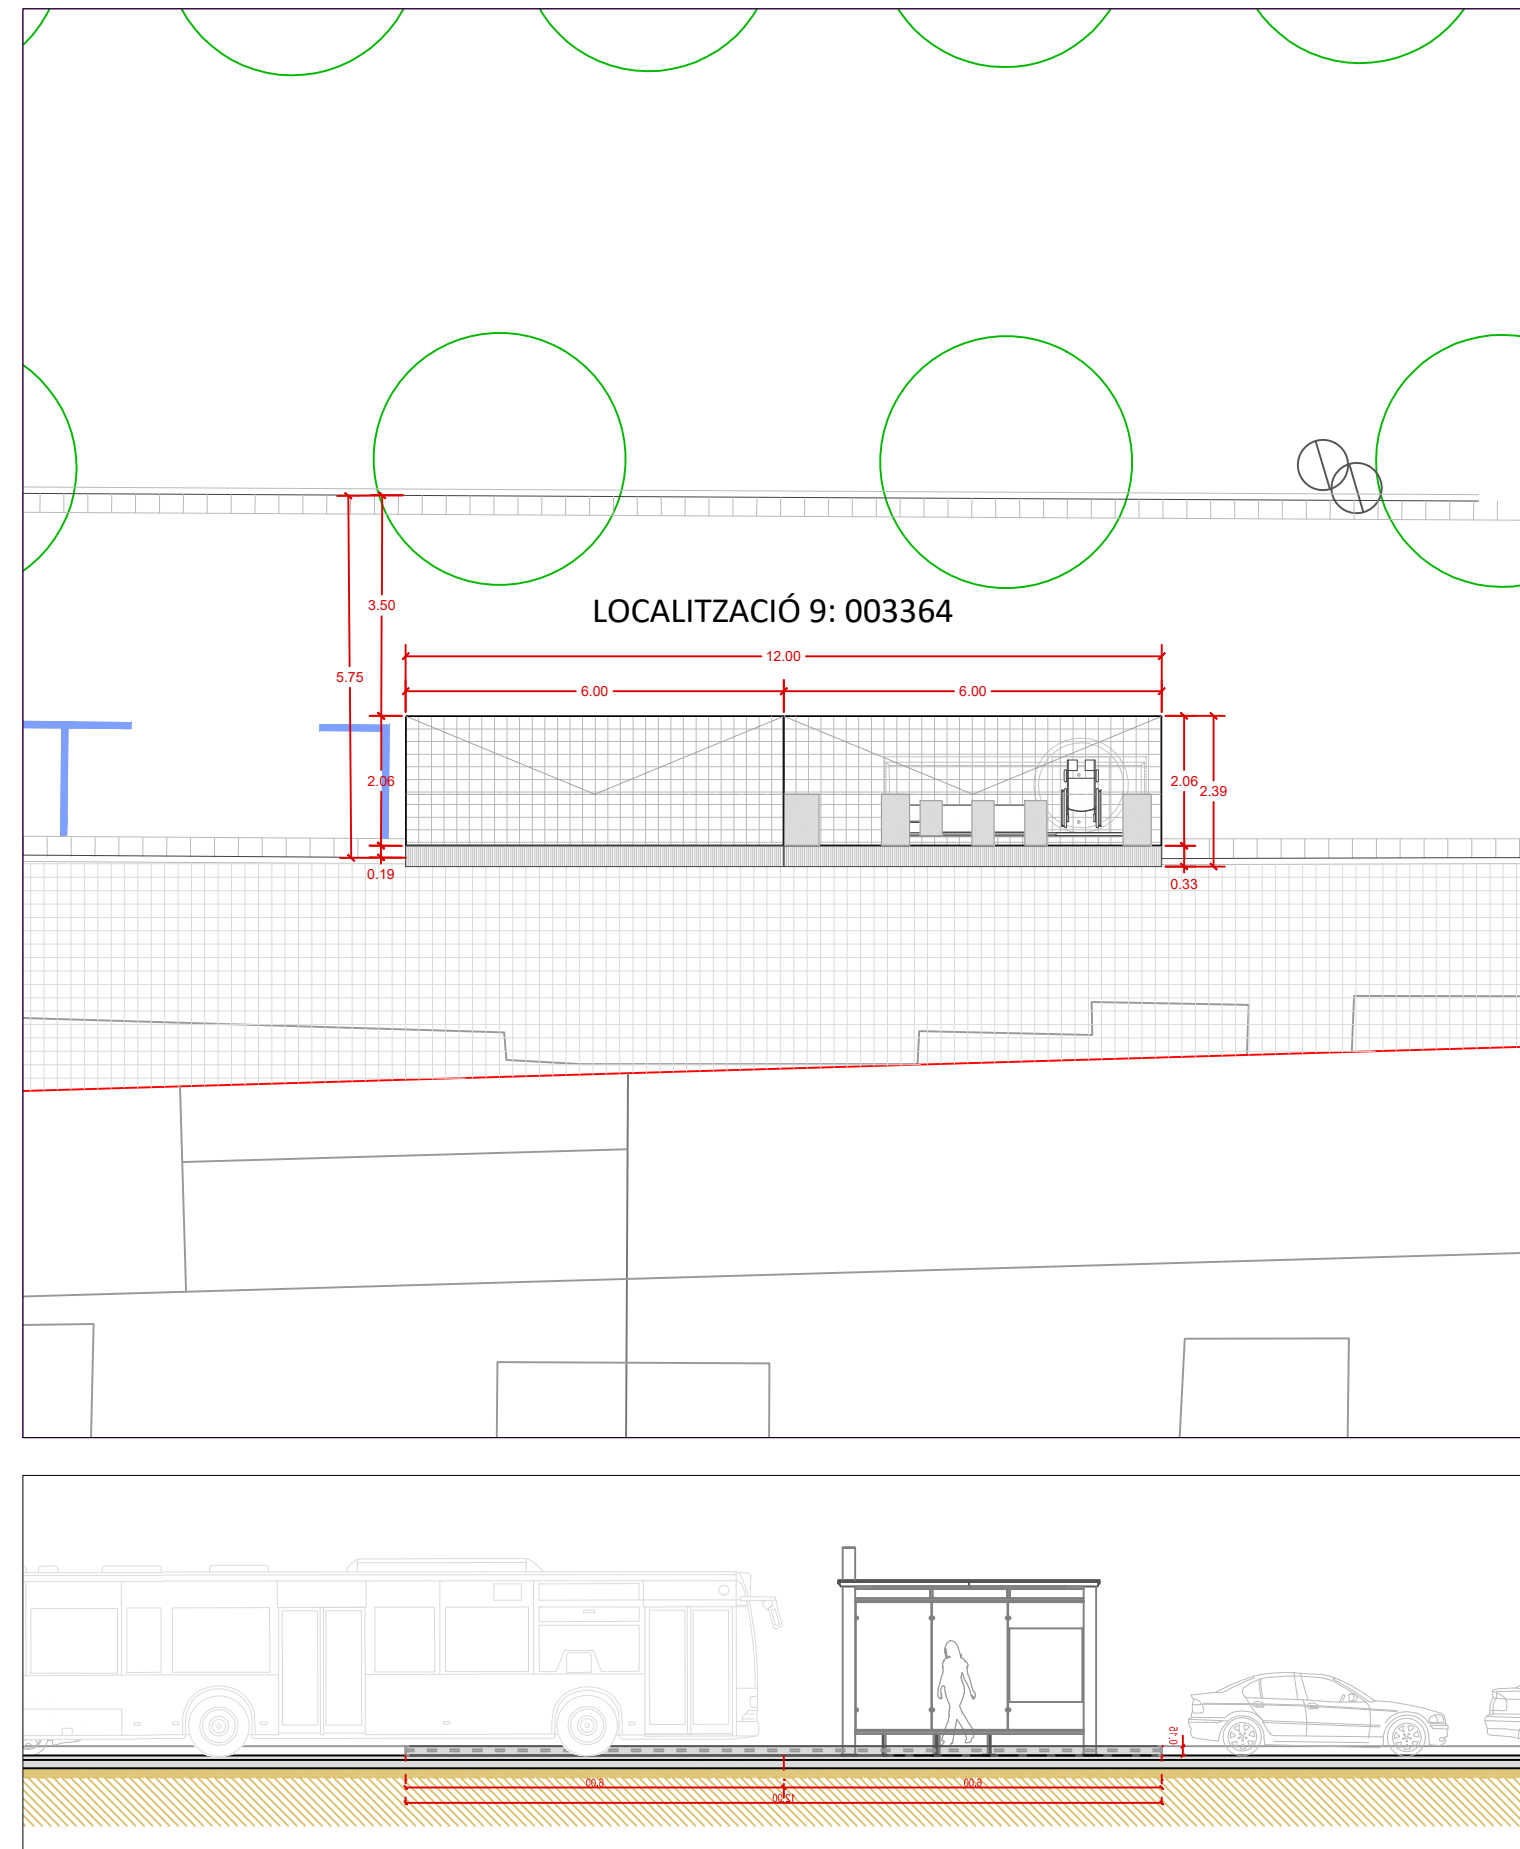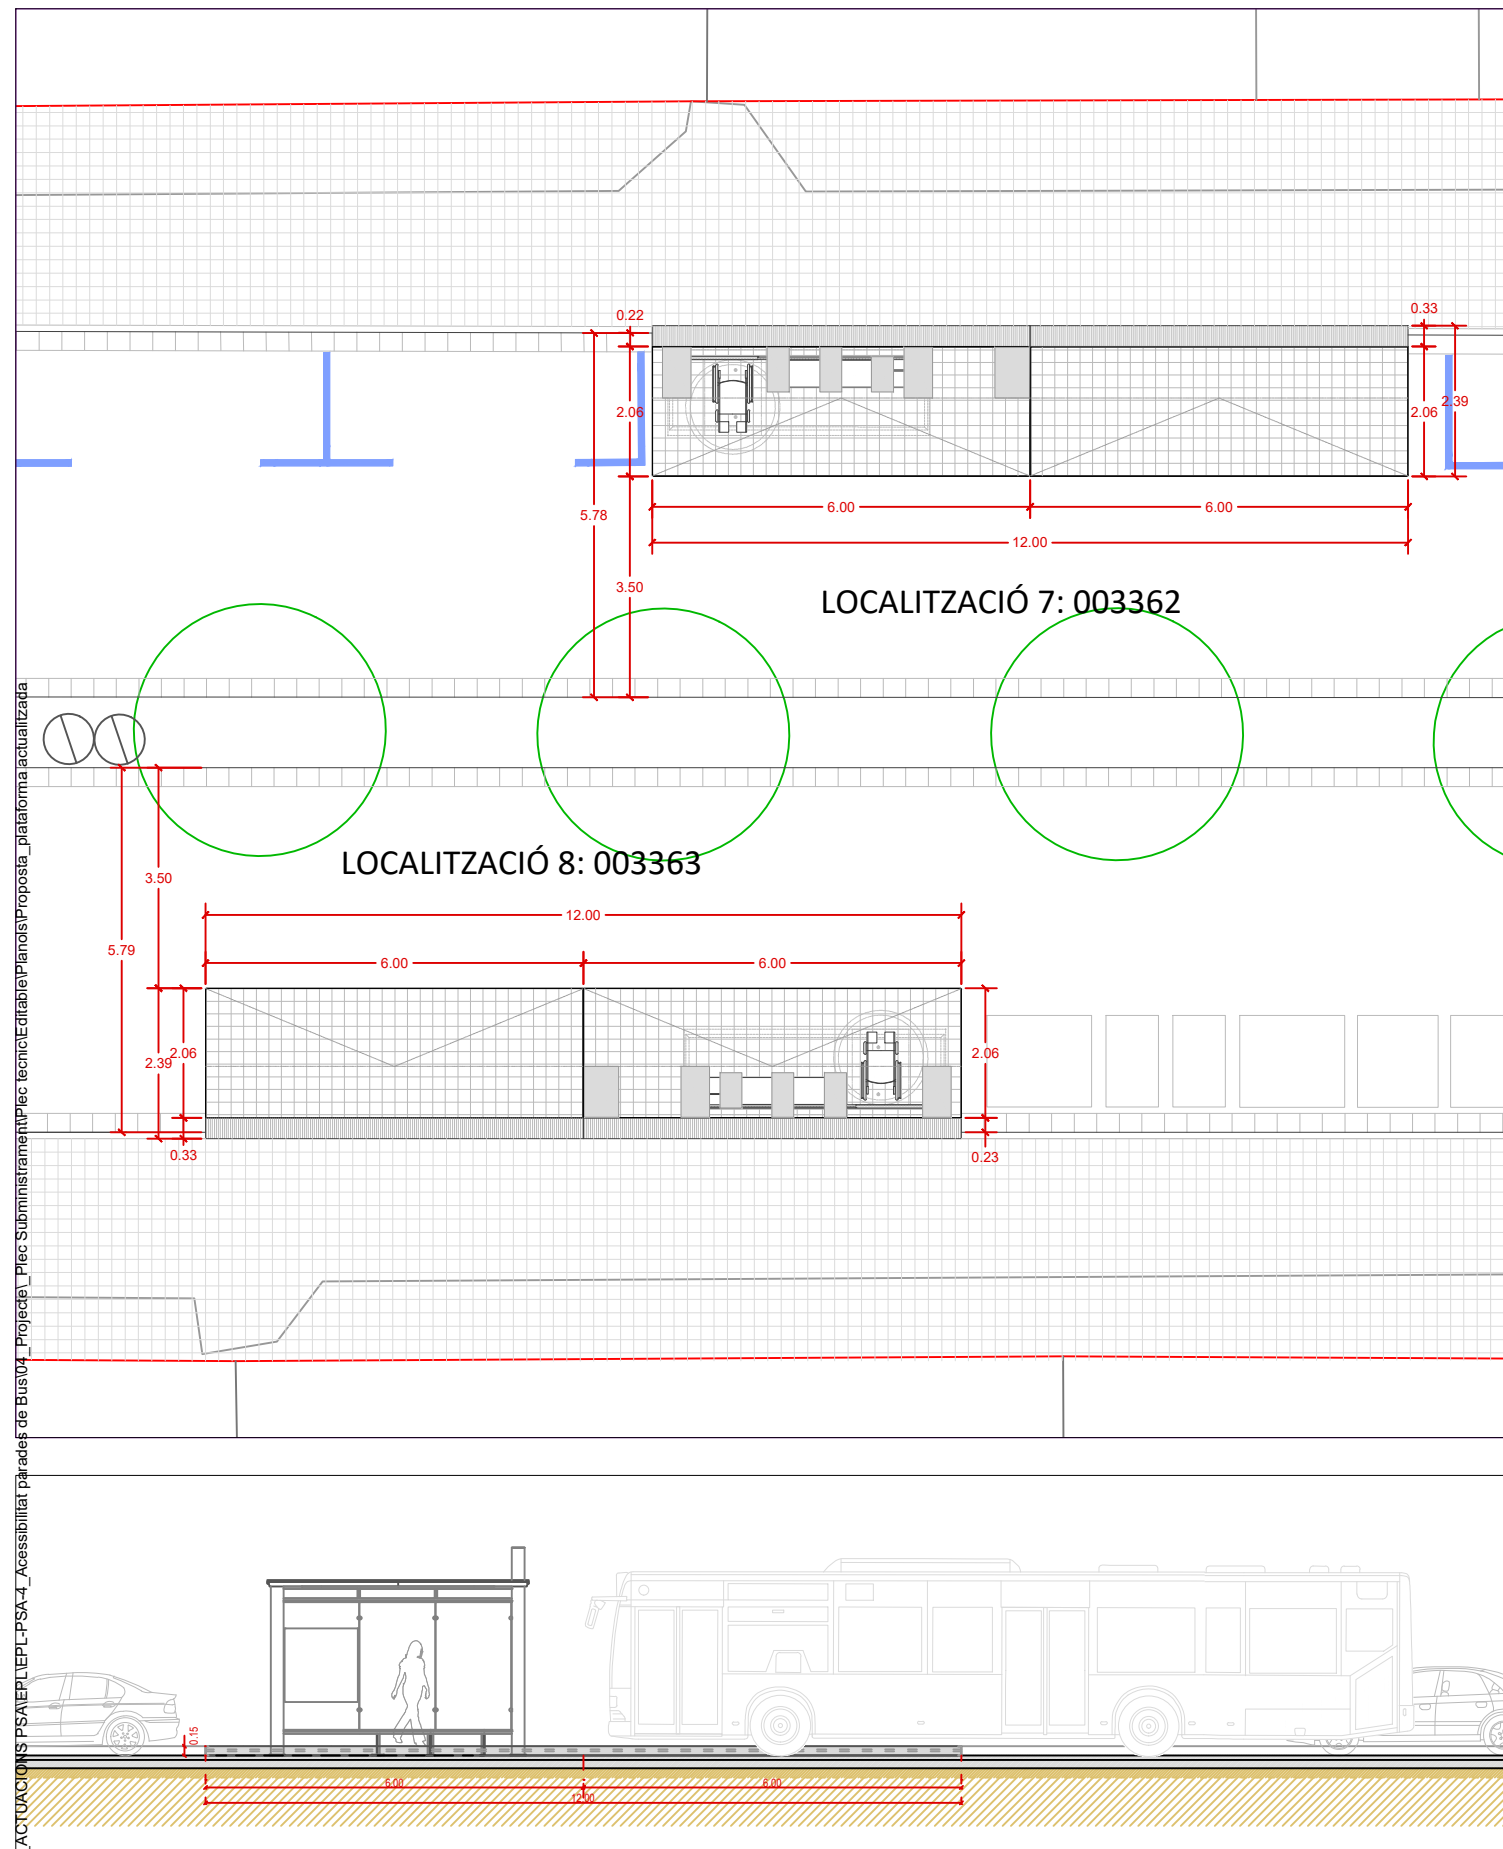

N:\03\ACTUACIONS\PSALE\LEPL-PSA-4_Accessibilitat parades de Bus\04_Projecte_Piec Subministrament\Piec tecnol\Ofi\Planois\Proposta_plataforma actualitzada

Pressupost

Pressupost

Amidaments

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE

2	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

3	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

4	P000-0005	u	Desmuntatge plataforma parada autobus de qualsevol tipus i mida (de tots els seus mòduls) i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, i transport a magatzem municipal o a un altre ubicació del municipi. En cas de no reutilització, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat.
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítol	02	LOCALITZACIO1
Subcapítol	02	PLATAFORMA MITJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes						21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
---	-----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes						28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.5, abocat amb cubilot
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5	P4ZF-M08I150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscaada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.
---	--------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítol	02	LOCALITZACIO1
Subcapítol	03	PLATAFORMA DRETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i instruccions de la DF.
---	-----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#
6			0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7			0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8			0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
10				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
11				0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
12				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#
14			0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15			0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#
17			0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18			0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#
19			0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22	mermes		34,289				34,289	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **720,060**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2	reforços			1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3				1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4				1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5				2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6				2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7				1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	mermes		35,237				35,237	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **739,972**

4 P4Z6-CV12 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

5 P4Z6-CV16 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

6 P45C2-Y1J8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,509**

7 P4ZF-M081150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla rosada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

8 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,050**

9 P9A1-CV01 m3 Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,124**

10 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 03 LOCALITZACIO2
 Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,240**

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **461,647**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **595,350**

4 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,571**

5 P4ZF-M08I150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscaada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

7 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 03 LOCALITZACIO2
 Subcapítol 03 PLATAFORMA DRETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,240**

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#
6			0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7			0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8			0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
10				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
11				0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
12				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#
14			0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15			0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#
17			0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18			0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#
19			0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
22	mermes		34,289				34,289	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							720,060	
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2	reforços			1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3				1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4				1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5				2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6				2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7				1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	mermes		35,237				35,237	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							739,972	
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,000	
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,509	
7	P4ZF-M08I150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla rosca d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,050	
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,124	
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítol	04	LOCALITZACIO3
Subcapítol	01	PLATAFORMA ESQUERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,240	
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

4	unió vorera e= 10 mm	3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5							C#*D#*E#*F#
6							C#*D#*E#*F#
7	mermes	21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **461,647**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **595,350**

4 P45C2-Y1J8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,571**

5 P4ZF-M08I150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

7 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 04 LOCALITZACIO3
 Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

1		0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#
---	--	-------	-------	--	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **0,240**

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **461,647**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **595,350**

4 P45C2-Y1J8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,571**

5 P4ZF-M08I150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

			TOTAL AMIDAMENT	12,600
7	P001-0003	u	Preparació del mottle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 01
Capítol	04	LOCALITZACIO3
Subcapítol	03	PLATAFORMA DRETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#
6			0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7			0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8			0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
10				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
11				0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
12				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#
14			0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15			0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#
17			0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18			0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#
19			0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22	mermes		34,289				34,289	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,060

3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

2	reforços	1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3		1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4		1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5		2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6		2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7		1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8						C#*D#*E#*F#
9						C#*D#*E#*F#
10	mermes				35,237	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,972

4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidrófug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,509

7	P4ZF-M08I150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.					
---	--------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,050

9 P9A1-CV01 m3 Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,124

10 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05 LOCALITZACIO4
Subcapítol 01 PLATAFORMA ESQUERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 461,647

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			45,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,350

4 P45C2-YIj8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,571

5 P4ZF-M08I150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscaada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

7 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05 LOCALITZACIO4
Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **461,647**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **595,350**

4 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,571**

5 P4ZF-M081150 u Anoratge sobre element de formigó amb barilla rosada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

7 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05 LOCALITZACIO4

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

Subcapítol 03 PLATAFORMA DRETA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P4Z9-3LXI m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,240**

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#
6			0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7			0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8			0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
10				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
11				0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
12				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#
14			0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15			0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#
17			0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18			0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#
19			0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22	mermes		34,289				34,289	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **720,060**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2	reforços			1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3				1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4				1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5				2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6				2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7				1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	mermes		35,237				35,237	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT **739,972**

4 P4Z6-CV12 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

5 P4Z6-CV16 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

6 P45C2-YIU8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,509**

7 P4ZF-M081150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

8 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT **11,050**

9 P9A1-CV01 m3 Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,124**

10 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06 LOCALITZACIÓ 5
Subcapítol 01 PLATAFORMA ESQUERRA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 P4Z9-3LXI m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,240**

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enriquidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes			21,983			21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **461,647**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
							TOTAL AMIDAMENT	595,350
4	P45C2-Y1J8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidrófug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot					
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,571
5	P4ZF-M08I150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.					
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	12,000
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland					
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	12,600
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja					
							AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 06 LOCALITZACIO5
 Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir
1			
1			
			TOTAL AMIDAMENT
			0,240

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

3			0,350	0,230	8,000	0,644	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes						21,983	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	461,647
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2					
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	595,350
4	P45C2-Y1J8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidrófug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot					
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,571
5	P4ZF-M08I150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.					
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	12,000
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland					
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	12,600
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja					
							AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 06 LOCALITZACIO5
 Subcapítol 03 PLATAFORMA DRETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

- 2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#	
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#	
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#	
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#	
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#	
6				0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7				0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8				0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#	
10				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#	
11				0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#	
12				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#	
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#	
14				0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15				0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#	
17				0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18				0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#
19				0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#	
21								C#*D#*E#*F#	
22	mermes		34,289				34,289	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 720,060

- 3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2	reforços			1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3				1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4				1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5				2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6				2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7				1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	mermes		35,237				35,237	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,972

- 4 P4Z6-CV12 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 5 P4Z6-CV16 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

- 6 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,509

- 7 P4ZF-M081150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

- 8 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,050

- 9 P9A1-CV01 m3 Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

1	zones fixacions	0,400	0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2		0,300	0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3		0,150	0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4		0,200	0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,124

10 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07 LOCALITZACIO6
Subcapítol 01 PLATAFORMA ESQUERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P429-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 461,647

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,350

4 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

1		4,850	0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2		7,450	0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,571

5 P4ZF-M08I150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1						12,600	1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

7 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07 LOCALITZACIO6
Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P429-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 461,647

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,000	

6 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,509	

7 P4ZF-M081150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscaada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

8 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,050	

9 P9A1-CV01 m3 Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,124	

10 P001-0003 u Preparació del mottle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 08 LOCALITZACIO7
 Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,240	

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							461,647	

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							595,350	

4 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,571	

5 P4ZF-M081150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscaada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,600	

7 P001-0003 u Preparació del mottle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08 LOCALITZACIO7
Subcapítol 03 PLATAFORMA DRETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,240	

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#
6			0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7			0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8			0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
10				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
11				0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
12				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#
14			0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15			0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#
17			0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18			0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

19			0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22	mermes						34,289	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							720,060	

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2	reforços			1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3				1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4				1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5				2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6				2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7				1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	mermes						35,237	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							739,972	

4 P4Z6-CV12 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

5 P4Z6-CV16 u Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,000	

6 P45C2-Y1J8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,509	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

7 P4ZF-M08I150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

8 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,050	

9 P9A1-CV01 m3 Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,124	

10 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09 LOCALITZACIO8
Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P4Z9-3LXI m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,240	

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o engridors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **461,647**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **595,350**

4 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,571**

5 P4ZF-M08I150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

7 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09 LOCALITZACIO8
Subcapítol 03 PLATAFORMA DRETA

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,240

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#
6			0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7			0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8			0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
10				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
11				0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#
12				0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#
14			0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15			0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#
17			0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18			0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#
19			0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22	mermes		34,289				34,289	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,060

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2	reforços			1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3				1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4				1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5				2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6				2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7				1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	mermes		35,237				35,237	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 739,972

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P45C2-Y1J8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,509

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	P4ZF-M08I150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

TOTAL AMIDAMENT **11,050**

9 P9A1-CV01 m3 Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,124**

10 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10 LOCALITZACIO9
Subcapítol 02 PLATAFORMA MITJA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P4Z9-3LXI m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,240**

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	24,000	1,932	C#*D#*E#*F#
3				0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	mermes		21,983				21,983	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **461,647**

3 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2								C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	mermes		28,350				28,350	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT **595,350**

4 P45C2-YIJ8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.5, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,571**

5 P4ZF-M081150 u Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 P9E1-CV01 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

7 P001-0003 u Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10 LOCALITZACIO9
Subcapítol 03 PLATAFORMA DRETA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P4Z9-3LXI m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,200	0,200		6,000	0,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,240**

2 P447-CV11 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xapa perímetre 150x8 mm a 170x8 mm		0,014	16,200	785,000	1,000	178,038	C#*D#*E#*F#
2	connector Ø6			0,350	0,230	21,000	1,691	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			0,350	0,230	8,000	0,644	C#*D#*E#*F#	
4	unió vorera e= 10 mm		3,300	0,010	7.850,000	1,000	259,050	C#*D#*E#*F#
5	marcs U fixacions e=4 mm		0,400	0,004	7.850,000	1,000	12,560	C#*D#*E#*F#
6			0,370	0,004	7.850,000	2,000	23,236	C#*D#*E#*F#
7			0,280	0,004	7.850,000	1,000	8,792	C#*D#*E#*F#
8			0,310	0,004	7.850,000	2,000	19,468	C#*D#*E#*F#
9	Ø6 potes marcs U		0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#	
10			0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#	
11			0,300	0,230	8,000	0,552	C#*D#*E#*F#	
12			0,300	0,230	16,000	1,104	C#*D#*E#*F#	
13	plaques base fixacions		0,300	0,015	7.850,000	1,000	35,325	C#*D#*E#*F#
14			0,200	0,015	7.850,000	2,000	47,100	C#*D#*E#*F#
15			0,050	0,015	7.850,000	6,000	35,325	C#*D#*E#*F#
16	planxer sup e=4 mm		0,450	0,004	7.850,000	1,000	14,130	C#*D#*E#*F#
17			0,400	0,004	7.850,000	2,000	25,120	C#*D#*E#*F#
18			0,200	0,004	7.850,000	1,000	6,280	C#*D#*E#*F#
19			0,250	0,004	7.850,000	2,000	15,700	C#*D#*E#*F#
20							C#*D#*E#*F#	
21							C#*D#*E#*F#	
22	mernes		34,289				34,289	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							720,060	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	P4B8-D6QK kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2						
1	base		12,600		45,000	1,000	567,000	C#*D#*E#*F#
2	reforços			1,600	1,630	16,000	41,728	C#*D#*E#*F#
3				1,500	1,630	8,000	19,560	C#*D#*E#*F#
4				1,350	1,630	6,000	13,203	C#*D#*E#*F#
5				2,050	1,630	8,000	26,732	C#*D#*E#*F#
6				2,800	1,630	4,000	18,256	C#*D#*E#*F#
7				1,400	1,630	8,000	18,256	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	mernes		35,237				35,237	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							739,972	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	P4Z6-CV12 u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.						
1						8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	P4Z6-CV16 u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.						
1						38,000	38,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
TOTAL AMIDAMENT							38,000	
6	P45C2-YIJ8 m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot						
1			4,850		0,135	1,000	0,655	C#*D#*E#*F#
2			7,450		0,123	1,000	0,916	C#*D#*E#*F#
3	zones fixacions		0,400		0,040	-1,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
4			0,300		0,040	-2,000	-0,024	C#*D#*E#*F#
5			0,150		0,040	-1,000	-0,006	C#*D#*E#*F#
6			0,200		0,040	-2,000	-0,016	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,509	
7	P4ZF-M081150 u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla rosada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.						
1						12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
8	P9E1-CV01 m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland						
1			12,600			1,000	12,600	C#*D#*E#*F#
2	zones fixacions		0,400			-1,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
3			0,300			-2,000	-0,600	C#*D#*E#*F#
4			0,150			-1,000	-0,150	C#*D#*E#*F#
5			0,200			-2,000	-0,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,050	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
9	P9A1-CV01 m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals						
1	zones fixacions		0,400		0,080	1,000	0,032	C#*D#*E#*F#
2			0,300		0,080	2,000	0,048	C#*D#*E#*F#
3			0,150		0,080	1,000	0,012	C#*D#*E#*F#
4			0,200		0,080	2,000	0,032	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,124	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
10	P001-0003 u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja						
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 11 ALTRES

EUR

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQUP-0001	u	Transport i instal·lació de mòdul prefabricat de plataforma de parada de bus de 6m de longitud i amplada compresa entre 1,5m i 3m, sobre lamines de cauxú, correctament anivellat amb la calçada i la vorera.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Localitzacio 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Localitzacio 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Localitzacio 3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Localitzacio 4		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Localitzacio 5		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Localitzacio 6		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Localitzacio 7		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Localitzacio 8		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Localitzacio 9		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	PQ47-SSKG	u	Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000	1,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	P000-0001	PAJ	Partida alçada de seguretat i salut				
---	-----------	-----	-------------------------------------	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE

4	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE

5	F0010001	u	Instal·lació de marquesina bus model AMB sobre plataforma prefabricada totalment ancorada, anivellada i acabada. El subministrament de la marquesina no està inclòs.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE

6	P001-0002	u	Realització del motlle per l'execució de les plataformes, incloent totes les feines per la seva elaboració, manteniment durant l'execució del contracte i transports necessaris.				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE

Pressupost

Quadre de preus nº1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/02/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F0010001	u	Instal·lació de marquesina bus model AMB sobre plataforma prefabricada totalment ancorada, anivellada i acabada. El subministrament de la marquesina no està inclòs. (CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	552,43 €
P-2	P000-0001	PAJ	Partida alçada de seguretat i salut (TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3.528,76 €
P-3	P000-0005	u	Desmuntatge plataforma parada autobus de qualsevol tipus i mida (de tots els seus moduls) i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, i transport a magatzem municipal o a un altre ubicació del municipi. En cas de no reutilització, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat. (SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	604,73 €
P-4	P001-0002	u	Realització del motlle per l'execució de les plataformes, incloent totes les feines per la seva elaboració, manteniment durant l'execució del contracte i transports necessaris. (SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS)	6.783,00 €
P-5	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	773,50 €
P-6	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	20,51 €
P-7	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	52,24 €
P-8	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (TRENTE-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	34,18 €
P-9	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	7,18 €
P-10	P45C2-YIJB	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	187,07 €
P-11	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2,41 €
P-12	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	26,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/02/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (TRENTE EUROS AMB TRENTE-TRES CÈNTIMS)	30,33 €
P-14	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTE-DOS CÈNTIMS)	192,32 €
P-15	P4ZF-M08I150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscaada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	12,46 €
P-16	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	358,86 €
P-17	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	60,14 €
P-18	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTE-UN CÈNTIMS)	1.444,31 €
P-19	PQ47-SSKG	u	Piona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	84,23 €
P-20	PQUP-0001	u	Transport i instal·lació de mòdul prefabricat de plataforma de parada de bus de 6m de longitud i amplada compresa entre 1,5m i 3m, sobre lamine de cautxú, correctament anivellat amb la calçada i la vorera. (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	397,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 03/02/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Pressupost

Quadre de preus nºII

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/02/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F0010001	u	Instal·lació de marquesina bus model AMB sobre plataforma prefabricada totalment ancorada, anivellada i acabada. El subministrament de la marquesina no està inclòs. Altres conceptes	552,43 € 552,43000 €
P-2	P000-0001	PAJ	Partida alçada de seguretat i salut Sense descomposició	3.528,76 € 3.528,76000 €
P-3	P000-0005	u	Desmuntatge plataforma parada autobus de qualsevol tipus i mida (de tots els seus mòduls) i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, i transport a magatzem municipal o a un altre ubicació del municipi. En cas de no reutilització, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat. Altres conceptes	604,73 € 604,73000 €
P-4	P001-0002	u	Realització del motlle per l'execució de les plataformes, incloent totes les feines per la seva elaboració, manteniment durant l'execució del contracte i transports necessaris. Sense descomposició	6.783,00 € 6.783,00000 €
P-5	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja Sense descomposició	773,50 € 773,50000 €
P-6	P21Q2-8GX	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	20,51 € 20,51000 €
P-7	P21Q2-8GX	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	52,24 € 52,24000 €
P-8	P21Q2-8GX	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	34,18 € 34,18000 €
P-9	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF.	7,18 €
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,26000 €
	B000-CV01	u	Elements auxiliars Altres conceptes	0,89250 € 4,02750 €
P-10	P45C2-YIj8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidrófug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot	187,07 €
	B06F7-IFZD	m3	Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidrófug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 Altres conceptes	140,91300 € 46,15700 €
P-11	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/02/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm Altres conceptes	0,02988 € 2,38012 €
P-12	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.	26,76 €
	B0AB-CV12	u	Subministrament i muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent.	7,62000 €
	B0AD-2ICM	u	Pern de connexió tipus Nelson de 1/2'' de diàmetre, per a planxes col·laborants	0,63000 €
	B0AD-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent.	9,33000 €
	B000-CV01	u	Elements auxiliars Altres conceptes	2,38000 € 6,80000 €
P-13	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial.	30,33 €
	B0AD-2ICM	u	Pern de connexió tipus Nelson de 1/2'' de diàmetre, per a planxes col·laborants	0,63000 €
	B000-CV01	u	Elements auxiliars	2,38000 €
	B0AD-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent	11,90000 €
	B0AB-CV16	u	Subministrament i muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent. Altres conceptes	8,45000 € 6,97000 €
P-14	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir	192,32 €
	B7Z1-0GKX	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix Altres conceptes	148,60380 € 43,71620 €
P-15	P4ZF-M081I	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF.	12,46 €
	B0B-M08I-150	u	Barilla roscada d'acer inoxidable tipus HAS-A4 de M8 i 150mm de llarg de hilti o equivalent, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs segons especificacions de la casa subministradora.	3,05000 €
	B090-CV02	dm3	Resina HIT-RE 500V4 de hilti o equivalent	3,33200 €
	B000-CV01	u	Elements auxiliars Altres conceptes	0,47600 € 5,60200 €
P-16	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodó, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals	358,86 €
	B000-CV01	u	Elements auxiliars	1,19000 €
	B03L-CV01	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila Altres conceptes	196,35000 € 161,32000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/02/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-17	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland	60,14	€
	B9E2-CV01	m2	Panot gris de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior	12,26040	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00243	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,53646	€
			Altres conceptes	47,34071	€
P-18	PBAM-HXU	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual	1.444,31	€
	BBA0-HOPP	kg	Micropartícules amb cantells angulars de vidre en pols	48,00000	€
	BBA0-0SD6	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	49,72500	€
	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	272,34000	€
			Altres conceptes	1.074,24500	€
P-19	PQ47-SSKG	u	Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	84,23	€
	BQ47-HR7U	u	Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta reflectant, per a col·locar encastada al paviment	28,98000	€
	B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	5,92000	€
			Altres conceptes	49,33000	€
P-20	PQUP-0001	u	Transport i instal·lació de mòdul prefabricat de plataforma de parada de bus de 6m de longitud i amplada compresa entre 1,5m i 3m, sobre lamines de cautxú, correctament anivellat amb la calçada i la vorera.	397,48	€
			Altres conceptes	397,48000	€

Pressupost

Pressupost

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 7)	52,24	9,000	470,16
2	P21Q2-8GXU	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 8)	34,18	9,000	307,62
3	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 6)	20,51	9,000	184,59
4	P000-0005	u	Desmuntatge plataforma parada autobus de qualsevol tipus i mida (de tots els seus moduls) i demolició d'ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, i transport a magatzem municipal o a un altre ubicació del municipi. En cas de no reutilització, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat. (P - 3)	604,73	9,000	5.442,57
TOTAL	Capítol	01.01			6.404,94	

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 12)	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 13)	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol	01.02.03			10.280,50	

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	03	localitzacio2
Subcapítol	02	Plataforma mitja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol		01.03.02			6.770,25

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	03	localitzacio2
Subcapítol	03	Plataforma dreta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	739,972	1.783,33

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 12)	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 13)	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol		01.03.03			10.280,50

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	04	localitzacio3
Subcapítol	01	Plataforma esquerra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	6.770,25
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	04	localitzacio3
Subcapítol	02	Plataforma mitja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.04.02	6.770,25
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	04	localitzacio3
Subcapítol	03	Plataforma dreta

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 12)	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 13)	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodó, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.04.03	10.280,50
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	05	localitzacio4
Subcapítol	01	Plataforma esquerra

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol		01.05.01			6.770,25
Obra		01	Pressupost 01			
Capítol		05	localitzacio4			
Subcapítol		02	Plataforma mitja			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol		01.05.02			6.770,25
Obra		01	Pressupost 01			
Capítol		05	localitzacio4			
Subcapítol		03	Plataforma dreta			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 12)	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 13)	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.05.03				10.280,50
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	06	localitzacio5
Subcapítol	01	Plataforma esquerra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.06.01				6.770,25
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	06	localitzacio5
Subcapítol	02	Plataforma mitja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.06.02				6.770,25
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	06	localitzacio5
Subcapítol	03	Plataforma dreta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 12)	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa	30,33	38,000	1.152,54

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

		de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 13)				
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.06.03	10.280,50
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	07	localització6
Subcapítol	01	Plataforma esquerra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

		pòrtland (P - 17)				
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.07.01	6.770,25
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	07	localització6
Subcapítol	02	Plataforma mitja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.07.02	6.770,25
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	07	localització6
Subcapítol	03	Plataforma dreta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o	7,18	720,060	5.170,03

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
3	P4B8-D6QK	kg	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol		01.07.03		10.280,50

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	08	localitzacio7
Subcapítol	02	Plataforma mitja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4Z9-3LXI	m2	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	7,18	461,647	3.314,63

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

3	P4B8-D6QK	kg	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol		01.08.02		6.770,25
--------------	-------------------	--	-----------------	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	08	localitzacio7
Subcapítol	03	Plataforma dreta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4Z9-3LXI	m2	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	187,07	1,509	282,29

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 15

7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.08.03	10.280,50
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	09	localització8
Subcapítol	02	Plataforma mitja

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.09.02	6.770,25
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
------	----	---------------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 16

Capítol	09	localització8
Subcapítol	03	Plataforma dreta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 12)	26,76	8,000	214,08
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 13)	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50

TOTAL	Subcapítol	01.09.03	10.280,50
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	10	localització9
Subcapítol	02	Plataforma mitja

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	461,647	3.314,63
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	595,350	1.434,79
4	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,571	293,89
5	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
6	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	12,600	757,76
7	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol		01.10.02		6.770,25	

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	10	localitzacio9
Subcapítol	03	Plataforma dreta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4Z9-3LXI	m2	Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (P - 14)	192,32	0,240	46,16
2	P447-CV11	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, per a estructures segons projecte, col·locat a obra cargolat i amb soldadura, treballat a taller amb categoria d'execució EXC2, amb una capa d'imprimació antioxidant, amb repercussió de preparació de forats troncocònics, arestes per penetració de soldadures, soldat de plaques d'unió i/o enrigidors i altres manipulacions previes per al seu correcte muntatge, repàs de la protecció antioxidant cremada amb el procés de soldat, amb part proporcional de sistemes d'elevació i altres mitjans auxiliars, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls i indicacions dels plànols i instruccions de la DF. (P - 9)	7,18	720,060	5.170,03
3	P4B8-D6QK	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)	2,41	739,972	1.783,33
4	P4Z6-CV12	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M12 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-112 i coixinet cònic 07420-212 de Norelem	26,76	8,000	214,08

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
5	P4Z6-CV16	u	Subministrament i muntatge de pern de fixació DEMU FIX M16 de 75mm de longitud de Halfen o equivalent, instal·lat embegut en llosa de formigó lligat a armat de reforç previ al formigonat, amb muntatge de volandera cònica 07420-116 i coixinet cònic 07420-216 de Norelem o equivalent, amb repercussió de mitjans auxiliars per a la seva correcta execució, tot inclòs segons detall de projecte, indicacions de la DF i especificacions de la casa comercial. (P - 12)	30,33	38,000	1.152,54
6	P45C2-YIJ8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 10)	187,07	1,509	282,29
7	P4ZF-M081150	u	Ancoratge sobre element de formigó amb barilla roscada d'acer inoxidable M8 de 150 mm de llarg tipus HAS-A4 de Hilti o equivalent, amb perforació de 10 cm i injectat continu d'adhesiu RE-500V4 de Hilti o equivalent previa neteja del forat, cargolada, amb repercussió de volandera metàl·lica i femelles, tot inclòs per a la seva correcta execució segons detalls de projecte, especificacions de la casa subministradora i instruccions de la DF. (P - 15)	12,46	12,000	149,52
8	P9E1-CV01	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 9 pastilles de 20x20x3 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 1 cm de morter amb additiu, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 17)	60,14	11,050	664,55
9	P9A1-CV01	m3	Reblert d'espais entre paviments amb sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodó, estesa i anivellament del material amb mitjans manuals (P - 16)	358,86	0,124	44,50
10	P001-0003	u	Preparació del motlle per l'execució del mòdul de plataforma, incloent totes les feines, i la posterior neteja (P - 5)	773,50	1,000	773,50
TOTAL	Subcapítol		01.10.03		10.280,50	

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	11	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQUP-0001	u	Transport i instal·lació de mòdul prefabricat de plataforma de parada de bus de 6m de longitud i amplada compresa entre 1,5m i 3m, sobre lamines de cautxú, correctament anivellat amb la calçada i la vorera. (P - 20)	397,48	22,000	8.744,56
2	PQ47-SSKG	u	Pilona de poliuretà de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçària aparent amb cinta reflectant, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u (P - 19)	84,23	9,000	758,07
3	P000-0001	PAJ	Partida alçada de seguretat i salut (P - 2)	3.528,76	1,000	3.528,76
4	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retroreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 18)	1.444,31	2,000	2.888,62
5	F0010001	u	Instal·lació de marquesina bus model AMB sobre plataforma prefabricada totalment ancorada, anivellada i acabada. El subministrament de la marquesina no està inclòs. (P - 1)	552,43	9,000	4.971,87
6	P001-0002	u	Realització del motlle per l'execució de les plataformes, incloent totes les feines per la seva elaboració, manteniment durant l'execució del contracte i transports necessaris. (P - 4)	6.783,00	1,000	6.783,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 19

TOTAL	Capítol	01.11	27.674,88
-------	---------	-------	-----------

Pressupost

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Subcapitol			Import
Subcapitol	01.02.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.02.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.02	localitzacio1	17.050,75
Subcapitol	01.03.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.03.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.03	localitzacio2	17.050,75
Subcapitol	01.04.01	Plataforma esquerra	6.770,25
Subcapitol	01.04.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.04.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.04	localitzacio3	23.821,00
Subcapitol	01.05.01	Plataforma esquerra	6.770,25
Subcapitol	01.05.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.05.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.05	localitzacio4	23.821,00
Subcapitol	01.06.01	Plataforma esquerra	6.770,25
Subcapitol	01.06.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.06.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.06	localitzacio5	23.821,00
Subcapitol	01.07.01	Plataforma esquerra	6.770,25
Subcapitol	01.07.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.07.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.07	localitzacio6	23.821,00
Subcapitol	01.08.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.08.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.08	localitzacio7	17.050,75
Subcapitol	01.09.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.09.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.09	localitzacio8	17.050,75
Subcapitol	01.10.02	Plataforma mitja	6.770,25
Subcapitol	01.10.03	Plataforma dreta	10.280,50
Capítol	01.10	localitzacio9	17.050,75
			180.537,75

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Treballs previs	6.404,94
Capítol	01.02	localitzacio1	17.050,75
Capítol	01.03	localitzacio2	17.050,75
Capítol	01.04	localitzacio3	23.821,00
Capítol	01.05	localitzacio4	23.821,00
Capítol	01.06	localitzacio5	23.821,00
Capítol	01.07	localitzacio6	23.821,00
Capítol	01.08	localitzacio7	17.050,75
Capítol	01.09	localitzacio8	17.050,75
Capítol	01.10	localitzacio9	17.050,75
Capítol	01.11	Altres	27.674,88
Obra	01	Pressupost 01	214.617,57
			214.617,57

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 01	214.617,57
			214.617,57

Pressupost

Últim full

Subministrament de plataformes de bus a El Prat de Llobregat: millora de l'accessibilitat i la confo

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 214.617,57

Subtotal 214.617,57

21 % IVA SOBRE 214.617,57..... 45.069,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 259.687,26

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

L'autor del projecte:
