



Diputació Tarragona

Enginyeria Municipal



ANNEX

Annex interpretatiu de l'estat de les obres executades de “Projecte de pas peatonal del carrer de l'Era a Vilanova de Prades”

Sol·licitant
Vilanova de Prades (Conca de Barberà)

Data
Octubre 2026

Expedient: 8004330008-2025-0024293
Clau: 2025-0024293

Redacció: Enginyeria Municipal

ÍNDEX

1.- ANTECEDENTS.....	2
2.- OBJECTE DE L'ANNEX.....	2
3.- PROJECTE ORIGINAL.....	2
4.- ESTAT ACTUAL DE LES OBRES, DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS EXECUTADES I DE LES PENDENTS D'EXECUTAR.....	4
5.- DESCRIPCIÓ DE PARTIDES NOVES PER NECESSITATS DETECTADES.....	7
6.- NOU PRESSUPOST ACTUALITZAT PER LICITAR.....	8

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputació de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 65BDF67C17354D4297BF360040AA12A8 i data d'emissió 15/10/2026 a les 08:48:47

1.- ANTECEDENTS.

En data de febrer de 2026 es va formalitzar el contracte d'obres entre l'Ajuntament de Vilanova de Prades, en qualitat de promotor, i l'empresa adjudicatària per a l'execució de les obres corresponents al "Projecte de pas peatonal del carrer de l'Era a Vilanova de Prades".

En data 23 de març de 2026 es va subscriure l'acta de comprovació del replantejament i es van iniciar els treballs.

Posteriorment, en agost de 2026, es va tramitar la resolució del contracte, quedant l'obra parcialment executada i pendent de finalització


2.- OBJECTE DE L'ANNEX.

El present annex té per objecte determinar l'estat real d'execució de les obres, identificar les unitats executades i certificades, definir les actuacions pendents de realització i incorporar les necessitats complementàries detectades durant l'execució. Igualment constitueix la base tècnica per definir l'abast d'una futura licitació destinada a completar l'actuació

3.- PROJECTE ORIGINAL.


L'objectiu del "Projecte de pas peatonal del carrer de l'Era a Vilanova de Prades" és executar l'allargament del carrer de l'Era cap a l'oest del municipi i unint-lo amb el carrer de la Llaunera.

Aquesta ampliació serà un vial peatonal d'una llargada aproximada de 35 metres; i una amplada mínima de 2,30 metres. L'amplada del vial s'anirà adaptant a la geometria de la roca existent, ampliant o reduint el vial segons l'amplada disponible.

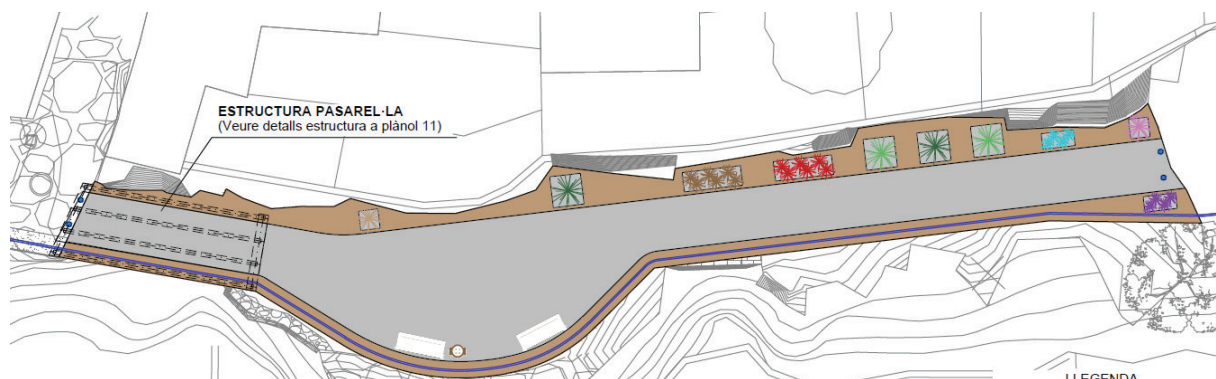


La zona més estreta de l'ampliació del carrer de l'Era es troba a l'extrem oest (a l'esquerra a la imatge anterior). L'amplada màxima del carrer de la Llaunera en el PK +0 és de 2,32 m.

Tal com es pot apreciar en la següent imatge, amb la superposició entre estat actual i, en blau, l'estat projectat; l'amplada de la roca és d'aproximadament 1,6 metres (entre PK +0 i PK +5) i no és possible que el vial es recolzi sobre la roca.

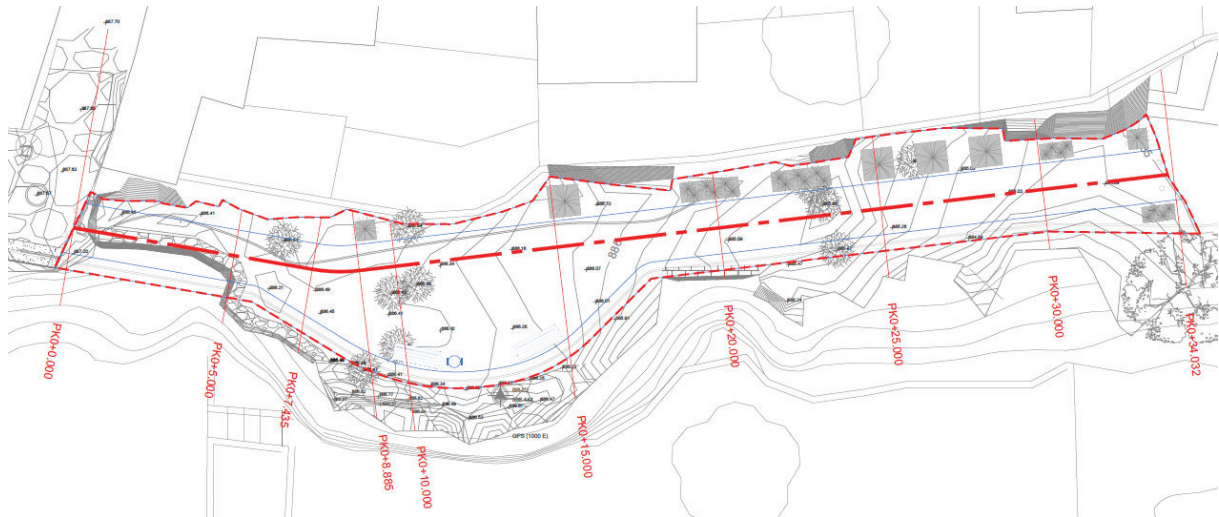

Per tot l'anterior, entre el PK +0 i el PK+5 s'ha dissenyat l'ampliació del carrer de l'Era sobre una passarel·la d'uns 6 metres de longitud. A la següent imatge s'aprecia la secció de la passarel·la i a l'apartat 6.3 d'aquest document s'ampliarà la informació estructural d'aquesta:

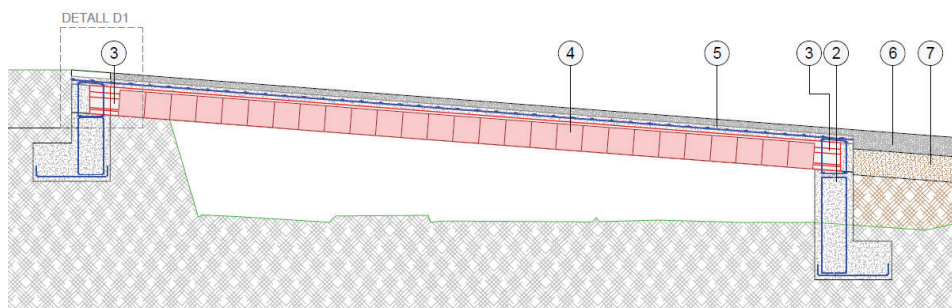

En resum, les obres i instal·lacions a realitzar i que queden contemplades en el "Projecte de pas peatonal del carrer de l'Era a Vilanova de Prades", són les següents:

- Enderrocs i neteja de vegetació.
- Formació de l'esplanada del tram de carrer a executar; amb recrescut de terres sobre el terreny existent.
- Estructura portant, tipus passarel·la, a l'extrem oest de l'àmbit d'actuació.
- Pavimentació formada per sub-base de tot-ú amb llosa de formigó; i aplacat de pedra en les franges perimetrals.
- Instal·lació d'enllumenat públic en el tram a executar.
- Instal·lació de baranes de protecció a tot l'àmbit, amb ampliació de la barana uns 25 metres al carrer de la Llaunera per l'oest i d'uns 2 metres a l'est pel carrer de l'Era.
- Col·locació de mobiliari urbà, paperera i diverses jardineres amb flors i arbrat de baix manteniment.

El pressupost original del projecte és el següent:

Capítol	Import
1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	5.643,00
2 PAVIMENTACIÓ	46.560,30
3 ESTRUCTURA	7.078,12
4 ENLLUMENAT PÚBLIC	8.912,19
5 JARDINERIA	1.790,41
6 SEGURETAT I SALUT	4.500,00
7 IMPREVISTOS	9.000,00
Pressupost d'execució material	83.484,02
13% de despeses generals	10.852,92
6% de benefici industrial	5.009,04
Suma	99.345,98
21% IVA	20.862,66
Pressupost d'execució per contracta	120.208,64

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT VINT MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS.

4.- ESTAT ACTUAL DE LES OBRES, DESCRIPCIÓ DE LES UNITATS EXECUTADES I DE LES PENDENTS D'EXECUTAR.

De l'anàlisi de la documentació d'obra, certificacions emeses i inspecció de l'estat actual dels treballs, es constata que l'actuació va quedar parcialment executada. Existeixen unitats completament executades, unitats parcialment executades i unitats no iniciades. Les unitats executades han de ser descomptades del projecte original a efectes de determinar les necessitats reals pendents.

Les unitats executades en l'obra realitzada corresponen a:

- Enderrocs i moviment de terres:
S'ha realitzat les feines d'esbrossada del terreny i moviment de terres fins a l'explanada de la caixa del carrer. Així mateix, també s'ha fet part de l'excavació necessària pel fonament de l'estructura de la passarel·la.
- Pavimentació:
S'ha deixat estesa la capa base de tot_ú del ferm de la caixa del carrer.
- Enllumenat:
S'ha fet la canalització, la instal·lació del tub de PE i la xarxa de terra (cable de coure i piques)
- Seguretat i salut:
S'ha certificat un 20 % de l'import destinat a seguretat i salut.

La resta d'unitats i, en algun cas, resta d'amidament d'unitat executada queda per realitzar sent necessàries per assolir la funcionalitat completa prevista en el projecte, incloent paviments definitius, elements de protecció, acabats, instal·lacions, reposicions, etc.

A continuació, es grafia un quadre comparatiu de les partides del pressupost original respecte a la certificació executada en l'obra, subllant en verd les partides amb la medició executada (amidament/preu/import certificat en blau).

Descripció				Pressupost			Certificació		
Codi	Nat	Ud	Resum	CanPres	Pres	ImpPres	CanCert	Cert	ImpCert
1	Capítol		ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES						
P214W-FEMD	Partida	m	Tall paviment form. h>=15cm	94,00	10,19	957,86	62,00	10,19	631,78
P214S-73G5	Partida	m	Enderroc reixat, altura de fins a 2m, amb càrrega, transport i deposició	16,50	10,91	180,02	3,00	10,91	32,73
P2146-HYPH	Partida	m2	Demolició paviment formigó gruix de fins a 15cm, manual	2,70	66,42	179,33	13,05	66,42	866,78
P2R6-4I5S	Partida	m3	Càrrega manual residus inerts o no especials instal·lació de gestió residus, contenidor 8m3	0,49	56,46	27,67	0,00	56,46	0,00
P2RA-IQFK	Partida	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat, residus form. inerts, 1,45t/m3, LER 17 01 01	0,49	19,60	9,60	0,00	19,50	0,00
F22113L2	Partida	m2	Neteja i esbrossada terreny	130,00	3,19	414,70	120,50	3,19	384,40
P221B-I00L	Partida	m3	Excavació en roca, altura fins a 2m, de 0.2 a 2m3	5,51	155,13	854,77	5,51	155,13	854,77
P2217-55T8	Partida	m3	Excavació per rebaix, terreny compacte(SPT 20-50)	6,67	6,34	42,29	6,03	6,34	38,23
P2R4-IZ52	Partida	m3	Càrrega manuals i transport de terres no contaminades, instal·lació de gestió residus, contenidor 9m3	14,62	56,72	829,25	13,85	56,72	785,57
P2RB-HG0V	Partida	m3	Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	14,62	11,82	172,81	0,00	11,82	0,00
P2241-52SM	Partida	m2	Repàs+picon.esplanada,95%PM	130,00	2,39	310,70	120,50	2,39	288,00
P21R0-92HA	Partida	u	Eliminació d'arbre directa arbre d'altura inferior a 6m port petit amb arrencant la soca	10,00	166,40	1.664,00	10,00	166,40	1.664,00
Total 1						5.643,00			5.546,26
2	Capítol		PAVIMENTACIÓ						
P2252-549L	Partida	m3	Estesa i piconatge sòl adequat aportació, g<=25cm, 95%PM, corró, humectació	9,92	31,32	310,69	9,64	31,32	301,92
P2252-549G	Partida	m3	Estesa i piconatge tot-u artificial aportació, g<=25cm, 95%PM, corró, humectació	24,00	65,65	1.575,60	12,05	65,65	791,08
P9G7-9LSG	Partida	m3	Paviment gruix fins a 20cm formigó amb fibres de vidre HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4	22,79	257,03	5.857,71	0,00	257,03	0,00
P9BA-I6UC	Partida	m2	Paviment pedra calcària nacional serrada, g=40mm aresta viva, entorn urbà dificultat de mobilitat, voreres a<= 3m	53,00	179,63	9.520,39	0,00	179,63	0,00
PQ43-HA7F	Partida	u	Pilona fosa protecció antioxidant i pintura de color negre forja h=1000mm a=95mm,col.dau form.	4,00	172,85	691,40	0,00	172,85	0,00
UBENUM304NFSC	Partida	u	Banc NEOBARCINO 1800 natural FSC de Benito o equivalent	2,00	1.032,60	2.065,20	0,00	1.032,60	0,00
UBENPA606	Partida	u	Paperera BCN 70 litres de Benito o equivalent	1,00	411,69	411,69	0,00	411,69	0,00
UBENUM1640-1PR	Partida	u	Jardinera ReBnew 1800x600x480 mm, polímer reciclat	2,00	1.032,61	2.065,22	0,00	1.032,61	0,00
UBENUM1640-2PR	Partida	u	Jardinera ReBnew 2, 1000x480x480 mm, polímer reciclat	2,00	663,13	1.326,26	0,00	663,13	0,00
UBENUM1640-4PR	Partida	u	Jardinera ReBnew 4, 950x950x720 mm, polímer reciclat	4,00	1.175,11	4.700,44	0,00	1.175,11	0,00
UBENUM1640-5PR	Partida	u	Jardinera ReBnew 5, 600x600x480 mm, polímer reciclat	2,00	621,70	1.243,40	0,00	621,70	0,00
PB13-61TX	Partida	m	Barana d'acer per pintar amb muntant cada 100cm, brèndoles cada 10cm, h=110 cm a 140 cm, pintada	70,00	239,89	16.792,30	0,00	239,89	0,00

Total 2				46.560,30			1.093,00		
3	Capítol	ESTRUCTURA							
P4520-IAWY	Partida	m3	Formigó per mur, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.55,bomba	2,05	370,57	759,67	0,00	370,57	0,00
P4BC-43MX	Partida	kg	Armadura p/mur AP500SD barres corrug.	187,26	3,03	567,40	0,00	3,03	0,00
P4DG-3XPD	Partida	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler pi,p/mur rect.,encofr.1 cara, per estructures en alçada	10,75	200,70	2.157,53	0,00	200,70	0,00
P459B-10ZMY	Partida	m2	Sostre nervat unidireccional de 22+6 cm amb bigueta auto-resistent	18,00	199,64	3.593,52	0,00	199,64	0,00
Total 3				7.078,12			0,00		
4	Capítol	ENLLUMENAT PÚBLIC							
FG310015	Partida	m	Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm	59,00	6,78	400,02	0,00	6,78	0,00
FDG50210	Partida	m	Canalització enllumenat, PE D90mm	59,00	13,81	814,79	58,99	13,81	814,65
FHM10030x	Partida	u	Columna de 3 m amb lluminària Model Ochocentista de Salvi o equivalent	3,00	1.694,43	5.083,29	0,00	1.694,43	0,00
FG380020	Partida	m	Cable nu Cu 35mm2,enllum.	59,00	5,79	341,61	58,99	5,79	341,55
TEN01006	Partida	u	Piqueta/placa de presa de terra L=2 m	3,00	65,19	195,57	3,00	65,19	195,57
EP1012	Partida	u	Troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària; amb tapa i bastiment de fosa dúctil 40x40 cm, classe C-250 amb	2,00	250,31	500,62	0,00	250,31	0,00
FGZZE0030	Partida	u	Projecte de legalització fins 10 kW d'enllumenat públic	1,00	1.454,32	1.454,32	0,00	1.454,32	0,00
conexio	Partida	u	Connexió a punt de llum existent	1,00	121,97	121,97	0,00	121,97	0,00
Total 4				8.912,19			1.351,77		
5	Capítol	JARDINERIA							
PR60-8YHD	Partida	u	Plantació d'arbre planifoli, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària, pa terra/contenedor, substitució 100% de terra	4,00	67,13	268,52	0,00	67,13	0,00
PR61-8ZIT	Partida	u	Plantació arbust/arbre petit, cont.=1.5 a 3l, substitució 100% de terra per sorra rentada i compost	24,00	13,03	312,72	0,00	13,03	0,00
PR36-8RV7	Partida	m3	Terra vegetal jardineria categoria alta, sacs 0,8m3, escampada manual	3,69	189,14	697,93	0,00	189,14	0,00
PR45A-8XNR	Partida	u	Subministrament Tília tomentosa perímetre de 12 a 14cm, pa terra	2,00	127,21	254,42	0,00	127,21	0,00
PR45B-8XSF	Partida	u	Subministrament Tipuana tipu (T. speciosa) perímetre de 12 a 14cm, pa terra	2,00	69,09	138,18	0,00	69,09	0,00
PR49H-92SS	Partida	u	Subministrament Anthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l	6,00	3,55	21,30	0,00	3,55	0,00
PR4B6-947L	Partida	u	Subministrament Centranthus ruber h=30 a 40cm,en contenidor 3l	2,00	6,68	13,36	0,00	6,68	0,00
PR4DG-93FV	Partida	u	Subministrament Gaura lindheimeri h=20 a 30cm, en contenidor 1,3l	4,00	4,14	16,56	0,00	4,14	0,00
FR4H3G41	Partida	u	Subministrament Rosmarinus officin.Prostratus en contenidor 3l	2,00	5,20	10,40	0,00	5,20	0,00
PR4EC-94MI	Partida	u	Subministrament Lavandula dentata en contenidor 3l	6,00	5,45	32,70	0,00	5,45	0,00
PR4JF-950P	Partida	u	Subministrament Verbena officinalis test 11cm	4,00	6,08	24,32	0,00	6,08	0,00
Total 5				1.790,41			0,00		


6	Capítol	SEGURETAT I SALUT						
SIS	Partida u	Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut.	1,00	4.500,00	4.500,00	0,20	4.500,00	900,00
		Total 6			4.500,00			900,00
7	Capítol	IMPREVISTOS						
IMPR	Partida u	Imprevistos	1,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		Total 7			9.000,00			0,00
		Total Pressupost / Certificació (PEM)			83.484,02			8.891,03

L'import del pressupost d'execució material (PEM) original és de 83.484,02 €, mentre que l'import de la certificació d'execució material (PEM) és de 8.891,03 €, amb el que el percentatge d'obra executada és d'un 10,65 %.

5.- DESCRIPCIÓ DE PARTIDES NOVES PER NECESSITATS DETECTADES.

Durant el desenvolupament de les obres es va observar que la configuració real del terreny generava un risc potencial de despreniment del material granular de base de tot-u cap a la finca confrontant. Per aquest motiu es considera tècnicament necessari incorporar un mur de contenció aproximat de 25 metres lineals i així garantir l'estabilitat i la seguretat de la infraestructura.

En la següent imatge es dibuixa la ubicació d'aquest mur de contenció

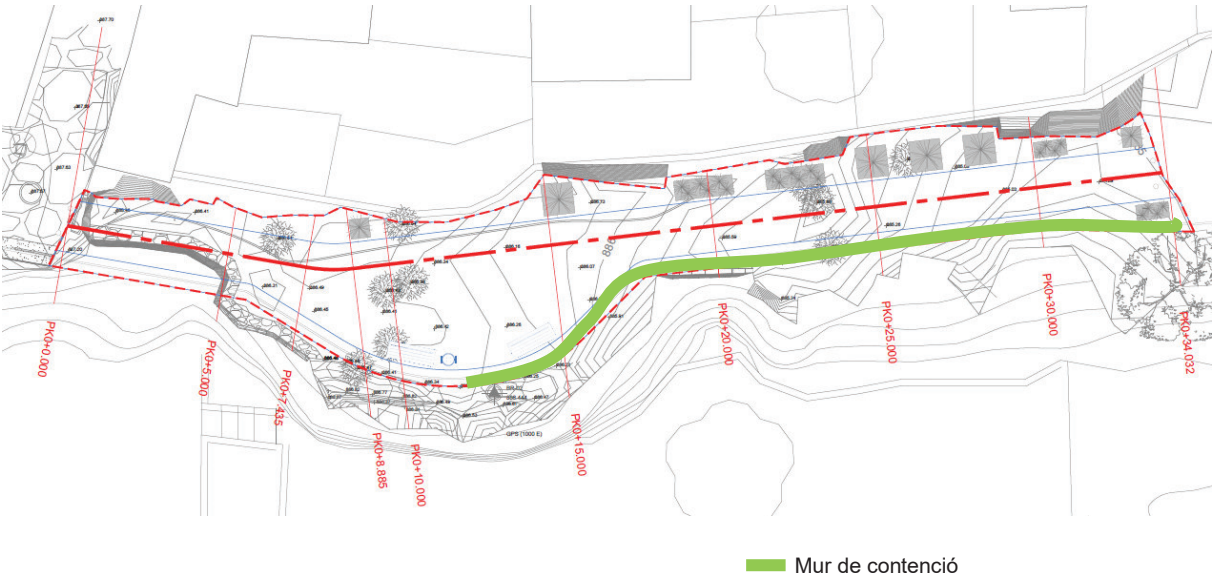

Aquesta nova unitat d'obra s'incorporarà en el nou pressupost per licitar:

MURCONT0		m	Mur de contenció de bloc de formigó armat		
			Mur de contenció de 20 a 60 cm d'alçada per contenir la base de tot-ú. Esta formada per peces de bloc de formigó de 40x20 cm, formigonades interiorment i armades amb barres de ferro de diàmetre 10 mm, les barres verticals cada 40 cm i amb barra horitzontal d'unió. Les barres de ferro es clavaràn al terra amb una profunditat mínima de 80 cm. Inclou l'excavació i piconatge, anivellació, part proporcional de peces especials i tallis.		
A01-FEP0	0,042000	h	Ajudant ferrallista	34,43	1,45
A0F-000I	0,040000	h	Oficial 1a ferrallista	38,58	1,54
B0AM-078F	0,012000	kg	Filferro recuit, D=1,3mm	3,33	0,04
B0B6-107I	2,330000	kg	Acer b/corruug.obra man.taller B500SD	2,01	4,68
A0D-0007	0,727000	h	Manobre	30,95	22,50
A0F-000B	0,727000	h	Oficial 1a	38,58	28,05
B06F2-I122	0,336000	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6	108,22	36,36
B351-TSTC	6,000000	u	Bloc prefabricat formigó ,c.vista,gris,40x20x20 cm	3,91	23,46
A0E-000A	0,400000	h	Manobre especialista	34,03	13,61
C111-0056	0,400000	h	Compressor+dos martells pneumàtics	22,83	9,13
A%AUX0010150	1,500000	%	Despeses auxiliars mà d'obra	67,15	1,01
				Suma la partida	141,83
				Costos indirectes	6% 8,51
				TOTAL PARTIDA	150,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

6.- NOU PRESSUPOST ACTUALITZAT PER LICITAR

El nou pressupost actualitzat per licitar prent com a base el pressupost original del "Projecte de pas peatonal del carrer de l'Era a Vilanova de Prades", descomptant les unitats ja executades i incorporant les noves actuacions detectades durant l'obra. L'import resultant haurà de constituir el nou pressupost base de licitació per a la finalització de les obres.

Les unitats d'obra corresponens a Seguretat i Salut i Imprevistos s'ha actualitzat en import a la realitat de l'estat de l'obra actual

Així doncs, el nou pressupost per partides i amidament queda de la següent forma:

Descripció				Pressupost		
Codi	Nat	Ud	Resum	CanPres	Pres	ImpPres
1	Capítol	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES				
P214W-FEMD	Partida	m	Tall paviment form. h>=15cm	32,00	10,19	326,08
P214S-73G5	Partida	m	Enderroc reixat, altura de fins a 2m, amb càrrega, transport i deposició	13,50	10,91	147,29
P2146-HYPH	Partida	m2	Demolició paviment formigó gruix de fins a 15cm, manual	0,00	66,42	0,00
P2R6-4I5S	Partida	m3	Càrrega manual residus inerts o no especials instal.lació de gestió residus, contenidor 8m3	0,49	56,46	27,67
P2RA-IQFK	Partida	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat, residus form. inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01	0,49	19,60	9,60
F22113L2	Partida	m2	Neteja i esbrossada terreny	9,50	3,19	30,31
P221B-I0OL	Partida	m3	Excavació en roca, altura fins a 2m, de 0.2 a 2m3	0,00	155,13	0,00
P2217-55T8	Partida	m3	Excavació per rebaix, terreny compacte(SPT 20-50)	0,64	6,34	4,06
P2R4-IZ52	Partida	m3	Càrrega manuals i transport de terres no contaminades, instal.lació de gestió residus, contenidor 9m3	0,77	56,72	43,67
P2RB-HG0V	Partida	m3	Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME	14,62	11,82	172,81
P2241-52SM	Partida	m2	Repàs+picon.esplanada,95%PM	9,50	2,39	22,71
P21R0-92HA	Partida	u	Eliminació d'arbre directa arbre d'altura inferior a 6m port petit amb arrencant la soca	0,00	166,40	0,00
			Total 1			784,20
2	Capítol	PAVIMENTACIÓ				
P2252-549L	Partida	m3	Estesa i piconatge sòl adequat aportació, g<=25cm, 95%,PM, corró, humectació	0,28	31,32	8,77
P2252-549G	Partida	m3	Estesa i piconatge tot-u artificial aportació, g<=25cm, 95%,PM, corró, humectació	11,95	65,65	784,52
P9G7-9LSG	Partida	m3	Paviment gruix fins a 20cm formigó amb fibres de vidre HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4	22,79	257,03	5.857,71
P9BA-I6UC	Partida	m2	Paviment pedra calcària nacional serrada, g=40mm aresta viva, entorn urbà dificultat de mobilitat, voreres a<= 3m	53,00	179,63	9.520,39
PQ43-HA7F	Partida	u	Pilona fosa protecció antioxidant i pintura de color negre forja h=1000mm a=95mm,col.dau form.	4,00	172,85	691,40
UBENUM304NFSC	Partida	u	Banc NEOBARCINO 1800 natural FSC de Benito o equivalent	2,00	1.032,60	2.065,20
UBENPA606	Partida	u	Paperera BCN 70 litres de Benito o equivalent	1,00	411,69	411,69
UBENUM1640-1PR	Partida	u	Jardinera ReBnew 1800x600x480 mm, polímer reciclat	2,00	1.032,61	2.065,22
UBENUM1640-2PR	Partida	u	Jardinera ReBnew 2, 1000x480x480 mm, polímer reciclat	2,00	663,13	1.326,26
UBENUM1640-4PR	Partida	u	Jardinera ReBnew 4, 950x950x720 mm, polímer reciclat	4,00	1.175,11	4.700,44

UBENUM1640-5PR	Partida	u	Jardineria ReBnew 5, 600x600x480 mm, polímer reciclat	2,00	621,70	1.243,40
PB13-61TX	Partida	m	Barana d'acer per pintar amb muntant cada 100cm, brèndoles cada 10cm, h=110 cm a 140 cm, pintada	70,00	239,89	16.792,30
Total 2						45.467,30
3	Capítol	ESTRUCTURA				
P4520-IAWY	Partida	m3	Formigó per mur, formigó per armar +addit. hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.55,bomba	2,05	370,57	759,67
P4BC-43MX	Partida	kg	Armadura p/mur AP500SD barres corrug.	187,26	3,03	567,40
P4DG-3XPD	Partida	m2	Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler pi,p/mur rect.,encofr.1 cara, per estructures en alçada	10,75	200,70	2.157,53
P459B-10ZMY	Partida	m2	Sostre nervat unidireccional de 22+6 cm amb bigueta auto-resistent	18,00	199,64	3.593,52
Total 3						7.078,12
4	Capítol	ENLLUMENAT PÚBLIC				
FG310015	Partida	m	Conductor Cu armat RVFV, 4x6mm	59,00	6,78	400,02
FDG50210	Partida	m	Canalització enllumenat, PE D90mm	0,00	13,81	0,00
FHM10030x	Partida	u	Columna de 3 m amb lluminària Model Ochocentista de Salvi o equivalent	3,00	1.694,43	5.083,29
FG380020	Partida	m	Cable nu Cu 35mm2,enllum.	0,00	5,79	0,00
TEN01006	Partida	u	Piqueta/placa de presa de terra L=2 m	0,00	65,19	0,00
EP1012	Partida	u	Troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondària; amb tapa i bastiment de fosa dúctil 40x40 cm, classe C-250 amb	2,00	250,31	500,62
FGZZE0030	Partida	u	Projecte de legalització fins 10 kW d'enllumenat públic	1,00	1.454,32	1.454,32
conexio	Partida	u	Connexió a punt de llum existent	1,00	121,97	121,97
Total 4						7.560,22
5	Capítol	JARDINERIA				
PR60-8YHD	Partida	u	Plantació d'arbre planifoli, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada, pa terra/contenedor, substitució 100% de terra	4,00	67,13	268,52
PR61-8ZIT	Partida	u	Plantació arbust/arbre petit, cont.=1.5 a 3l, substitució 100% de terra per sorra rentada i compost	24,00	13,03	312,72
PR36-8RV7	Partida	m3	Terra vegetal jardineria categoria alta, sacs 0,8m3, escampada manual	3,69	189,14	697,93
PR45A-8XNR	Partida	u	Subministrament Tília tomentosa perímetre de 12 a 14cm, pa terra	2,00	127,21	254,42
PR45B-8XSF	Partida	u	Subministrament Tipuana tipu (T. speciosa) perímetre de 12 a 14cm, pa terra	2,00	69,09	138,18
PR49H-92SS	Partida	u	Subministrament Anthyllis cytisoides h=30 a 50cm,en contenidor 1,3l	6,00	3,55	21,30
PR4B6-947L	Partida	u	Subministrament Centranthus ruber h=30 a 40cm,en contenidor 3l	2,00	6,68	13,36

PR4DG-93FV	Partida	u	Subministrament Gaura lindheimeri h=20 a 30cm, en contenidor 1,3l	4,00	4,14	16,56
FR4H3G41	Partida	u	Subministrament Rosmarinus officin.Prostratus en contenidor 3l	2,00	5,20	10,40
PR4EC-94MI	Partida	u	Subministrament Lavandula dentata en contenidor 3l	6,00	5,45	32,70
PR4JF-950P	Partida	u	Subministrament Verbena officinalis test 11cm	4,00	6,08	24,32
Total 5						1.790,41
6	Capítol		SEGURETAT I SALUT			
SIS	Partida	u	Partida per la implantació de mesures de Seguretat i Salut.	1,00	3.600,00	3.600,00
Total 6						3.600,00
7	Capítol		IMPREVISTOS			
IMPR	Partida	u	Imprevistos	1,00	4.500,00	4.500,00
Total 7						4.500,00
8	Capítol		MUR DE CONTENCIÓ			
MURCONT0	Partida	m	Mur de contenció de bloc formigonat armat	25,00	150,34	3.758,50
Total 8						3.758,50
Total Pressupost (PEM)						74.538,75

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	(PEM)	74.538,75 €
Despeses Generals - DG	13%	9.690,04 €
Benefici Industrial - BI	6%	4.472,33 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	(PEC)	88.701,12 €
IVA	21%	18.627,24 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	(PBL)	107.328,36 €

El pressupost de execució per contracte amb IVA per licitar puja a CENT SET MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (107.328,36 €)

Vilanova de Prades, octubre 2026

L'Enginyer Tècnic Industrial

Jose Antonio Aguilar Muñoz
