
 Sólo fin Fecha límite Progreso

Página 1

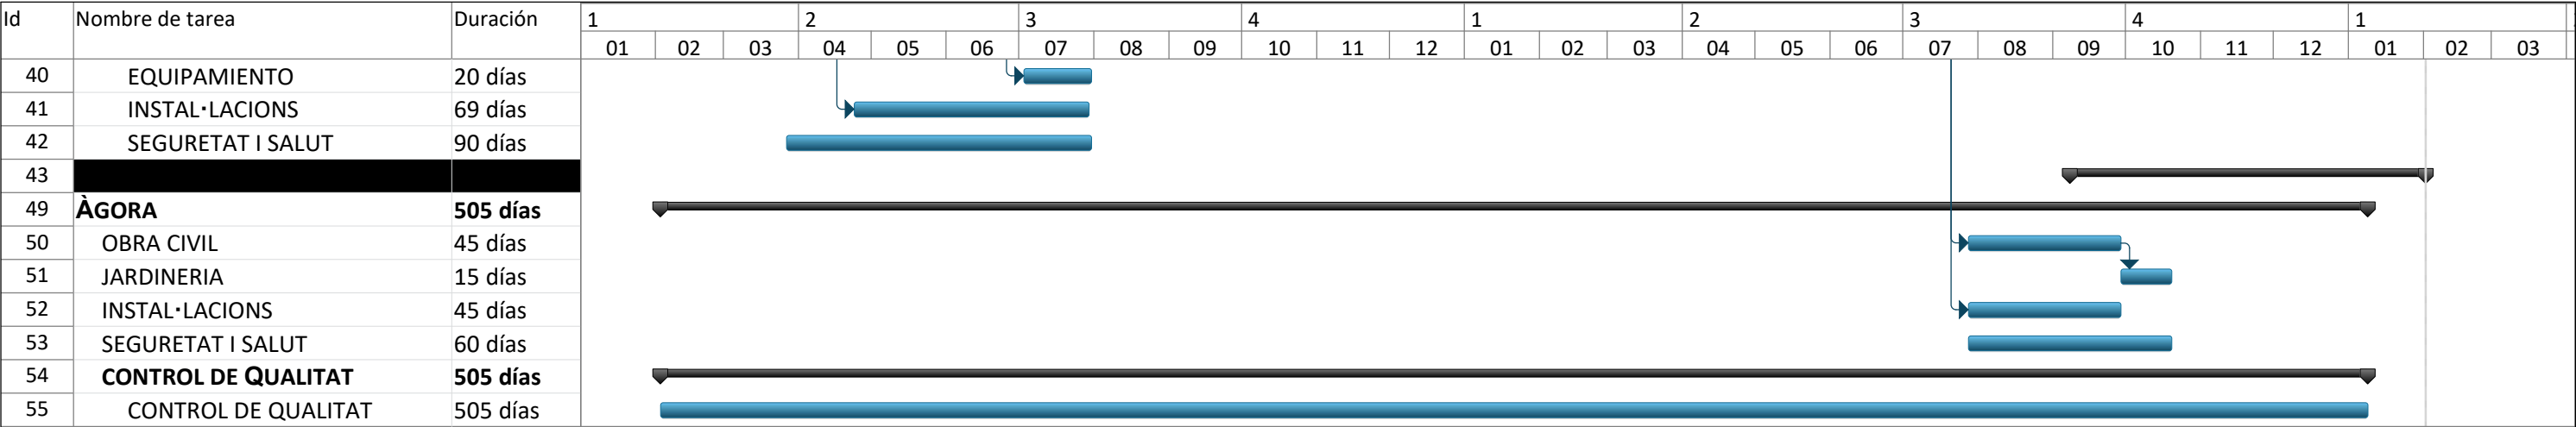

Proyecto: Planificació CAST.mpp
Fecha: mar 10/09/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 2

		1r trimestre			2º trimestre			3r trimestre			4º trimestre		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
UPF	10.488.107,52 €			304.668,91 €									
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	304.668,91 €			304.668,91 €									
ESTRUCTURA DE FUSTA	2.340.813,56 €			292.601,70 €	292.601,70 €	292.601,70 €	292.601,70 €	292.601,70 €	292.601,70 €	292.601,70 €	292.601,70 €		
ESTRUCTURA METÀL·LICA	318.648,09 €			39.831,01 €	39.831,01 €	39.831,01 €	39.831,01 €	39.831,01 €	39.831,01 €	39.831,01 €	39.831,01 €		
ENVOLVENTS	2.028.700,51 €							289.814,36 €	289.814,36 €	289.814,36 €	289.814,36 €	289.814,36 €	289.814,36 €
DIVISIONS INTERIORS	762.027,58 €											127.004,60 €	127.004,60 €
ACABATS	634.688,74 €												
SERRALLERIA	101.562,88 €								11.284,76 €	11.284,76 €	11.284,76 €	11.284,76 €	11.284,76 €
EQUIPAMENT	316.952,16 €												
INSTAL·LACIONES DE TRANSPORTE	91.968,21 €												
INSTAL·LACIONES	3.508.828,41 €											318.984,40 €	318.984,40 €
SEGURETAT I SALUT	39.501,99 €			2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €
GESTIÓ DE RESIDUS	39.746,48 €			2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €
IBE-CSIC	11.252.815,03 €												
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	330.240,23 €			330.240,23 €									
ESTRUCTURA DE FUSTA	2.188.086,07 €			273.510,76 €	273.510,76 €	273.510,76 €	273.510,76 €	273.510,76 €	273.510,76 €	273.510,76 €	273.510,76 €		
ESTRUCTURA METÀL·LICA	69.007,79 €			8.625,97 €	8.625,97 €	8.625,97 €	8.625,97 €	8.625,97 €	8.625,97 €	8.625,97 €	8.625,97 €		
ENVOLVENTS	2.241.529,36 €							320.218,48 €	320.218,48 €	320.218,48 €	320.218,48 €	320.218,48 €	320.218,48 €
DIVISIONS INTERIORS	1.050.393,00 €											175.065,50 €	175.065,50 €
ACABATS	640.570,38 €												
SERRALLERIA	170.488,13 €								18.943,13 €	18.943,13 €	18.943,13 €	18.943,13 €	18.943,13 €
EQUIPAMENT	305.577,48 €												
INSTAL·LACIONES DE TRANSPORTE	85.224,51 €												
INSTAL·LACIONES	4.076.516,54 €											370.592,41 €	370.592,41 €
SEGURETAT I SALUT	39.501,99 €			2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €
GESTIÓ DE RESIDUS	39.746,48 €			2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €
CT	15.933,07 €											1.593,31 €	1.593,31 €
ESTRUCTURA -1	1.749.006,37 €												
NIVELL TERRA	614.305,41 €		614.305,41 €										
NIVELL SOSTRE	818.521,81 €			818.521,81 €									
PILARS I PANTALLES	54.075,61 €			54.075,61 €									
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	256.165,92 €			256.165,92 €									
SEGURETAT I SALUT	5.937,62 €		2.968,81 €	2.968,81 €									
ZONES COMUNS -1	331.435,67 €												
DIVISIONS INTERIORS	69.934,10 €				34.967,05 €	34.967,05 €							
DIVISIONS PRACTICABLES	26.803,90 €						26.803,90 €						
ACABATS	40.058,79 €					13.352,93 €	13.352,93 €	13.352,93 €					
SERRALLERIA	2.054,70 €					1.027,35 €	1.027,35 €						
EQUIPAMENT	13.470,57 €							13.470,57 €					
INSTAL·LACIONS	173.175,99 €				43.294,00 €	43.294,00 €	43.294,00 €	43.294,00 €					
SEGURETAT I SALUT	5.937,62 €		989,60 €	989,60 €	989,60 €	989,60 €	989,60 €	989,60 €					
ÀGORA	540.023,15 €												
OBRA CIVIL	410.146,73 €												
JARDINERIA	14.773,12 €												
INSTAL·LACIONS	107.220,12 €												
SEGURETAT I SALUT	7.883,18 €												
UPF	10.488.107,52 €	- €	- €	641.272,59 €	336.603,68 €	336.603,68 €	336.603,68 €	626.418,04 €	637.702,80 €	637.702,80 €	637.702,80 €	751.259,09 €	751.259,09 €
IBE-CSIC	11.252.815,03 €	- €	- €	616.547,93 €	286.307,70 €	286.307,70 €	286.307,70 €	606.526,18 €	625.469,31 €	625.469,31 €	625.469,31 €	890.583,80 €	890.583,80 €
ESTRUCTURA -1	1.749.006,37 €	- €	617.274,22 €	1.131.732,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ZONES COMUNES -1	331.435,67 €	- €	989,60 €	989,60 €	79.250,65 €	93.630,93 €	85.467,78 €	71.107,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
ÀGORA	540.023,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total PEM	24.361.387,74 €	- €	618.263,82 €	2.390.542,28 €	702.162,03 €	716.542,31 €	708.379,16 €	1.304.051,32 €	1.263.172,11 €	1.263.172,11 €	1.263.172,11 €	1.641.842,89 €	1.641.842,89 €
13% Despeses Generales	3.166.980,41 €	- €	80.374,30 €	310.770,50 €	91.281,06 €	93.150,50 €	92.089,29 €	169.526,67 €	164.212,37 €	164.212,37 €	164.212,37 €	213.439,58 €	213.439,58 €
6% Benefici Industrial	1.461.683,26 €	- €	37.095,83 €	143.432,54 €	42.129,72 €	42.992,54 €	42.502,75 €	78.243,08 €	75.790,33 €	75.790,33 €	75.790,33 €	98.510,57 €	98.510,57 €
IVA 21%	6.087.910,80 €	- €	154.504,13 €	597.396,51 €	175.470,29 €	179.063,92 €	177.023,95 €	325.882,43 €	315.666,71 €	315.666,71 €	315.666,71 €	410.296,54 €	410.296,54 €
TOTAL PARCIAL		- €	890.238,08 €	3.442.141,82 €	1.011.043,11 €	1.031.749,28 €	1.019.995,16 €	1.877.703,50 €	1.818.841,52 €	1.818.841,52 €	1.818.841,52 €	2.364.089,58 €	2.364.089,58 €
TOTAL ACUMULAT	35.077.962,21 €	- €	890.238,08 €	4.332.379,90 €	5.343.423,02 €	6.375.172,29 €	7.395.167,45 €	9.272.870,95 €	11.091.712,47 €	12.910.554,00 €	14.729.395,52 €	17.093.485,10 €	19.457.574,68 €

1r trimestre					2º trimestre			3r trimestre			4º trimestre		
	01	02	03		04	05	06	07	08	09	10	11	12
UPF	10.488.107,52 €												
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	304.668,91 €												
ESTRUCTURA DE FUSTA	2.340.813,56 €												
ESTRUCTURA METÀL·LICA	318.648,09 €												
ENVOLVENTS	2.028.700,51 €	289.814,36 €											
DIVISIONS INTERIORS	762.027,58 €	127.004,60 €	127.004,60 €	127.004,60 €	127.004,60 €								
ACABATS	634.688,74 €			126.937,75 €	126.937,75 €	126.937,75 €	126.937,75 €	126.937,75 €	126.937,75 €				
SERRALLERIA	101.562,88 €			11.284,76 €	11.284,76 €	11.284,76 €	11.284,76 €						
EQUIPAMENT	316.952,16 €						79.238,04 €	79.238,04 €	79.238,04 €	79.238,04 €			
INSTAL·LACIONES DE TRANSPORTE	91.968,21 €				15.328,04 €	15.328,04 €	15.328,04 €	15.328,04 €	15.328,04 €	15.328,04 €			
INSTAL·LACIONES	3.508.828,41 €	318.984,40 €	318.984,40 €	318.984,40 €	318.984,40 €	318.984,40 €	318.984,40 €	318.984,40 €	318.984,40 €	318.984,40 €			
SEGURETAT I SALUT	39.501,99 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €			
GESTIÓ DE RESIDUS	39.746,48 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €			
IBE-CSIC	11.252.815,03 €												
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	330.240,23 €												
ESTRUCTURA DE FUSTA	2.188.086,07 €												
ESTRUCTURA METÀL·LICA	69.007,79 €												
ENVOLVENTS	2.241.529,36 €	320.218,48 €											
DIVISIONS INTERIORS	1.050.393,00 €	175.065,50 €	175.065,50 €	175.065,50 €	175.065,50 €								
ACABATS	640.570,38 €			128.114,08 €	128.114,08 €	128.114,08 €	128.114,08 €	128.114,08 €	128.114,08 €				
SERRALLERIA	170.488,13 €			18.943,13 €	18.943,13 €	18.943,13 €	18.943,13 €						
EQUIPAMENT	305.577,48 €						76.394,37 €	76.394,37 €	76.394,37 €	76.394,37 €			
INSTAL·LACIONES DE TRANSPORTE	85.224,51 €				14.204,09 €	14.204,09 €	14.204,09 €	14.204,09 €	14.204,09 €	14.204,09 €			
INSTAL·LACIONES	4.076.516,54 €	370.592,41 €	370.592,41 €	370.592,41 €	370.592,41 €	370.592,41 €	370.592,41 €	370.592,41 €	370.592,41 €	370.592,41 €			
SEGURETAT I SALUT	39.501,99 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €	2.079,05 €			
GESTIÓ DE RESIDUS	39.746,48 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €	2.091,92 €			
CT	15.933,07 €	1.593,31 €	1.593,31 €	1.593,31 €	1.593,31 €	1.593,31 €	1.593,31 €	1.593,31 €	1.593,31 €				
ESTRUCTURA -1	1.749.006,37 €												
NIVELL TERRA	614.305,41 €												
NIVELL SOSTRE	818.521,81 €												
PILARS I PANTALLES	54.075,61 €												
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	256.165,92 €												
SEGURETAT I SALUT	5.937,62 €												
ZONES COMUNS -1	331.435,67 €												
DIVISIONS INTERIORS	69.934,10 €												
DIVISIONS PRACTICABLES	26.803,90 €												
ACABATS	40.058,79 €												
SERRALLERIA	2.054,70 €												
EQUIPAMENT	13.470,57 €												
INSTAL·LACIONS	173.175,99 €												
SEGURETAT I SALUT	5.937,62 €												
ÀGORA	540.023,15 €												
OBRA CIVIL	410.146,73 €							136.715,58 €	136.715,58 €	136.715,58 €			
JARDINERIA	14.773,12 €										14.773,12 €		
INSTAL·LACIONS	107.220,12 €							35.740,04 €	35.740,04 €	35.740,04 €			
SEGURETAT I SALUT	7.883,18 €							1.970,80 €	1.970,80 €	1.970,80 €			
UPF	10.488.107,52 €	739.974,33 €	450.159,97 €	588.382,48 €	603.710,52 €	476.705,92 €	555.943,96 €	544.659,20 €	417.721,45 €	417.721,45 €	- €	- €	- €
IBE-CSIC	11.252.815,03 €	871.640,67 €	551.422,19 €	698.479,39 €	712.683,48 €	537.617,98 €	614.012,35 €	595.069,22 €	466.955,15 €	465.361,84 €	- €	- €	- €
ESTRUCTURA -1	1.749.006,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ZONES COMUNES -1	331.435,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ÀGORA	540.023,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	174.426,41 €	174.426,41 €	174.426,41 €	16.743,92 €	- €	- €
Total PEM	24.361.387,74 €	1.611.615,00 €	1.001.582,16 €	1.286.861,88 €	1.316.394,00 €	1.014.323,90 €	1.169.956,31 €	1.314.154,83 €	1.059.103,01 €	1.057.509,70 €	16.743,92 €	- €	- €
13% Despeses Generales	3.166.980,41 €	209.509,95 €	130.205,68 €	167.292,04 €	171.131,22 €	131.862,11 €	152.094,32 €	170.840,13 €	137.683,39 €	137.476,26 €	2.176,71 €	- €	- €
6% Benefici Industrial	1.461.683,26 €	96.696,90 €	60.094,93 €	77.211,71 €	78.983,64 €	60.859,43 €	70.197,38 €	78.849,29 €	63.546,18 €	63.450,58 €	1.004,63 €	- €	- €
IVA 21%	6.087.910,80 €	402.742,59 €	250.295,38 €	321.586,78 €	328.966,86 €	253.479,54 €	292.372,08 €	328.407,29 €	264.669,84 €	264.271,67 €	4.184,30 €	- €	- €
TOTAL PARCIAL		2.320.564,44 €	1.442.178,15 €	1.852.952,41 €	1.895.475,71 €	1.460.524,98 €	1.684.620,09 €	1.892.251,54 €	1.525.002,42 €	1.522.708,22 €	24.109,56 €	- €	- €
TOTAL ACUMULAT	35.077.962,21 €	21.778.139,11 €	23.220.317,27 €	25.073.269,68 €	26.968.745,40 €	28.429.270,38 €	30.113.890,47 €	32.006.142,01 €	33.531.144,43 €	35.053.852,64 €	35.077.962,21 €	35.077.962,21 €	35.077.962,21 €
