

Plec de prescripcions tècniques per la contractació dels serveis d'actualització, migració i manteniment del software MS Dynamics 365 Business Central pel Parc Sanitari Pere Virgili

Expedient 25/288

Índex

1	Antecedents	1
2	Objecte del Contracte.....	2
3	Abast	3
3.1	Anàlisi funcional.....	3
3.2	Actualització a la versió Microsoft Dynamics 365 Business Central	3
3.3	Llicenciament i manteniment.....	3
3.4	Servei de suport.....	3
4	Situació actual	4
4.1	Gestió financera.....	4
4.2	Compres.....	6
4.3	Vendes	8
4.4	Facturació.....	10
4.5	Magatzem.....	10
4.6	Planificació dels recursos	10
4.7	Comptabilitat analítica.....	11
5	Descripció del servei	12
5.1	Anàlisi funcional.....	12
5.2	Actualització a la versió Microsoft Dynamics 365 Business Central (on premise)	12
5.3	Llicenciament i manteniment.....	21
5.4	Servei de suport.....	22
6	Requeriments.....	25
6.1	Model de relació	25
6.2	Òrgans de gestió	28
6.3	Equip de treball.....	30
6.4	Informes i Lliurables.....	31
6.5	Condicions de la prestació del servei.....	32
7	Execució del projecte	34
8	Acords de Nivell de Servei (ANS)	35
8.1	Incompliments	35
8.2	Penalitzacions	36
8.3	Condicions de garantia	36
9	Millores.....	37
9.1	Gestió de contractes.....	37
9.2	Integració EDI.....	37
10	Altres consideracions	38
10.1	Presentació de la documentació	38
10.2	Esquema Nacional de Seguretat	38

1 Antecedents

L'activitat principal del Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV), en endavant el Parc, és la prestació de serveis assistencials, d'investigació i docència. Addicionalment a aquesta activitat també es realitza la gestió de suport a d'altres serveis assistencials i a entitats de l'entorn sanitari ubicades al Parc, així com la gestió dels immobles i instal·lacions en el recinte. En l'any 2018 es va traspasar la gestió d'Atenció Primària del PAMEM que consta de 3 centres d'atenció primària i un CUAP.

Segons es reflecteix en la definició pròpia de l'empresa, els objectius a assolir són:

- Gestionar els edificis i les instal·lacions del recinte i, a aquest efecte, pactar els negocis jurídics que escaiguin a fi i efecte de possibilitat que tercers hi puguin realitzar les activitats que siguin d'interès del Servei català de la Salut, sense més limitacions que les establertes en les normes de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i al Pla Especial d'Ordenació del recinte de l'antic Hospital Militar de Barcelona.
- Prestar serveis d'atenció sanitària i de salut mental, com també de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció sociosanitària a la població.
- L'execució de programes institucionals en matèria de protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària i sociosanitària i rehabilitació.
- La prestació, en el seu cas, i la gestió de serveis de suport a d'altres serveis assistencials.
- Desenvolupar programes d'investigació en l'àmbit de la salut i col·laborar amb la universitat i la resta d'institucions competents en matèria de docència i recerca.
- Desenvolupar totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, com també les actuacions en relació amb les funcions esmentades anteriorment que li siguin encomanades.

Per tal d'assolir aquest objectiu, cal mantenir els sistemes de informació actualitzats en versió amb suport actiu per part del fabricant. En l'àmbit econòmicofinancer el sistema de gestió (ERP) implantat és Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (NAV) basat en un sistema de gestió de base de dades relacional SQL Server 2017. Els mòduls instal·lats en el sistema són els següents:

- Gestió financera
- Compres
- Vendes
- Magatzem
- Planificació de recursos
- Administració

Afegir que, durant el 2025, el sistema de informació vinculat a la prescripció, dispensació i administració del medicament a l'àrea de l'Atenció Intermitèdia migrarà a un altra entorn que no gestiona els estocs pel que caldrà que l'ERP gestioni la demanda i dispensació. Aquesta funcionalitat requereix una integració i una lògica específica.

Així doncs, aquest sistema requereix d'una actualització a Microsoft Dynamics Business Central (BC) per mantenir actualitzat el producte i poder gaudir de les millores funcionals i tecnològiques per evolució del software i que permetrà:

- Flexibilitat i connectivitat: més accessibilitat des de qualsevol lloc a través d'un navegador des de diferents dispositius.
- Més capacitat d'integració amb diferents equipaments, aplicacions i font de informació variades.
- Millora en la digitalització de processos de l'organització.
- Millora del rendiment dels processos econòmic-financers i logístics.
- Estandardització dels processos econòmic-financers i logístics.

I alhora incorporar noves millores en les funcionalitats actuals:

- Gestió de contractes.
- Integració EDI.

2 Objecte del Contracte

L'objecte de la contractació consisteix en dur a terme l'actualització a la darrera versió publicada i estable de Microsoft Dynamics 365 Business Central (on premise) com ERP de Gestió Integral del PSPV, així com la migració de dades i aquells desenvolupaments existents que ho requereixin des de la versió Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 per tal de donar compliment als requeriments funcionals del Parc, entre ells la integració amb el nou HES Farma, juntament amb l'adequació de les llicències necessàries per al correcte funcionament del sistema. Tanmateix, l'objecte de la contractació inclourà totes les funcionalitats i integracions amb el sistema descrites en el punt 5 *Descripció del servei*.

3 Abast

3.1 Anàlisi funcional

Revisió detallada de les funcionalitats a mida i de les noves funcionalitat que caldrà o no desenvolupar en funció de si les millores aportades per l'actualització a Business Central integren com procediments propis el que actualment son desenvolupaments a mida.

3.2 Actualització a la versió Microsoft Dynamics 365 Business Central

Execució de totes les tasques necessàries per a emprendre l'actualització de Microsoft Dynamics 365 Business Central incloent totes les integracions, parametritzacions, desenvolupaments i migracions necessàries. S'inclouen els treballs necessaris pel disseny, desenvolupament, migració de dades, adaptació, instal·lació, integració amb altres sistemes, implantació i desplegament, documentació, formació, gestió del canvi i traspàs de coneixements.

3.3 Llicenciament i manteniment

Solució per adaptar les llicències necessàries per el correcte funcionament dels diferents usuaris durant un període de 3 anys, més 2 de pròrroga.

Aquest manteniment ha de donar accés a totes les actualitzacions normatives i de seguretat, noves versions del producte així com esmenes als errors del producte. Concretament ha d'incloure:

- Manteniment normatiu: accions realitzades pel fabricant per introduir funcionalitats derivades de canvis legislatius i d'obligat compliment.
- Manteniment correctiu: actuacions realitzats pel fabricant per resoldre errors dels programes en producció, reportats pel client, altres clients o bé pel propi control de qualitat del fabricant.
- Manteniment evolutiu: actuacions realitzades pel fabricant per introduir als programes noves funcionalitats o millores de les actuals.

3.4 Servei de suport

Servei de suport post implantació durant un període de 3 anys més 2 de pròrroga.

4 Situació actual

Actualment el programari permet:

- Gestionar l'activitat de l'organització relativa al processos empresarials de l'entitat.
- Accés a tota la informació de forma fiable, precisa i oportuna (integritat de dades).
- Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l'organització.

Disposem de la versió Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (NAV) amb els següents mòduls:

- Gestió financera
- Compres
- Vendes
- Magatzem
- Planificació de recursos
- Desenvolupament propi per compatibilitat analítica

Es disposa també d'unes extraccions de dades personalitzades i automatitzades en format Excel per garantir la continuïtat del servei (Pla de Contingència):

- Continguts de ubicacions
- Consums (últim mes)
- Productes
- Doble calaix
- Unitats d'emmagatzematge (um)
- Contactes
- Clients
- Proveïdors

A continuació es descriuen amb més detall les funcionalitats actuals.

4.1 Gestió financera

1. Nivell comptable i financer

S'utilitzen les funcionalitats de NAV i les que interactuen amb les diferents àrees de gestió: compres, logística i vendes.

Des del punt de vista merament financer, els usuaris tenen la possibilitat d'introduir tot tipus d'apunts comptables a través dels diaris, consultar-los i, si calgués, revertir-los per la seva correcció. No es permet esborrar les dades registrades per garantir la integritat i traçabilitat de la informació.

En les àrees de compres i vendes, tot registre de documents, com poden ser factures i abonaments, té associats els corresponents apunts comptables; apunts que es realitzen de manera transparent a l'usuari i que poden ser fàcilment consultats a través de funcionalitats de navegació de documents.

A nivell de logística, és possible realitzar la valoració comptable i control d'existències produïda a partir de qualsevol moviment de producte. De nou, els apunts comptables associats a aquesta valoració es poden fer automàticament i totalment transparents per l'usuari.

2. Pla general comptable (PGC)

Actualment el Parc Sanitari fa servir un pla comptable adaptat al seu funcionament on els comptes d'immobilitzat, clients i proveïdors estan agrupats mitjançant grups comptables per facilitar el tractament dels moviments i el manteniment del propi pla comptable.

3. Dimensions

NAV ofereix la possibilitat d'analitzar la informació comptable des de diferents punts de vista mitjançant l'ús del que s'anomena dimensions.

A PSPV aquesta eina resulta molt potent perquè es necessita fer anàlisis comptables per centres de cost conformatos per edificis, plantes, àrees, etc. per tant, centres de cost i els seus components (edificis, plantes i àrees) esdevenen dimensions.

Per assegurar el correcte anàlisi dels apunts comptables per dimensions es disposa de vàries eines:

1. Les dimensions es poden fer obligatòries a determinats comptes comptables, això permet, per exemple, que tot apunt que vagi a parar a comptes de despesa o d'immobilitzat, tingui associada la corresponent dimensió i no s'escapi cap sense.
2. Les dimensions també es poden definir a nivell de dades mestres el que permet associar determinats actius fixes al corresponent edifici, planta i àrea assegurant així que tot moviment que es realitzi amb aquell actiu arrossegui per defecte aquests valors sense requerir una tasca manual.
3. Finalment, hi ha determinades combinacions, per exemple d'edifici i planta, que no es poden donar; per evitar-ho, es fan servir les combinacions de dimensions que ens permet definir combinacions prohibides, d'aquesta manera si un usuari les fa servir per error ens mostra un missatge d'error.

4. IVA

Mitjançant la definició de grups de registre d'IVA, es calcula l'IVA de manera automàtica i transparent a cada registre comptable que correspongui. NAV cobreix les funcionalitats pel càlcul dels diferents tipus d'IVA existents: normal, total, no subjecte i de reversió.

L'usuari pot consultar els imports d'IVA, no només a través dels comptes comptables corresponents, si no també a partir dels moviments d'IVA lo qual fa més senzilla la seva interpretació ja que aquí disposa informació sobre la base i l'import, el tipus d'IVA calculat, si és IVA normal, el percentatge aplicat. És bàsic per PSPV poder distingir fàcilment els diferents motius pels que un IVA no subjecte ho és.

En algunes operacions de compra, tot i tractar-se d'operacions d'IVA normal, PSPV no es pot deduir el total de l'IVA i ha de registrar un percentatge com a més cost. Aquest tractament es conegut com a **prorrata** i actualment no es cobreix de manera estàndard.

5. Impostos

PSPV presenta els següents models d'impostos:

- Model 347, funcionalitat estàndard.
- Model 349, funcionalitat estàndard.
- Declaracions d'IVA, funcionalitat estàndard per facilitar la elaboració del model manualment, sense definició d'IVA Telemàtic a dia d'avui.
- Llibres de factures emeses i rebudes, funcionalitat estàndard de NAV.

6. Gestió de nòmines

La gestió de nòmines es porta externament des del programa de RRHH (Denario) i existeix una integració per recuperar l'apunt de nòmines (des d'un arxiu TXT).

7. Gestió de pagaments

NAV cobreix de manera estàndard la generació de les ordres de pagament en format SEPA.

4.2 Compres

En aquest apartat s'inclou la gestió de productes i proveïdors i cobreix el circuit sencer de compra incloent-hi la seva integració amb magatzem pel control de recepcions i enviaments de productes retornats a proveïdor si fos necessari.

El circuit de compres, a banda del manteniment de mestres de productes i proveïdors, inclou:

- La creació i gestió de comandes de compra.
- La recepció del material i/o serveis inclosos a les comandes de compra.
- La gestió d'albarans de compra creats a partir de les recepcions de material.
- La integració amb comptabilitat mitjançant la creació de factures de compra que poden ser directes o generades a partir dels albarans de material i serveis oferts pels proveïdors.
- La gestió de devolucions de material als proveïdors i generació dels corresponents abonaments de compra.

1. Fitxa de proveïdor

A la fitxa de proveïdor consten les dades bàsiques per la gestió dels diferents proveïdors de serveis i material amb qui treballa PSPV. Des d'aquesta fitxa es poden gestionar dades de contacte com adreces, telèfons i e-mails i també les dades financeres com terminis i formes de pagament o dades bancàries.

També es permet guardar i gestionar les tarifes de compra de cada proveïdor per facilitar la introducció i control de preus de compra a les comandes.

2. Fitxa de producte

A la fitxa de producte tenim informació d'unitats de mesura, proveïdor per defecte i sistemes de reposició d'estoc, referències creuades per identificar el producte amb la codificació dels proveïdors o amb els seus codis de barres i també gestió i control dels seus costos. La informació relativa al reaprovisionament pels diferents magatzems es defineix a nivell de "*unidad de almacenamiento (um)*" i el càlcul MRP es basa en aquesta informació sempre, fent servir el mètode de màxims i mínims d'estoc.

Tant a les fitxes de proveïdors com a les de productes es permet vincular documents externs adjunts com poden ser fulls de producte, contractes de compra o confidencialitat, etc.

3. Ofertes

Gestió estàndard de les ofertes que ofereixen els proveïdors per la compra del seu material.

4. Comandes de compra

NAV permet la creació i gestió de comandes de compra de diverses formes:

- Convertint ofertes de compra acceptades en comandes.
- Creant comandes de compra de manera manual.
- Creant comandes de compra de manera automatitzada a través de la fulla de demanda.

5. Fulla demanda

La fulla de demanda permet la generació automàtica de comandes de compra a partir dels paràmetres definits a les fitxes de productes i “*unidades de almacenamiento (um)*”, com poden ser el sistema de reposició i polítiques de reaprovisionament (estocs mínims, proveïdor, quantitats per unitat de mesura, etc.).

Aquestes comandes poden ser pel propi recinte o pels diferents equipaments (CAPs i CUAP), centres que tenen les seves necessitats definides, provocant així que aquestes compres siguin d'enviament directe als diferents punts (CAP).

6. Albarans

Un cop les comandes de compra es reben es genera a NAV el corresponent albarà de compra. L'albarà de compra es pot generar des de la pròpia comanda o des de magatzem amb el corresponent circuit de recepcions del que parlarem posteriorment a l'àmbit de logística.

7. Factures

Les factures de compra es poden generar de manera directa perquè no estiguin associades a una comanda (serà el cas típic on la compra és de serveis) o es poden generar a partir dels albarans que s'han generat a partir de les recepcions rebudes.

8. Gestió d'estocs

La gestió d'estocs des de les diferents ubicacions del PSPV està diferenciada segons localització

- Edificis localitzats al PSPV (Atenció intermèdia: àrees hospitalització o serveis)
- Edificis localitzats fora PSPV (Centres Atenció Primària o CAPs, i CUAP)

I els processos que gestiona son

- Documents de picking com sortides

- Gestió del Doble Calaix:

Actualment PSPV disposa d'una funcionalitat de doble calaix per poder gestionar els calaixos dels controls d'infermeria i el seu reaprovisionament. És un sistema de logística que evita i elimina els trencaments d'estoc. Consisteix en dos calaixos plens del mateix material i quan un s'esgota es reaprovisiona de nou; mentrestant es consumeixen els materials de l'altre calaix durant el temps que cal per fer aquest reaprovisionament.

Es disposa d'una aplicació d'escriptori instal·lada en un terminal portàtil tipus PDA per a la gestió del reaprovisionament del doble calaix que no es vol mantenir per obsolescència tecnològica (Windows Embedded).

Actualment han d'anar els operaris de magatzem a cada control d'infermeria per a fer la lectura de les etiquetes dels productes que s'han consumit per després tornar de nou per fer el reaprovisionament.

- Peticions material (Intranet i petitori web)

- a) Intranet:

Per l'Atenció Intermèdia es disposa d'un petitori integrat a la Intranet corporativa amb una "cistella de la compra" per a la introducció de sol·licituds de productes de manera transparent al ERP. Existeixen diferents petitoris que es gestionen a través de la intranet del PSPV. El material es subministra al propi centre. Son peticions de consum des de cada equipament al seu magatzem fora del circuit de doble calaix. Aquestes peticions estan personalitzades per cada servei.

Accedeixen els diferents usuaris de l'Atenció Intermèdia per realitzar noves sol·licituds de productes, consultar les existents o veure l'històric de peticions realitzades.

Quan s'acaba d'omplir el "cistell de la compra", es genera una sol·licitud que s'integra com a petició de modificació d'estocs a Navision.

- b) Petitori Web: Els centres d'Atenció Primària es disposa d'una aplicació externa (web) on es generen les peticions, i paral·lelament es fa control d'estoc introduint una sol·licitud de consum a Navision, per tal que aquest faci la sortida i es descompti l'estoc. Per cada nova sol·licitud, l'usuari veurà un llistat de productes disponibles per indicar la quantitat desitjada afegint-la al "cistell de la compra".

Quan s'hagi acabat d'omplir el "cistell de la compra", la sol·licitud s'envia i apareix com a pendent, traduint-se en una comanda de transferència. Un cop les sol·licituds pendents estiguin servides passen a un històric de sol·licituds realitzades.

Les peticions de consum es poden fer sobre productes.

Actualment els 2 sistemes darrers (Doble calaix i aplicació Web) tenen codificacions diferents pels mateixos productes.

- Peticions manuals i/o urgents

- Documents d'entrades de material

Actualment la gestió d'estocs des de les diferents ubicacions del PSPV està diferenciada segons localització:

- Edificis localitzats al PSPV (Atenció intermèdia: àrees hospitalització o serveis)
- Edificis localitzats fora PSPV (Centres Atenció Primària i CUAP)

4.3 Vendes


El mòdul de vendes inclou la gestió de clients i cobreix el circuit sencer de vendes, la seva integració amb magatzem pel control d'enviaments i recepcions de devolucions de producte si fos necessari.

Actualment des de PSPV no es treballa amb la generació de comandes ja que no es venen productes com a tal (simplement s'envien als diferents centres i es consumeixen des de magatzem).

Com que l'únic que és venen són serveis (recursos), directament es generaran factures de venda sense haver de passar prèviament per comandes i albarans de lliurament.

Respecte el format d'impressió de documents de venda a continuació es mostra el model que es fa servir actualment per factures pro-forma i factures – abonaments registrats, ja que en ell apareixen les dades i textos de peu de pàgina necessaris per PSPV.

El model de proforma és el següent:

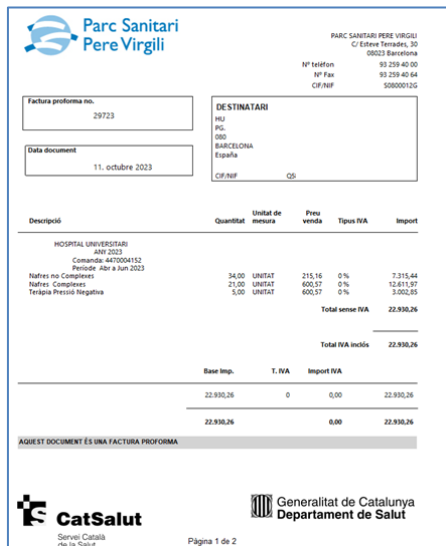

Parc Sanitari Pere Virgili
PARC SANITARI PERE VIRGILI
C/ Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona
Nº telèfon 93 239 40 00
Nº Fax 93 239 40 64
CIF/NIF S0600012G

Factura proforma no. 29723
Data document 11. octubre 2023

DESTINATARI
HJ
PG
000
BARCELONA
Espanya
CIF/NIF QS

Descripció	Quantitat	Unitat de mesura	Preu venda	Tipus IVA	Import
HOSPITAL UNIVERSITARI					
JUN 2023					
Comanda: 447004152					
Període: del 4 jun 2023					
Nafres no Complertes	34,00	UNITAT	215,16	0%	7.315,44
Nafres Completes	2,00	UNITAT	600,57	0%	1.201,14
Teràpia Precoï Negativa	5,00	UNITAT	600,57	0%	3.002,85
Total sense IVA					22.930,26
Total IVA inclòs					22.930,26
Base Imp.					22.930,26
T. IVA					0
Import IVA					0,00
Total IVA inclòs					22.930,26


AQUEST DOCUMENT ÉS UNA FACTURA PROFORMA

CatSalut
Servei Català de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Pàgina 1 de 2

I els formats de factura i abonaments ja registrats:

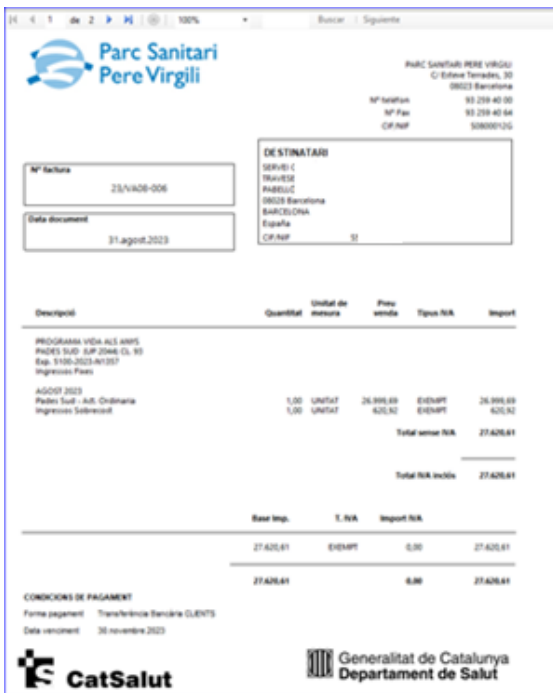

Parc Sanitari Pere Virgili
PARC SANITARI PERE VIRGILI
C/ Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona
Nº telèfon 93 239 40 00
Nº Fax 93 239 40 64
CIF/NIF S0600012G

Nº factura 23/AB08-006
Data document 31.agost.2023

DESTINATARI
SERVIRI-C
TRABASS
PABELLÓ
08023 Barcelona
BARCELONA
Espanya
CIF/NIF SI


Descripció	Quantitat	Unitat de mesura	Preu venda	Tipus IVA	Import
PROGRAMA VIDA ALS 40 ANYS					
PADETS SUU - SUP 2046 CL 93					
Exp. S100-2023-A1357					
Ingressos Pares					
AGOST 2023					
Padres Sud - Aut. Ordinaria	1,00	UNITAT	26.896,69	E16MPT	26.896,69
Ingressos Sobresuït	1,00	UNITAT	620,52	E16MPT	620,52
Total sense IVA					27.426,61
Total IVA inclòs					27.426,61
Base Imp.					27.426,61
T. IVA					0,00
Import IVA					0,00
Total IVA inclòs					27.426,61

CONDICIONS DE PAGAMENT
Forma pagament Transfereixència Bancària CLIENTS
Data venciment 30 novembre 2023

CatSalut
Servei Català de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Pàgina 1 de 2

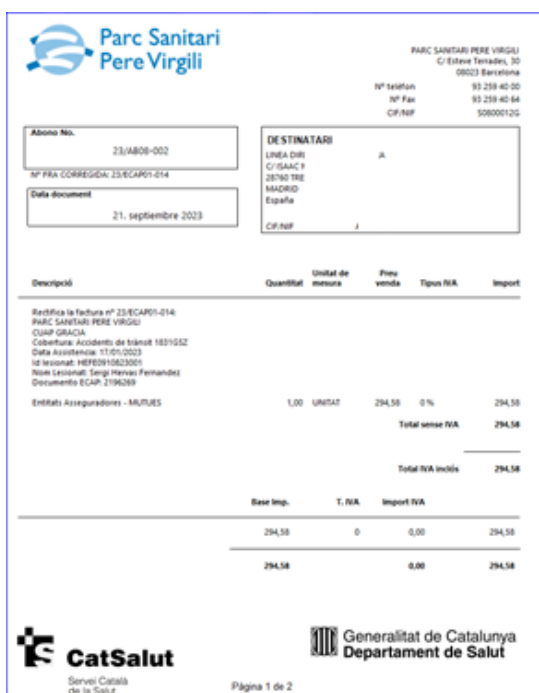

Parc Sanitari Pere Virgili
PARC SANITARI PERE VIRGILI
C/ Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona
Nº telèfon 93 239 40 00
Nº Fax 93 239 40 64
CIF/NIF S0600012G

Abono No. 23/AB08-002
Nº FPA CORREGIDA 23/ECAP01-014
Data document 21. septiembre 2023

DESTINATARI
LINEA DIB
C/ ISAAC P
28760 TRE
MADRID
Espanya
CIF/NIF J

Descripció	Quantitat	Unitat de mesura	Preu venda	Tipus IVA	Import
Rectifica la factura nº 23/ECAP01-014					
PARC SANITARI PERE VIRGILI					
CUAP GRACIA					
Cobertura: Accidente de tránsito 1631052					
Data Asistencia: 11.01.2023					
Id lesionat: HEPED910823001					
Nome Lesionat: Sergio Henao Fernandez					
Documento ECAP: 2196269					
Entitats Asseguradores - MUTJES	1,00	UNITAT	294,58	0%	294,58
Total sense IVA					294,58
Total IVA inclòs					294,58
Base Imp.					294,58
T. IVA					0
Import IVA					0,00
Total IVA inclòs					294,58

CatSalut
Servei Català de la Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Pàgina 1 de 2

4.4 Facturació

Actualment es fan servir numeracions diferents per les factures assistencials, encomana de gestió, altres serveis assistencials i resta, per tal d'organitzar-les millor.

Molts dels clients de PSPV són entitats públiques que requereixen de l'enviament de les factures en format electrònic per poder acceptar-les i realitzar el seu pagament.

Es requereix la integració amb l'estàndard definit per Hisenda face.gob.es, actualment es realitza a través de la plataforma externa *B2B Router* ©.

Tanmateix es requereix la impressió en paper i gestionar l'enviament través de correu electrònic.

Es realitza una facturació periòdica per la cessió d'ús, pels serveis que realitzen els diferents departaments. En aquesta cessió d'ús trobem dades de comptabilitat que es distribueixen segons un criteri marcat i altres dades no comptables (llum, informàtica, ...). Actualment es fa amb un full de càlcul.

4.5 Magatzem

A continuació es defineix la funcionalitat que s'utilitza a NAV:

- Funcionalitat de doble calaix.
- Documents de reubicació.
- Documents de picking.⁷
 - Doble Calaix
 - Peticions automatitzades (web-Intranet)
 - Peticions manuals
- Processos de recepció, es fan directament des de la comanda de compra al magatzem principal a la ubicació de recepció, com a pas previ a la ubicació final.
- Integració amb carrusel horitzontal *Ulises Smart* ©: sincronització base de dades SQL Server amb les següents tasques:
 - Entrada / Sortida de Producte.
 - Control d'estocs.

Actualment no s'utilitza la funcionalitat estàndard de magatzem per la generació de Pickings i ubicació al tractar-se d'un circuit a mida per la gestió del doble calaix i la integració amb el carrusel horitzontal. Es a dir, per facilitar les tasques de magatzem, tot moviment de producte es fa mitjançant documents adaptats per simplificar i estalviar passos, respecte el que suposaria fer-ho a través de les pantalles estàndard de NAV.

Es important remarcar que PSPV defineix el seu moviment de producte sota processos propis i no amb el mòdul de vendes, projectes o producció que seria el circuit "convencional" en qualsevol altre sector.

4.6 Planificació dels recursos

Actualment NAV disposa del mòdul per a la gestió d'actius fixes.

Aquest mòdul cobreix tot el procés de vida dels elements d'immobilitzat integrant amb la comptabilitat tots els moviments de compra, venda, amortització i baixes que es puguin realitzar.

L'usuari disposa d'una fitxa d'actiu per cada element d'immobilitzat des d'on es pot consultar i gestionar tota informació associada i realitzar les corresponents amortitzacions. A més a més es poden imprimir diferents informes de control dels actius de les amortitzacions, informació del

tipus i valors d'amortització de cada element i valor net comptable resultant a partir de les compres, amortitzacions, baixes, etc. de cada actiu.

A PSPV alguns actius es volen tractar de manera agrupada (equipaments) de cara a les compres i amortitzacions, però tenir controlada la seva ubicació de manera individual o de cara a possibles baixes.

4.7 Comptabilitat analítica

Actualment la comptabilitat analítica i financera es realitza via moviments comptables i no s'havia considerat la necessitat d'incorporar la funcionalitat de comptabilitat de costos.

La comptabilitat analítica es fa en funció de distribucions definides a centres de cost (CECO's). Aquests centres de cost són valors de dimensions associats a combinacions d'altres dimensions com són els edificis, les plantes i les àrees.

5 Descripció del servei

5.1 Anàlisi funcional

L'objectiu es validar tots els requeriments necessaris per dur a terme l'actualització incloent l'adaptació dels desenvolupaments actuals i dels nous que es proposen. Cal:

- Verificar els requeriments per poder fer l'actualització.
- Identificar tasques a fer tenint en compte les funcionalitats existents descrites a 4 Situació actual i les noves prestacions per la nova versió Business Central
- Identificar tasques a fer tenint en compte les noves funcionalitats descrites a per la nova versió Business Central i que poden generar algun desenvolupament.
- Dimensionar la durada de les tasques
- Planificar i prioritzar les tasques conjuntament amb el Parc Sanitari Pere Virgili
- Consensuar i identificar els recursos necessaris i documentar cadascuna de les parts

El termini màxim es de **4 setmanes** i caldrà que es presenti un document per validar amb la planificació i priorització prevista.

5.2 Actualització a la versió Microsoft Dynamics 365 Business Central (on premise)

Tal com s'ha descrit en el punt 4 *Situació actual*, el programari permet:

- Gestionar l'activitat de l'organització relativa al processos empresarials de l'entitat.
- Accés a tota la informació de forma fiable, precisa i oportuna (integritat de dades).
- Possibilitat de compartir informació entre tots els components de l'organització.

Mitjançant els següents mòduls, els quals, després de diferents evolucions gestionen:

- Comptabilitat per la gestió del pla general comptable (PGC), Dimensions, IVA, Impostos, Gestió de nòmines i pagaments.
- Comptabilitat analítica que inclou entre d'altres: gestió per centre cost.
- Actius que inclou entre d'altres, gestió d'equipaments
- Compres per la gestió de fitxa de proveïdors, fitxa de producte, ofertes, comandes de compra, albarans i factures.
- Vendes que inclou entre d'altres: facturació.
- Magatzem que inclou entre d'altres: gestió doble calaix, integració carrusel, gestió farmàcia.

Les funcionalitats que requereixin desenvolupament específic seran segons les especificacions del [Codi Universal de BC](#).

5.2.1 Gestió financera

- a) Conciliació apunts comptables: Funcionalitat per marcar aquells moviments que estiguin compensats i, per tant, els moviments no marcats seran els que composaran el saldo viu del compte fent així que sigui més senzill el seu control.
- b) Automatització del càlcul de prorrata: es requereix un càlcul i ajust del percentatge definitiu de prorrata, definir la declaració de IVA excloent els moviments de prorrata, diferenciar els tipus de prorrata i calcular el percentatge de IVA no deduïble aplicable a un exercici.

A nivell de definició seguirà les següents regles:

Combinacions d'edifici, planta i/o àrea. De forma estàndard es pot informar de manera obligatòria aquestes dades als comptes de despesa que interressi mitjançant les ja esmentades dimensions. Cal ampliar aquesta funcionalitat per a poder definir un quadre on establir els percentatges de prorrata a aplicar segons les combinacions de dimensions requerides, i que sigui automàtic als documents de compra.

A nivell d'automatització seguirà les següents regles:

- Quan la compra sigui d'un producte o actiu i la combinació edifici, planta, àrea tingui definida prorrata, s'ha de tenir en compte que el cost del producte ha de reflectir el major cost que implica la prorrata (cost de compra + prorrata).
- Quan es tracta d'una compra intracomunitària també s'ha de tenir present la prorrata a l'import que es calculi d'IVA deduïble. Pel que fa a l'IVA repercutit, aquest ha de ser del 100%.
- Quan es reverteix o es realitza un abonament, Navision ha de seguir les mateixes regles que quan es tracta de factures positives.
- Quan es copien línies d'abonament, Navision ha de recollir el tipus IVA de la factura inicial de la qual volem abonar.

A nivell de consulta s'ha de tenir en compte incloure:

- A les estadístiques dels documents el desglossament necessari: base imposable, IVA no deduïble, IVA deduïble, total IVA i total factura.
- Al llibre de factures rebudes, per tal de facilitar posteriors auditories, han d'incloure prorrata inicial i prorrata final.

Es requereix un informe per poder disposar de l'import de IVA realitzat a nivell comptable (model 390).

- c) Càlcul automàtic i informe IRPF: es requereix càlcul automàtic IRPF per aquells professionals que ho tinguin definit, així com la generació de l'informe corresponent (model 111).

Es requereix un informe per poder disposar de l'import de les retencions realitzades a nivell comptable referent a professionals i personal.

- d) Llibre de factures emeses i rebudes: es requereix afegir la visió de la prorrata dintre del informe estàndard i poder disposar d'un subtotal per combinació de grup de registre IVA negoci i producte, amb els imports calculats. Han de complir estàndards definits per Hisenda.


- e) Re facturació de serveis: es requereix una facturació recurrent pels diferents serveis realitzats pel PSPV als clients ubicats a les seves instal·lacions.

Les característiques són:

- Es facturen conceptes fixes i variables mensual (espais, materials, consums de telefonia, llum, aigua, ...) i anualment.
 - Cadascun d'aquests conceptes tenen com criteris de repartiment percentatges d'ús, coeficients de repartiment,... També es requerirà una nova entitat per reflectir els conceptes que s'han de facturar, fixes i variables segons imputació comptable (combinació de comptes comptables i dimensions).
 - Aquesta informació ha de recollir-se des de les factures / comandes rebudes al Parc Sanitari Pere Virgili i importar-se mitjançant una plantilla Excel, per agilitzar la càrrega de conceptes variables.
 - Cal poder aplicar IVA o no en funció de les característiques de l'Entitat receptora de la factura.
- f) Modificacions de factures registrades: es requereix poder modificar el text de registre a les factures i abonaments de venda i portar aquesta modificació als moviments comptables i moviments de client associats a ella.
- g) Informació compte bancari segons forma de pagament: es requereix poder definir diferents formes de pagament (transferència bancàries, remesa, efectiu) i en cas de transferència incloure el compte bancari propi del PSPV sobre el que s'ha de fer el pagament.
- h) Integració aplicació factura electrònica: es requereix solució estàndard o integració amb proveïdor per la emissió (factura i abonament) de la facturació electrònica.

5.2.2 Compres

- a) Informació de costos: per millorar la gestió dels costos de producte, es requereix afegir una informació addicional:
- Cost estàndard: aquest cost es calcularà segons la següent fórmula: tarifa de compra del proveïdor predeterminat – Descompte estàndard + IVA Cost.
 - Cost tarifa: aquest camp es visualitzarà la tarifa de compra del proveïdor associat per defecte a la fitxa del producte. Si no hi ha tarifa vigent, es mostra la més actual.
 - Últim cost: aquest camp mostrarà el cost unitari de la última factura de compra del producte incloent-hi, si hi va haver, l'IVA cost.
- b) Format d'impressió de comanda de compres: es requereix disposar de la comanda personalitzada amb les dades i textos de peu de pàgina necessaris que apareixen a la imatge:

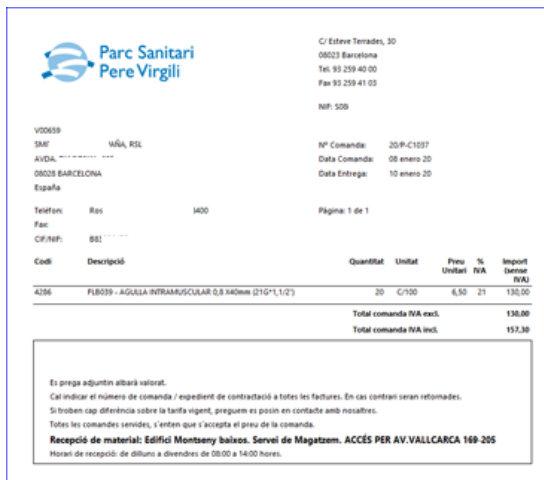

**Parc Sanitari
Pere Virgili**

C/ Esteve Terrades, 30
08023 Barcelona
Tel: 93 259 40 00
Fax: 93 259 41 03
NIF: 509

V00039
SMF: WVA, RSL
AVDA: 08023 BARCELONA
Espanya
Telèfon: Res
Fax: 9400
CIF/NIF: B61

Nº Comanda: 20/P-C1037
Data Comanda: 08 enero 20
Data Entrega: 10 enero 20

Página: 1 de 1

Codi	Descripció	Quantitat	Unitat	Preu Unitari	% IVA	Import (sense IVA)
A286	FIBRO39 - AGULLA INTRAMUSCULAR 0,8 x40mm (21G*1,1/2)	20	C/100	6,50	21	130,00
Total comanda IVA exc.						130,00
Total comanda IVA inc.						157,30

Es prega adjuntar albarà valorat.
Cal indicar el número de comanda / expedient de contractació a totes les factures. En cas contrari seran retornades.
Si troben cap diferència sobre la tarifa vigent, preguem es puguin en contacte amb nosaltres.
Totes les comandes serveis, s'entén que s'accepta el preu de la comanda.
Recepció de material: Edifici Montseny baixos. Servei de Magatzem. ACCÉS PER AV.VALLCARCA 169-205
Horari de recepció: de dilluns a divendres de 08:00 a 14:00 hores.

- c) Full de demanda: es requereix emprar la compra com a sistema de reaprovisionament, mitjançant el model de mínim-màxim, que s'extreu de la fitxa de producte: estoc màxim i Punt de Comanda i determina la proposta de la quantitat a demanar al proveïdor. També a la fitxa del proveïdor cal indicar l'import mínim de comanda i cal indicar a la fulla de demanda aquelles propostes que no arriben a l'import mínim establert pel proveïdor i evitar, així fer la compra.
- d) Gestió de consums: es requereix implementar una solució única, independentment de la ubicació (Atenció intermèdia o CAP), que permeti gestionar les peticions i disposar de l'estoc en el moment de la petició, així com fer retorn i seguiment de la petició.
Caldrà utilitzar un catàleg únic de productes.
- e) Desfer albarans de compra: Es requereix poder desfer línies d'albarans (no facturats) tipus producte, recursos (serveis) o compte comptable. S'haurà d'informar al sistema que aquella quantitat de producte no ha entrat a l'estoc i deixar la comanda associada de nou pendent perquè pugui ser modificada o eliminada si fos necessari.
- f) Conformació d'albarans: Es requereix poder desfer línies d'albarans (no facturats) tipus producte, recursos (serveis) o compte comptable. S'haurà d'informar al sistema que aquella quantitat de producte no ha entrat a l'estoc i deixar la comanda associada de nou pendent perquè pugui ser modificada o eliminada si fos necessari.
- g) Gestió farmàcia: es requereix actualitzar i validar parametritzacions, automatismes i desenvolupaments realitzats per integrar la gestió de la compra i dels estocs de fàrmacs des de SSII Farmàcia i des de magatzem vertical (ambdós bidireccionals).

5.2.3 Magatzem

- a) Circuit doble calaix planta: per la gestió del reaprovisionament de material sanitari per part d'infermeria es requereix millorar la gestió del doble calaix de planta, automatitzar la gestió d'estocs (sortides) mitjançant una aplicació capaç d'integrar els moviments d'entrada i sortida de material amb BC.
Es requereix que el procés sigui el màxim autònom possible i eviti la intervenció de personal per la lectura de codi de productes consumits: personal de magatzem, per l'Atenció intermèdia (tant a la reposició de productes a control d'infermeria) i altre personal a l'Atenció

Primària. Caldrà que l'accés a la lectura sigui parametrizable segons serveis, unitat o equipament.

- b) Circuit d'ubicació i Picking: es requereix la generació de documents de treball de magatzem per la gestió d'ubicació a carrusel o estanteries segons la tipologia de producte i la seva sortida via Picking per les necessitats dels controls d'infermeria o magatzems externs.
- c) Lots i caducitats: es requereix parametritzar la possibilitat d'activar la gestió de lots i caducitats en alguns productes
- d) Recepció mercaderies: actualment la recepció de mercaderies es realitza de forma manual: els personal de magatzem repcepciona físicament el producte i valida el contingut; posteriorment Compres realitza la validació a l'ERP Navision. Es valorarà disposar de l'equipament i /o tecnologia que permeti la validació contra el sistema i obviar el registre manual i posterior transcripció.

5.2.4 Planificació dels recursos

- a) Equipaments: es requereix associar a la fitxa d'un únic actiu a (n equipaments que seran cadascuna de les unitats que el componen. Cada unitat tindrà definida la seva ubicació (edifici, planta i àrea i aquelles dimensions que es requereixin) i estarà identificada per un número de sèrie que s'imprimirà en etiquetes. A tots els documents (processos) on es faci servir l'actiu es guardarà la informació corresponent als equipaments que el componen, incloent 'hi:
 - En el cas de desfer un albarà amb equipaments associats, s'informarà en aquests equipaments la data de retorn per a millor traçabilitat.
 - En el cas de baixa (**procés molt crític**), l'usuari tindrà la possibilitat de donar de baixa fàcilment una unitat concreta de l'equipament indicant el seu número de sèrie, moment en que el sistema la marcarà com donada de baixa i farà internament la corresponent depreciació de l'actiu per a tenir-la en compte a posteriors amortitzacions.
- b) Informe comparatiu: es requereix disposar d'un informe comparatiu entre la informació comptable i la planificació de recursos (inventari).
- c) Valorar la integració amb el software d'actius del PSPV (GLPI).

5.2.5 Comptabilitat analítica

- a) Importació de nòmines i planilles: es requereix una integració de les dades del software de RRHH (Denario) per tal de generar els corresponents apunts comptables a través del seu registre des de diaris.

S'importen les dades de nòmina de RRHH: Data, Núm. Document, Núm. Compte comptable, Import Devem, Import Haver, Codi treballador.

Es genera un excel amb el dimensionament dels codis de treballador per dimensió (Edifici, Planta, Àrea i Codi Pressupost) i el percentatge d'ocupació per cada dimensió.

S'importen les dades a Navision obtenint els assentaments a registrar, inclouen el desglossament de comptes amb les dimensions informades replicant totes les línies de despesa tantes vegades com percentatge d'ocupació tingui el treballador.

Exemple

<i>Data</i>	<i>Codi Treballador</i>	<i>Edifici</i>	<i>Planta</i>	<i>Area</i>	<i>Pressupost</i>	<i>Percentatge</i>
30/04/2025	T9999	LL	0	ADM	PR25-D4006	50
30/04/2025	T9999	XA	0	ADM	PR25-D4006	50

5.2.6 Reporting

- Actualment es disposa de reports elaborats amb excel i Power BI que caldrà migrar a la nova versió i validar el seu funcionament.
- Es disposa de informes personalitzats que caldrà adaptar a noves necessitats i adequar a normatives actuals:

- Tancament econòmic mensual:

Comparativa de la comptabilitat actual versus la comptabilitat de l'any anterior, així com dels diferents pressupostos introduïts. Es requereix la possibilitat de fer comparatives filtrant per dates i/o les diferents dimensions:

- Atenció Intermèdia.
- Atenció Primària: CAP Larrard, CAP Vila Olímpica, CAP Barceloneta, CUAP Gràcia.
- Rehabilitació Vila Olímpica.
- Cessió ús
- Projectes innovadors

Model d'informe:

Tancament Econòmic Financer 2023								
At. XXXXX	11							
MES								
	Pressupost 2023 cumulat NOVEMBR	Compt. ANY 2023 Acumulat NOVEMBRE	Diferència	% Diferència	% Dif mes anterior		Pressupost 202X	
		Compt. Acum						
Ingressos Assistencials	- 0 €		- 0 €	0.00%	0.52%		- 0 €	
1. Prestació Serveis CATSALUT	- 0 €			0.00%	-0.15%			
Sistema pagament Sociosanitari (70%)	- 0 €		- 0 €	0.00%	0.00%			
1. Sobrecost 2,4%	- 0 €		- 0 €	0.00%	-2.09%			
1. Programa DPO	- 0 €	- 0 €	- 0 €	0.00%	0.00%			
2. Prestació Serveis EVO-SEVAD	- 0 €		- 0 €	0.00%	0.53%			
Prestació Serveis Asseguradores i Particulars	- 0 €		- 0 €	0.00%	412.47%			
Prestació altres serveis assistencials	- 0 €		- 0 €	0.00%	3.55%			
Ingressos Docència, Investigació i Recerca	- 0 €		- 0 €	0.00%	2.32%			

- Liquidació Pressupostari

Partida pressupostaria per compte comptable que permeti el desglossament per AI, AP, CU, RVO, projectes innovadors (ampliables segons activitats Parc Sanitari Pere Virgili).

Model d'informe

			
PRESSUPOST CATSALUT XXXX			
Pressupost d'Ingressos ANY	codi funcional	412	411
Descripció	PPTO 2024 CATSALUT AGREGAT	AI	AP
CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS			
317.0001 /0000 Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut Prestació Serveis CATSALUT Sobrecost 2,4% DIPO nova activ docència 2ª sem 23ª rec. 1ª sem 24			
317.0009 /0000 Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària (particulars, mütues...)			
318.0004 /0000 Prestació de serveis d'assistència social i sociosanitària.			
319.0009 /0000 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del SP			
319.0010 /0000 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del SP			
399.0009 /0000 Altres ingressos diversos			
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
430.5100 /0000 Del Servei Català de la Salut (transferència corrent) Personal Transferit Subv. Exploració serv. Comuns Cessió ús Subv. Exploració Edif. Garbí Projectes Transformadors (ADMIT i PIONEER)			
460.0009 /0000 Altres transferències d'ajutaments (Ajuntament de Barcelona)			
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS			
831.5100 /0000 Aportacions de capital del Servei Català de la Salut FIV Grans correctius Projecte CAP Barcelona Subvenció de Capital ADMIT/PIONEER			
870.0001 /0000 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors			
PPT Ingressos ANY PSPV			
Pressupost de Despeses ANY			
Descripció	PPTO 2024 CATSALUT AGREGAT	AI	AP
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL			
ART. 13 PERSONAL LABORAL			
CONCEPTE 130 Personal Laboral (fix)			
130.0001 /0000 Retribucions bàsiques personal laboral fix			
130.0002 /0000 Retribucions complementàries			
CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral			
131.0001 /0000 Retribucions bàsiques personal laboral temporal Resto ADMIT			
131.0002 /0000 Retribucions complementàries			
CONCEPTE 132 Personal Laboral d'alta direcció i societat			

- Consums materials sanitaris

Extracció d'informació sobre les quantitats de productes consumits per dates, edificis, plantes i àrees.

Model d'informe

Consums Hospitalització Infermeria													Estadís Agrupats per PR											
Només està permès modificar els filers per afegir o treure dimensions d'hospitalització infermeria													Dades Econòmiques i Unitats Consumides											
Entitat	Entitat de G. L. L. M. S.												ESTADIS AGRUPATS PER PR											
Àrea	Àrea de G. L. L. S. L. S.												PR001 PR002 PR003											
	Codi Producte												PR001 PR002 PR003											
Subvenció	Codi Producte	Dades Econòmiques				Unitats Consumides				Rati Econòmic Estadís				Rati Unitats Estadís										
		2021	2022	Increment	Inc %	2021	2022	Increment	Inc %	2021	2022	Deur	2023	Deur	2021	2022	Deur	2023						
ABSORVENTS INCONTINÈNCIA	PR00174 BRAGA TANGIL TAP DSA	1.087.132 €	7.737.219 €	2.448.137	22,53%	8.085.356 €	988.27	4,95%	12.750	18.100	6.350	47,91%	17.550	220	1,17%	0,048	0,303	0,021	0,048					
	PR00175 BRAGA TANGIL TAP DSA	3.015.11 €	10.986.76 €	2.274.60	20,14%	15.259.10 €	6.192.30	38,61%	8.240	21.100	12.860	154,41%	31.460	9.380	29,51%	0,054	0,198	0,054	0,198					
	PR00190 BOLQUER ADULT TALLA MPTIANA	19.808.61 €	18.306.97 €	-1.501.64	-8,59%	24.967.08 €	5.930.11	23,86%	89.300	75.140	-14.160	-15,13%	74.660	1.080	1,43%	0,188	0,163	-0,025	0,362					
	PR00191 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 3	32.444.08 €	44.566.42 €	12.122.34	37,37%	47.788.04 €	3.219.61	7,27%	147.300	161.420	14.120	9,59%	169.280	14.040	8,30%	0,260	0,401	0,141	0,401					
	PR00192 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 4	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00193 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 5	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00194 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 6	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00195 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 7	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00196 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 8	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00197 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 9	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00198 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 10	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00199 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 11	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00200 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 12	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00201 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 13	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00202 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 14	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00203 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 15	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00204 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 16	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00205 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 17	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00206 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 18	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00207 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 19	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00208 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 20	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00209 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 21	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00210 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 22	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00211 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 23	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00212 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 24	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00213 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 25	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00214 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 26	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00215 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 27	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00216 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 28	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00217 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 29	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00218 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 30	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00219 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 31	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00220 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 32	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00221 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 33	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00222 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 34	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00223 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 35	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00224 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 36	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00225 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 37	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00226 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 38	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00227 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 39	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00228 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 40	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00229 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 41	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					
	PR00230 BOLQUER ADULT TALLA GREN T 42	4.015.01 €	4.963.72 €	948,72	23,63%	6.229.31 €	3.441.19	55,40%	14.080	15.180	1.100	7,81%	19.160	4.080	21,35%	0,038	0,162	0,124	0,162					

Model d'informe:

Seguiment pressupostari Organització i Comunicació								
Tipus Pressu	Despesa							
		a.	b.	c.	D= (a+b+c)		E	E-D
Codi Pressu	Descripció Pressupost	Comandes	Albarans	Comptabilitat	Imputat	Press. Mes	Press. Anual	Disponible
PR22-D5201	Aparicions mitjans i difusió AP	101.00		49.00	150.00			
PR22-D5203	Innovació tecnològica - Nous projectes AP							
PR22-D5204	Imatge Interna AP							
PR22-D5209	Assistencial - ARGOS AP							
PR22-D5218	Línies de dades AP							
PR22-D5220	Còpies, manteniments, ... AP							
PR22-D5222	Material menor telefonia AP							
PR22-D5223	Consum telefonia fix AP							

5.2.7 Migració de dades

Es migraran les dades per:

- Mantenir l'històric de dades sense haver de dependre de la versió actual i poder realitzar la posta en marxa sense requerir esperar a l'inici d'un període comptable o haver de barrejar dades comptables dels dos sistemes a l'hora de presentar impostos.
- No s'han detectat canvis substancials en el funcionament que impliqui valorar iniciar amb saldos d'apertura enlloc de realitzar la migració.
- Consolidació de dades a partir de 5 anys.

5.2.8 Pla de contingència

Definició d'un conjunt de mesures tècniques i organitzatives que garanteixin la continuïtat de les tasques diàries en l'ERP en cas d'error greu en el funcionament de producció. Implica generació informes de forma automàtica i programada.

5.2.9 Pla de formació

Es requereix disposar de Pla de Formació en l'ús de l'eina segons:

- Àmbit de treball:
 - Adreçat a departament Economicofinancer. Incidint en Gestió financera, Compres, Vendes, Magatzem, Planificació de recursos, Comptabilitat analítica, Gestió de farmàcia, Reporting.
 - Adreçat a departament TIC. Incidint en les tasques que garanteixin una correcta operació del servei, com per exemple: Manteniment del servidor, còpies de seguretat, neteja de registres, optimització de la base de dades, parametrització, anàlisis del rendiment, diagnòstic i resolució dels problemes. Tanmateix qualsevol altra formació d'interès per a mantenir en òptim estat de funcionament del servei, garantint la seva disponibilitat en les millors condicions de rendiment.
 - Altres necessitats particulars.
- Perfil de l'usuari:
 - Usuari final
 - Usuari avançat
 - Usuari TIC

El Pla de formació haurà d'incloure els tipus de cursos, durada, nombre de sessions, continguts, documentació a l'inici de les sessions, número i perfil dels assistents, així com aquells aspectes no especificats i que es determinaran d'acord amb les necessitats pel PSPV. No es preveu més de 50 usuaris en total.

S'hauran d'incloure com a mínim dues sessions anuals pels administradors i usuaris per tal de garantir la formació contínua en l'ús i administració de Navision que es tradueixi en una optimització màxima de les possibilitats d'explotació de l'aplicació.

5.3 Llicenciament i manteniment

5.3.1 Llicenciament

A continuació, es detalla la composició actual de la llicència de tipus "On Premise":

Descripción del módulo	Cantidad
350 Starter Pack	0
360 Extended Pack	0
450 Full Concurrent User CAL	5
450 Full Concurrent User CAL - Upgrade	9
8200 Tables (10)	50
8350 Pages (100)	200
8400 Reports (100)	100
8600 Codeunits (100)	100
Country Code: Spain	0

5.3.2 Manteniment

Aquest manteniment ha de donar accés a totes les actualitzacions normatives i de seguretat, noves versions del producte així com esmenes als errors del producte. Concretament ha d'incloure:

- Manteniment normatiu: accions realitzades pel fabricant per introduir funcionalitats derivades de canvis legislatius i d'obligat compliment.
- Manteniment correctiu: actuacions realitzats pel fabricant per resoldre errors dels programes en producció, reportats pel client, altres clients o bé pel propi control de qualitat del fabricant.
- Manteniment evolutiu: actuacions realitzades pel fabricant per introduir als programes noves funcionalitats o millores de les actuals. Aquestes actualitzacions seguiran les recomanacions del fabricant i la valoració de l'adjudicatari per validar l'adequació de l'actualització.

Cal garantir l'actualització de versions acumulatives segons recomanacions del fabricant.

5.4 Servei de suport

Al Parc distingim dos tipificacions: incidències i peticions.

5.4.1 Incidències

Entenem per incidències tiquets que es generen per mal funcionament d'algun element TIC. Requereixen una resolució prioritària perquè afecten al lloc de treball o als sistemes. Poden incloure les alertes de monitorització del sistema.

Es proposen els següents nivells de criticitat:

- **Alta**

Tiquets que per la seva tipologia impedeixen el funcionament correcte de l'aplicació o requisit/peticions que es consideren molt crítiques per a l'organització.

- **Mitja**

Tiquets que s'han de resoldre i que tenen afectació al funcionament diari o requisits/peticions que es consideren crítiques per a l'organització.

- **Baixa**

Tiquets que s'han de resoldre però que no tenen una afectació al funcionament diari o requisits/peticions que NO es consideren crítiques per a l'organització.

Els temps de resolució mínims són:

Àmbit	Paràmetre	Criticitat	Temps màxim
Resolució tiquets	Temps de resolució	Alta	< =4 hores naturals
		Mitja	< =3 dies naturals
		Baixa	< =7 dies naturals

5.4.2 Peticions

Tiquets que recullen consultes funcionals, millores, migracions o modificacions.

Poden estar compostats per diferents peticions.

El temps de resposta ha de ser de **3 dies laborables**. En aquesta resposta caldrà incloure la viabilitat de la petició, la previsió d'execució i els requeriments de informació necessaris.

En cas d'acceptar-se per part del PSPV, es farà constar així com l'estimació de dedicació.

5.4.3 Funcions

- Resoldre incidències relacionades amb el funcionament del software.
- Ajuda de correcció de dades, introduïdes erròniament en el sistema i que no es puguin corregir pels mètodes habituals que proporciona l'aplicació.
- Actualització de les dades que s'han de corregir.
- Parametrització del sistema. Configuració de noves funcionalitats del sistema i posada en marxa de les mateixes.
- Suport en actuacions de caràcter formatiu puntual que no requereixin d'una formació reglada i puguin ser impartides en remot.
- Adaptacions específiques que PSPV precisi i que doni resposta a requeriments interns i/o externs que afectin a l'organització.

El servei de suport el realitzarà l'equip de consultors de l'empresa adjudicatària, en remot. Qualsevol modificació caldrà consensuar-la amb el cap de projecte del Parc Sanitari Pere Virgili o en qui designi. Caldrà que el servei de suport disposi dels recursos necessaris per a poder establir comunicació amb el PSPV i visualitzar allò que es precisi amb les mesures de seguretat i protecció de dades que s'estableixin.

El servei de suport assumeix el seguiment de totes les demandes que rebi fins que les hagi resolt correctament, així com disposar d'una base de dades del coneixement (que inclou eina de tiqueting, documentació relacionada, reportings, ...), compartida per les dues oficines que s'anirà alimentant amb la informació que es vagi recollint en cada cas nou.

El Parc Sanitari no aportarà cap maquinari derivat de l'eina de gestió de la base de dades de coneixement que porti el licitador.

Per assolir aquestes servei s'ha previst un **total de 100 hores anuals** a un import d'hora no superior als 80,00 € (IVA no inclòs). El nombre d'hores serà objecte de valoració i negociació durant el procediment de licitació.

Aquestes hores tant poden ser de suport com de desenvolupaments menors seguint aquest rati:

- Hores de suport, es tarifaràn per franges de 15 minuts.
- Hores de desenvolupament menor, es tarifaràn per franges d'1 hora, sempre sota aprovació del cap de projecte.

El servei de suport assumeix l'obligació d'informar al Parc Sanitari Pere Virgili, quan es produeixi una incidència rellevant per la criticitat, complexitat o afectació.

Es requeriment estimar el temps necessari per la resolució o desenvolupament així com la validació per part del PSPV. Es requereix disposar de reporting actualitzat (com a mínim 1 cop a la setmana) de les hores consumides, previstes, restants així com nombre de tiquets que permeti filtrar per oberts, en curs o tancats; data creació i antiguitat; hores consumides per tiquet així com aquells paràmetres que s'acordin conjuntament.

PSPV no resta obligada a exhaurir aquest número d'hores. Es consumiran segons les necessitats que es requereixi des del departament Econòmic Financer coordinat amb el Departament d'Organització i Comunicació del PSPV. En cas que no s'exhaureixin en el curs de l'any natural, passaran a l'any següent.

6 Requeriments

- Tots els treballs hauran de desenvolupar-se en el marc de la legislació vigent aplicable en matèria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions per a l'entorn d'un Campus o Parc.
- El Parc facilitarà a l'adjudicatari tota la informació requerida corresponent a la situació actual en infraestructures, sistemes actuals, organització, responsables i interlocutors, etc., per tal de garantir l'optimització en la planificació del servei requerit.
- L'adjudicatari facilitarà la visita i examen de qualsevol procés o fase del Servei, estant obligat a subministrar quanta informació tècnica li sigui requerida i jurídicament resulti possible.
- És requeriment del projecte la presència física al centre, com a mínim, un dia a la setmana, durant totes les fases del projecte. El personal de l'empresa licitadora s'ubicarà a l'espai que s'indiqui a les dependències del Parc Sanitari Pere Virgili.
- Totes les actuacions que impliquin un tall o risc de tall en algun dels serveis del PSPV es durà a terme fora d'horari de treball, que seria entre les 20 hores i les 8 hores, sempre amb el vistiplau del PSPV. No s'acceptaran costos addicionals per aquestes actuacions.
- Els projectes d'actualització dels mòduls de l'aplicació s'hauran de portar a terme seguint una metodologia de gestió que permeti determinar un Pla del projecte que indicarà les fases a abordar, les activitats a realitzar en cada fase, la durada prevista i la implicació per part PSPV, detallada.
- El licitador haurà de definir el Pla de posada en marxa i suport, amb tots els aspectes i temes a tenir en compte durant el moment de la posada en marxa efectiva del nou Sistema, les hores prèvies i les hores posteriors.
- Aquest pla, haurà d'incloure necessàriament una sèrie de subplans per a les diferents àrees afectades pel canvi de Sistema:
 - Pla de tall d'operacions.
 - Definició de l'escenari de treball i tasques a realitzar: adaptació dels sistemes del PSPV als nous procediments, fluxos de treball i models de dades definits; recursos humans tant de PSPV com del licitador i materials necessaris.
 - Pla de contingència.
 - Accions de contingència a considerar en les diferents àrees per fer front a possibles imprevistos durant la posada en marxa del nou sistema.
- Caldrà concretar els circuits de comunicació d'incidències i sol·licituds de suport, els horaris d'atenció (horari d'oficina i del servei de guàrdia), els canals de comunicació (aplicació web, telèfon, telèfon mòbil), el nivell de criticitat (alt, mig, baix) i tots aquells aspectes a considerar en aquest moment.

6.1 Model de relació

L'empresa contractista i el PSPV constituïran, com a mínim, un Comitè de Direcció i un Comitè de Seguiment. Totes les decisions adoptades per ambdós comitès seran d'obligat compliment per part de l'empresa contractista i del PSPV, vetllant pel correcte compliment del contracte i facilitant la presa de decisions d'alt nivell.

S'ha de considerar que és molt possible que s'hagin de realitzar desplaçaments a PSPV per part de l'equip de projecte del licitador, per a temes relacionats amb les diferents fases del projecte.

El licitador aportarà els mitjans tècnics que requereixi el seu equip de projecte per a poder realitzar les tasques necessàries durant el projecte (portàtil, telèfon mòbil, etc.).

Les despeses de desplaçament o dietes seran a càrrec del proveïdor, i s'hauran d'incloure dins del preu final de la licitació.

6.1.1 Perfils del Parc Sanitari Pere Virgili

En general per part del **PSPV** els membres i les seves funcions seran:

Cap de projecte ocupat per Direcció d'Organització i Comunicació (responsable del contracte).

- Gestionar el contracte amb l'empresa contractista.
- Coordinar-se amb la direcció funcional, el coordinador del projecte i l'equip de treball del PSPV.
- Acordar amb el responsable del projecte de l'empresa contractista les mesures de qualitat i resultats, i controlar la prestació del servei d'acord amb elles.
- Acordar amb el director del servei de l'empresa contractista mesures per solucionar qualsevol deficiència en la qualitat del servei.
- Acordar els procediments d'escalat de problemes i assegurar la resolució de problemes no resolts mitjançant els canals normals.
- Assegurar que el contractista compleixi amb els requeriments de protecció, confidencialitat i seguretat necessaris, realitzant quan sigui necessari les oportunes auditories.
- Revisió del compliment dels compromisos acordats en sessions anteriors

Responsable del projecte, ocupat per Cap Aplicacions

- Realitzar el seguiment i control regular de la consecució d'objectius.
- Realitzar un seguiment detallat de l'execució de les tasques planificades i el calendari previst.
- Proporcionar canals de comunicació adequats que permetin dur a terme les tasques necessàries per al projecte, tant amb els usuaris com amb les altres àrees del PSPV.

Tècnics àrea Aplicacions TIC:

- Realitzar un seguiment detallat de l'execució de les tasques planificades.
- Realitzar el seguiment i control regular de la consecució d'objectius.
- Oferir atenció especialitzada i coneixement sobre assumptes relacionats amb el funcionament i la utilització concreta dels serveis a migrar al PSPV.
- Proporcionar canals de comunicació adequats que permetin dur a terme les tasques necessàries per al projecte, tant amb els usuaris com amb les altres àrees del PSPV.
- Acordar procediments per a la gestió eficient dels canvis i controlar l'efectivitat dels mateixos, minimitzant l'impacte als usuaris.

6.1.2 Perfils de l'adjudicatari

Per part de l'**empresa contractista** els perfils que es requereixen son:

Responsable del projecte

- Es requereix:
 - o Enginyeria superior.
 - o Gestió de projectes.
 - o Experiència mínima demostrable de 5 anys en tasques similars.

- Les seves funcions són:
 - o Assegurar que l'empresa contractista compleixi les seves obligacions contractuals.
 - o Assegurar el compliment d'objectius i ANS.
 - o Assegurar la disponibilitat i el seguiment dels procediments de seguiment de resultats i la gestió del contracte.
 - o Escalar assumptes a la direcció de l'empresa contractista quan sigui necessari.
 - o Donar suport a l'especificació de qualsevol requeriment de servei addicionals i canvis d'abast davant del PSPV.
 - o Mantenir una preocupació proactiva pels objectius, millores tècniques i estratègiques de contracte.
 - o Resoldre de forma satisfactòria qualsevol assumpte de facturació o compatibilitat que pogués sorgir.
 - o Realitzar la coordinació efectiva amb el responsable de l'equip de treball de l'empresa contractista.

Cap de projecte i responsable de l'equip de treball, per part de l'adjudicatari.

Serà el màxim responsable del procés d'implantació per una banda i de garantir la correcta prestació del servei de suport i manteniment per l'altra, i realitzarà com a mínim les següents tasques:

- Es requereix:
 - o Enginyeria tècnica.
 - o Gestió i implantació de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
 - o Gestió i implantació de projectes similars.
 - o Experiència mínima demostrable de 3 anys en tasques similars.
- Les seves funcions són:
 - o Liderar el projecte.
 - o Interlocució i coordinació amb la direcció de projecte del PSPV.
 - o Planificació i seguiment de la implantació.
 - o Elaboració i entrega d'actes de les reunions de seguiment d'implantació.
 - o Garantir que la prestació del servei es realitza complint amb els paràmetres establerts en el present concurs.
 - o Gestió dels equips de treball.
 - o Gestió dels riscos detectats així com la presentació del pla de mitigació dels mateixos.
 - o Detecció d'oportunitats de millora.
 - o Entrega de documentació final d'implantació.
 - o Entrega d'informes de prestació del servei.
 - o Aquest recurs haurà de disposar de titulació universitària en enginyeria.
 - o Aquest recurs haurà de disposar de la certificació ITIL Foundation, valorable certificacions superiors.

Equip de treball

- Es requereix:
 - o Gestió i implantació de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
 - o Experiència mínima demostrable de 2 anys en tasques similars.
- Les seves funcions són:
 - o Situació escalat de peticions i incidències
 - o Escalat de peticions i incidències
 - o Detalls derivats de la resolució dels tiquets
 - o Documentació afegida o modificada a la Base de Dades de Coneixement de la solució aplicada - Dades de volum del servei

Es requereix dos perfils:

- o Esdevindran els responsables dels serveis professionals d'implantació sol·licitats.
- o Esdevindran els referents tècnics des del punt de vista del suport i gestió.
- o Entrega d'informes de prestació relatius a implantació i incidències.
- o Esdevindran l'escalat de les incidències i peticions a nivell més especialitzat o suport de fabricants.

6.2 Òrgans de gestió

S'estableixen els següent òrgans de gestió i es detalla el funcionament

6.2.1 Comitè de direcció

Seràn objecte del Comitè de Direcció les següents funcions:

- Seguiment de nivells de qualitat.
- Modificació d'acords de nivell de servei (ANS).

Els membres d'aquest comitè són: Per part del PSPV:

- Cap de projecte ocupat per Direcció d'Organització i Comunicació (responsable del contracte).
- Responsable del projecte, ocupat per Sots direcció TIC
- Coordinador del projecte, ocupat per Cap de Sistemes, Comunicacions i Ciberseguretat.

I per part de l'empresa contractista:

- Responsable del projecte.
- Responsable de l'equip de treball.

L'empresa contractista haurà de presentar previ a cada sessió de treball:

- Ordre del dia.
- Resum de l'estat de les instal·lacions indicant l'avançament i fites aconseguides, així com els problemes trobats relacionats amb la instal·lació i seguiment dels ANS.
- Informe descriptiu de l'execució del servei durant el període. L'informe de seguiment haurà de presentar-se en el Comitè de Direcció. Aquest document haurà d'incorporar com a mínim els següents punts:
 - Revisió acords i temes pendents comitè anterior i Visió global
 - Quadre de comandament global del servei

- Acords de Nivell de Servei i tiquets en garantia - Seguiment operatiu.
- Quadre d'indicadors tècnics per presentar la situació dels serveis per tecnologia i les propostes de millora de parametrització
- Informes de propostes d'optimització o evolució i Informes de noves necessitats.
- Aquests informes seran revisats per PSPV que podrà modificar l'estructura d'aquests informes en funció de nous paràmetres del servei que vulgui avaluar.
- De la mateixa forma es requeriment elaborar acta de seguiment posterior on constin els acords presos per poder fer-ne el seguiment.

La periodicitat de les reunions serà mensual durant la implantació i semestral pel servei de suport i planificació d'actuacions derivades d'actualitzacions del programari per part del fabricant.

Tots els documents, informació de recolzament i qualsevol tipus d'element obtingut en el desenvolupament dels treballs, seran propietat del PSPV.

Durant el procés de implantació, la periodicitat de les reunions dels comitès podrà veure's afectada per les necessitats concretes de la provisió i implantació dels serveis i s'hi haurà d'adaptar.

Durant el període d'explotació, la composició dels comitès de direcció i de seguiment pot ser diferent que la del període d'implantació

6.2.2 Comitè de seguiment

Seràn objecte del Comitè de Seguiment les següents funcions:

- Seguiment dels acords de nivell de servei (ANS).
- Generació d'informes.
- Coordinació d'accions.

La Comissió de seguiment té com objectius:

- La inspecció i control de la prestació del servei, anàlisi de l'activitat i seguiment detallat del projecte, de l'estat de situació i d'aquells aspectes del projecte que requereixen decisió operativa
- Informe de l'estat de situació de les activitats i les fites planificades.
- Revisió d'aspectes rellevants de la vessant tecnològica.
- Plantejament dels aspectes del projecte que requereixen decisions estratègiques.
- Propostes d'evolució funcional del sistema (línies de treball en curs i compromisos en calendari).
- Anàlisi i elaboració de propostes sobre altres aspectes que puguin influir el desenvolupament del projecte.

Els membres d'aquest comitè són: Per part del PSPV:

- Responsable del projecte, ocupat per Sots direcció TIC
- Coordinador del projecte, ocupat per Cap de Sistemes, Comunicacions i Ciberseguretat.
- Tècnic àrea TIC.

I per part de l'empresa contractista:

- Responsable de l'equip de treball.
- Tècnics assignats.

L'empresa contractista haurà de presentar previ a cada sessió de treball:

- Ordre del dia
- Informe descriptiu de temes tècnics i de coordinació tècnica del servei durant el període. Aquest document haurà d'incorporar com a mínim els següents punts:
 - Revisió acords i temes pendents comitè anterior.
 - Anàlisi situació:
 - Relació de temes tècnics:
 - o Descripció
 - o Estat
 - o Planificació
 - o Realització
 - o Responsable
 - o Impactes
 - o Dependències
 - o Riscos identificats i proposta de solucions
- Aquests informes seran revisats per PSPV que podrà modificar l'estructura d'aquests informes en funció de nous paràmetres del servei que vulgui avaluar.
- Relació de fets rellevants i el seu impacte en el nivell de servei. De la mateixa forma es requeriment elaborar acta de seguiment posterior on constin els acords presos per poder fer-ne el seguiment.

La periodicitat de les reunions serà setmanal durant la implantació i a posteriori mensual pel seguiment del servei de suport i planificació d'actuacions.

Tots els documents, informació de recolzament i qualsevol tipus d'element obtingut en el desenvolupament dels treballs, seran propietat del PSPV.

Durant el procés d'actualització, la periodicitat de les reunions dels comitès podrà veure's afectada per les necessitats concretes de la provisió i implantació dels serveis i s'hi haurà d'adaptar.

Durant tota la vigència del contracte, qualsevol canvi que es produeixi per part de l'empresa contractista a nivell d'interlocució o composició dels comitès serà correctament informada al PSPV amb una antelació mínima d'1 mes previ al canvi previst.

6.3 Equip de treball

Per tal de tenir un control de les incidències l'adjudicatari designarà un equip de treball responsable de la prestació del servei de forma que faciliti les interlocucions i la gestió de forma eficaç.

L'empresa adjudicador tindrà la potestat de revocar aquells membres de l'equip adjudicatari assignats al projecte que no compleixin els objectius establerts.

Els licitadors han de detallar els aspectes relatius a l'organització proposada per a la realització dels treballs requerits, la posada en marxa del servei, el desenvolupament del servei i la devolució del mateix a la finalització, sota la direcció del responsable del servei del Parc.

El Parc Sanitari Pere Virgili tindrà la potestat de revocar aquells membres de l'equip adjudicatari assignats al projecte que no compleixin els objectius descrit al paràgraf anterior.

L'equip de treball proposat pels licitadors ha de contemplar com a mínim els **perfils descrits al model de relació**.

Caldrà detallar de tots els perfils anteriors:

- El perfil professional requerit.
- Les fases del projecte en les que serà requerit.
- Les tasques a realitzar per part d'aquest.
- L'esforç necessari (temps de dedicació) per a realitzar aquestes tasques.
- El calendari de treball detallat per aquestes tasques/fases.
- Una planificació global del projecte per a visualitzar les càrregues de feina.

S'ha de considerar que és molt possible que s'hagin de realitzar desplaçaments a Parc Sanitari Pere Virgili per part de l'equip de projecte del licitador, per a temes relacionats amb les diferents fases del projecte.

El licitador aportarà els mitjans tècnics que requereixi el seu equip de projecte per a poder realitzar les tasques necessàries durant el projecte (portàtil, telèfon mòbil, etc.).

Les despeses de desplaçament o dietes seran a càrrec del proveïdor, i s'hauran d'incloure dins del preu final de la licitació.

6.4 Informes i Lliurables

L'adjudicatari ha de presentar uns informes per el seguiment del projecte de l'àrea TIC atenent a la definició del servei. Aquests informes seran revisats per PSPV que podrà modificar l'estructura d'aquests informes en funció de nous paràmetres del servei que vulgui avaluar.

6.4.1 Informe Comitè de Direcció

Informe descriptiu de l'execució del servei durant el període. L'informe de seguiment haurà de presentar-se en el Comitè de Direcció tal i com s'estipula a l'apartat 6.2.1 Comitè de direcció. Aquest document haurà d'incorporar com a mínim els següents punts:

- Revisió acords i temes pendents comitè anterior o Visió global
- Quadre de comandament global del servei
- Acords de Nivell de Servei i tiquets en garantia - Seguiment operatiu
- Quadre d'indicadors tècnics per presentar la situació dels serveis per tecnologia i les propostes de millora de parametrització

6.4.2 Informe Comitè de seguiment

Informe descriptiu de temes tècnics i de coordinació tècnica del servei durant el període.

L'informe de seguiment haurà de presentar-se en el Comitè de seguiment tal i com s'estipula a l'apartat 6.2.2 Comitè de seguiment.

Aquest document haurà d'incorporar com a mínim els següents punts:

- Revisió acords i temes pendents comitè anterior.
- Anàlisi situació:
 - Relació de temes tècnics:
 - Descripció
 - Estat
 - Planificació
 - Realització
 - Responsable
 - Impactes
 - Dependències
 - Riscos identificats i proposta de solucions

6.4.3 Memòria final d'actualització

L'adjudicatari haurà de presentar una memòria final de l'actualització on es documenti com a mínim:

- Visió global
- Les integracions
- Els mòduls i funcionalitats desenvolupats
- Les millores tècniques realitzades
- Les millores operatives /administratives
- Formació realitzada
- Informes realitzats (des de NAV o Power BI)

El licitador haurà de lliurar tota la documentació de suport, documentació de projecte, manuals d'implantació, documentació tècnica, documentació de processos, etc. que es generi durant el desenvolupament del projecte.

6.5 Condicions de la prestació del servei

6.5.1 Gestió incidències, evolutius i suport

S'establirà un circuit i mètode de comunicació de:

- Incidències (correctiu)
- Sol·licituds parametrització, configuració (peticions)
- Sol·licituds de millora del Sistema (evolutiu)
- Sol·licituds de suport funcional (CAU)

6.5.2 Eina de gestió tiqueting (ITSM)

L'adjudicatari ha d'integrar-se amb l'eina de gestió de tiquets que té actualment PSPV per crear, generar i atendre els tiquets i fer el seguiment individualitzat de les demandes fetes i avaluar de forma global el servei.

L'eina de tiqueting del PSPV permet la generació de tiquets mitjançant els canals de comunicació establerts pel PSPV (correu, telèfon, etc.) a través del servei del CAU.

Les dades a recollir en cada cas estaran tabulades a la Base de Dades de Coneixement (CMDB), que serà propietat del PSPV i compartida amb el CAU, que s'anirà actualitzant amb la informació que es vagi recollint, per part de l'adjudicatari i el propi PSPV en les actuacions presencials. Caldrà definir durant la implantació les dades mínimes que cal recollir.

6.5.3 Canals de comunicació

Els canals de comunicació disponibles pels serveis d'atenció són:

- Telèfon.
- Correu electrònic.
- Eina tiqueting (ITSM).
- Altres mitjans que l'adjudicatari o el PSPV puguin posar a l'abast dels usuaris.

6.5.4 Horari de prestació del servei

L'horari d'atenció (horari d'oficina) ha de donar cobertura de 9 a 18 de dilluns a divendres.

El responsable del servei designat per l'empresa adjudicatària haurà de presentar informes periòdics, i tots aquells altres que a petició del Responsable/s del Projecte poguessin servir per a la òptima consecució dels objectius previstos.

6.5.5 Ubicació física del servei

El servei s'oferirà a les instal·lacions de l'adjudicatari.

7 Execució del projecte

El termini màxim d'execució es de **9 mesos**.

L'adjudicatari designarà un equip de treball responsable de la prestació del servei de forma que faciliti les interlocucions i la gestió de forma eficaç.

Els licitats han de detallar els aspectes relatius a l'organització proposada per a la realització dels treballs requerits, sota la direcció del responsable del servei al Parc i que hauran les següents fases metodològiques per a la posada en marxa del servei:

- Elaboració del **l'anàlisi funcional** del servei que inclourà l'abast requerit. El termini màxim es de **4 setmanes**. Com a mínim inclourà el detall de les diferents fases, subfases i activitats periodificades identificant recursos i esforços per part d'ambdós: adjudicatari i licitador; detall d'activitats i sobre qui recau la responsabilitat en cada una; metodologia de seguiment i coordinació, posada en marxa, certificació i qualitat de tots els serveis requerits a l'apartat 5 Descripció del servei d'aquest document.
S'establirà de forma conjunta la data d'inici de cada una de les actualitzacions de la plataforma de l'aplicació.
La data de finalització només es podrà variar amb el vistiplau del PSPV.
- Aprovació del pla per part del Parc o rectificació per part de l'adjudicatari dels aspectes no acceptats pel Parc (**màxim 1 setmana**)
- **Actualització** a la versió Microsoft Dynamics 365 Business Central compostat per les següents fases:
 - Migració**
 - Anàlisi i planificació
 - Migració de dades
 - Actualització
 - Desenvolupament funcionalitats**
 - Anàlisi i planificació
 - Desenvolupament a mida
 - Proves de funcionalitat
 - Pla de contingència
 - Pla de formació**
 - Pla de manteniment**
 - Pla de suport**
- **Lliurament** de documents funcionals i Memòria del projecte (ha de recollir la descripció de totes les funcionalitats que no estan incloses en l'estàndard)
- **Suport post posada en marxa**

L'execució del projecte inclourà la esmena d'errors en el funcionament del programari de gestió, així como la conclusió de la documentació incompleta.

8 Acords de Nivell de Servei (ANS)

El Parc Sanitari Pere Virgili és responsable de la planificació estratègica dels serveis externalitzats. Aquesta planificació s'explicitarà en uns objectius a aconseguir en un termini determinat. Per mesurar el grau d'assoliment dels objectius s'establiran indicadors numèrics.

Per mesurar la qualitat del nivell rebut pel Parc Sanitari Pere Virgili també s'establiran indicadors que tindran un valor mínim a assolir (ANS).

Periòdicament subministrarà informes d'indicadors, tan els descrits en aquest plec, com aquells que el propi licitador o el Parc Sanitari Pere Virgili proposi de forma addicional.

El personal del Departament d'Organització i Comunicació tindrà accés directe a les dades generades pels mecanismes de control.

El servei es realitzarà en base al següents acords de nivell de servei i penalitzacions associades al seu incompliment, per assegurar la qualitat en la seva prestació. Els licitadors poden proposar altres ANS i penalitzacions addicionals o millores en els mateixos.

Quan s'incompleixi un ANS, l'adjudicatari haurà d'explicar les causes per les que s'ha produït l'incompliment i fer propostes de resolució i millora per aconseguir que no es repeteixi.

8.1 Incompliments

L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'Incompliments o ANS que defineix els indicadors i establir una base objectiva i mesurable que reflecteixi el compromís de l'adjudicatari per a prestar els serveis requerits de forma satisfactòria.

Es pretén obtenir un nivell de servei d'alta qualitat. Per aquest motiu s'han definit els ANS amb l'establiment d'un model de penalitzacions que relacioni el nivell de prestació del servei amb la seva facturació o altres mecanismes de compensació.

Per tal de disposar de la informació necessària per a una gestió i governança homogènia dels sistemes, el licitador haurà d'implantar el Model de Mesura del Nivell de Servei de forma progressiva al llarg de l'execució del contracte.

Li correspon a l'adjudicatari **presentar mensualment**, la valoració del compliment de tots els nivells de servei i indicadors de mesura, segons la fase del servei en la que ens trobem. Així:

1. Actualització versió

S'analitzarà:

Àmbit	Paràmetre	Càlcul	ANS	Penalització mínima
Termini d'execució	Temps d'execució del servei	-	9 mesos	1% de la facturació del mes en el que es té previst el lliurament per cada 1 dia hàbil de demora en l'entrega
Entrega de documentació	Retard en l'entrega documentació 'Memòria final actualització a la versió Microsoft Dynamics 365 Business Central	Data Document = Data entrega real document – data entrega prevista	0	10% de la facturació del mes en el que es té previst el lliurament per cada 1 dia de demora en l'entrega

2. Servei de suport

Com es descriu a l'apartat 5.4 Servei de suport, les incidències es gestionaran segons els nivells de criticitat:

- **Alta**

Tiquets que per la seva tipologia impedeixen el funcionament correcte de l'aplicació o requisit/peticions que es consideren molt crítiques per a l'organització.

- **Mitja**

Tiquets que s'han de resoldre i que tenen afectació al funcionament diari o requisits/peticions que es consideren crítiques per a l'organització.

- **Baixa**

Tiquets que s'han de resoldre però que no tenen una afectació al funcionament diari o requisits/peticions que NO es consideren crítiques per a l'organització.

Àmbit	Paràmetre	Criticitat	ANS	Penalització mínima
Resolució incidències	Temps de resolució	Alta	> 4 hores naturals o millora establerta a oferta presentada	1% de la facturació mensual per cada hora de demora en la resolució tiquet de nivell de criticitat alta
		Mitja	> 3 dies naturals o millora establerta a oferta presentada	0,5% de la facturació mensual per cada dia de demora en la resolució tiquet de nivell de criticitat mitja

En cas de compliment defectuós de la prestació o d'incompliment dels temps màxims de resposta s'imposaran les penalitats previstes amb caràcter general a l'article 192 i següents LCSP.

8.2 Penalitzacions

El licitador haurà de garantir que l'oferta que presenti està acord amb el que s'exposa en el plec. Les desviacions de caràcter greu que puguin condicionar el desenvolupament del projecte quedaran penalitzades segons es detalla a continuació:

- Si el contractista ha incorregut en demora per una causa imputable a ell mateix, l'òrgan de contractació pot rescindir el contracte o imposar les penalitats que procedeixin, d'acord a les previsions de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Les sancions es fan efectives no tan sols sobre la garantia sinó també, si escau, en la quantia necessària sobre els pagaments que s'han de satisfer a l'adjudicatari. Quan es fan efectives sobre la garantia, el contractista està obligat a completar-la dintre dels quinze dies naturals següents a la notificació de la sanció.

8.3 Condicions de garantia

L'empresa contractista haurà de garantir durant la durada del contracte qualsevol actualització de la plataforma de l'aplicació o adaptacions específiques a través de la borsa d'hores.

9 Millores

Els licitadors poden aportar propostes de les millores que es proposen a continuació. Aquestes millores són eines que incrementen l'eficiència, control i la gestió del servei.

9.1 Gestió de contractes

Es requereix disposar de sistema de gestió de contractes que reculli les següents funcionalitats:

- Guardar les dades dels contractes de compra, incloent-hi comentaris
- Accés des de la pròpia fitxa a documents adjunts (com podria ser el document signat)
- Codificació de l'objecte del contracte
- Gestió d'avisos per controlar els venciments i els límits obligatoris anuals per proveïdor objecte del contracte i facilitar la presa de decisions si cal renovar
- A les referències creuades del proveïdor es podrà definir el contracte associat per aquell producte i proveïdor, i aquest contracte viatjarà a la fulla de demanda quan el sistema proposi noves compres d'aquells productes a aquell proveïdor.
- Informar el número de contracte dins les línies de comandes de compra i, des d'aquestes viatjarà als albarans i factures creades vinculades.

Els licitadors hauran de presentar proposta que indiqui solució on s'indiqui metodologia, el pla de treball i recursos necessaris per la realització d'aquesta millora.

9.2 Integració EDI

Es valorarà proposta que faciliti l'intercanvi de informació entre el PSPV i empreses proveïdores per l'aprovisionament de material sanitari i d'oficina als equipaments de la institució.

10 Altres consideracions

Tots els treballs hauran de desenvolupar-se en el marc de la legislació vigent aplicable en matèria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions per a l'entorn d'un Campus o Parc.

El Parc facilitarà a l'adjudicatari tota la informació requerida corresponent a la situació actual en infraestructures, sistemes actuals, organització, responsables i interlocutors, etc., per tal de garantir l'optimització en la planificació del servei requerit.

L'adjudicatari facilitarà la visita i examen de qualsevol procés o fase del servei, estant obligat a subministrar quanta informació tècnica li sigui requerida i jurídicament resulti possible.

10.1 Presentació de la documentació

Tota la documentació es presentarà mitjançant l'eina digital en format informàtic PDF i en idioma català.

Les empreses licitant hauran d'incloure en llurs ofertes els següents documents:

- Memòria de l'actualització a versió Microsoft Dynamics 365 Business Central que ha d'incloure:
 - o Pla de posada en marxa del servei que inclourà les activitats i planificació, detallant:
 - Planificació i cronograma de les diferents fases i activitats.
 - La migració de dades.
 - Pla de proves que ha d'incloure les proves de funcionalitat, el pla de tall d'operacions i pla de suport durant la posada en marxa.
 - El model de relació i la matriu de responsabilitats.
 - Pla de formació.
 - Pla de contingència proposat.
 - o Proposta detallada que inclou metodologia. Pla de treball i recursos necessaris per les dos millores proposades: Gestió de contractes i Integració EDI.
- Pla de manteniment que inclogui el detalla del requerit: actualitzacions normatives i de seguretat (manteniment, normatiu, correctiu i evolutiu)
- Pla de suport post posta en marxa que detalli la gestió i operació del servei atenció a les incidències i peticions i el pla de seguiment del servei

10.2 Esquema Nacional de Seguretat

L'article 2 del vigent Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat, disposa que els plecs de prescripcions administratives o tècniques dels contractes que celebrin les entitats del sector públic incloses en l'àmbit d'aplicació del reial decret de l'ENS contemplaran tots aquells requisits necessaris per assegurar la conformitat amb el mateix dels sistemes d'informació en els quals es recolzen els serveis prestats pels contractistes, tals com la presentació de les corresponents Declaracions o Certificacions de Conformitat amb l'ENS. Aquesta precaució s'estendrà també a la cadena de subministrament d'aquests contractistes, en la mesura que sigui necessari i d'acord amb els resultats de l'anàlisi de riscos corresponent.

En conseqüència, el PSPV considera necessari que els proveïdors que vagin a concórrer a la licitació hauran d'estar en condicions de mostrar la corresponent Certificació de Conformitat amb

l'Esquema Nacional de Seguretat, acceptant-se en el seu lloc, no obstant això, una Declaració de Conformitat amb l'ENS.

Així doncs, en base a l'anterior, i a l'anàlisi dels riscos als quals estan exposats els subministraments i serveis objecte de la licitació, el PSPV estableix com a necessari que l'entitat licitadora hagi d'estar en condicions de mostrar la corresponent Declaració o Certificació de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat, per a la categoria de seguretat ALTA, dels sistemes que intervinguin en la prestació dels serveis indicats, així com mantenir la conformitat en vigor durant la vigència del contracte. Aquesta declaració, o certificat, de conformitat amb l'ENS s'entén que ha d'englobar en el seu abast, com a mínim, l'àmbit objecte de la contractació.

En el cas que l'adjudicatari no pogués mantenir la conformitat amb l'ENS durant la vigència del contracte -per pèrdua, retirada o suspensió de la Certificació de Conformitat o impossibilitat de mantenir la Declaració de Conformitat-, haurà de comunicar aquesta circumstància, de forma immediata i sense dilació indeguda, a l'ENTITAT CONTRACTANT, qui considerarà l'impacte d'aquesta circumstància en la prestació objecte del contracte.
