
Municipi
Sant Boi de Llobregat

Tipus d'actuació
Urbanització

Expedient
904523/24

Data
Juliol 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Relació de documents i volums

01-06. Memòria i Annexos

07-19. Plànols

20. Plec de Prescripcions Tècniques

21. Pressupost

Projecte constructiu de la millora de la pavimentació del lateral banda mar de la C-245 al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

19 / 21 Volums

01-06

01

Memòria
Annex 01. Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia
Annex 02. Planejament

02

Annex 03. Topografia
Annex 04. Geologia i geotècnia
Annex 05. Definició geomètrica i replanteig
Annex 06. Moviment de terres
Annex 07. Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex 08. Xarxa de clavegueram
Annex 09. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua

03

Annex 10. Ferms i paviments
Annex 11. Estructures i murs
Annex 12. Enllumenat
Annex 13. Xarxa de reg i abastament d'aigua pel reg
Annex 14. Plantacions
Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial
Annex 16. Semaforització

04

Annex 17. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis
Annex 18. Expropiacions, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds
Annex 19. Autoritzacions i concessions
Annex 20. Pla de control de qualitat

05

Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut
Annex 22. Aspectes ambientals

06

Annex 23. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
Annex 24. Accessibilitat
Annex 25. Desviaments de trànsit i fases d'execució i d'accessibilitat durant les obres
Annex 26. Pla d'obra
Annex 27. Justificació de preus
Annex 28. Pla de consum i manteniment de l'obra acabada
Annex 29. Pressupost per al Coneixement de l'Administració
Annex 30. Fitxa resum de les característiques del projecte

07-19

07

SG.01 Índex i situació general
SG.02 Emplaçament

08

SG.03 Planta general de la proposta

09

SG.03 Planta general de la proposta
SG.04 Planejament
SG.05 Aixecament topogràfic

10

EN.01 Enderrocs i elements a retirar
EN.02 Previsió d'espai gestió de residus
DG.01 Planta definició geomètrica
DG.02 Perfils longitudinals

11

DG.03 Perfils transversals
PV.01 Planta de pavimentació
PV.02 Detalls pavimentació

12

DC Drenatge i clavegueram
XR Xarxa de reg

13

PL Plantacions

14

SV.01 Planta senyalització i seguretat viària
SV.02 Detalls senyalització i seguretat viària
SE.01 Planta de serveis existents MT

15-18

SE Planta de serveis existents

19

ST Fases execució i senyalització

20

20

01. Plec de prescripcions tècniques generals
02. Plec de prescripcions tècniques particulars

21

21

01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus número 1
04. Quadre de preus número 2
05. Pressupost
06. Resum de pressupost
07. Últim full

Índex

D2 Plànols

19

SG Informació

- SG.01 Índex i situació general
- SG.02 Emplaçament
- SG.03 Planta general de la proposta
- SG.04 Planejament
- SG.05 Aixecament topogràfic

ST Fases execució i senyalització

- ST.01 Fase 1
- ST.02 Fase 2

EN Enderrocs

- EN.01 Enderrocs i elements a retirar
- EN.02 Previsió d'espai gestió de residus

DG Definició geomètrica

- DG.01 Planta
- DG.02 Perfils longitudinals
- DG.03 Perfils transversals

PV Pavimentació

- PV.01 Planta
- PV.02 Detalls

DC Drenatge i clavegueram

- DC.01 Planta
- DC.02 Detalls

XR Xarxa de reg

- XR.01 Planta
- XR.02 Detalls

PL Plantacions


- PL.01 Planta
- PL.02 Detalls

SV Senyalització i seguretat viària

- SV.01 Planta
- SV.02 Detalls

SE Serveis existents

- SE.01 Planta xarxa elèctrica MT
- SE.02 Planta xarxa elèctrica BT
- SE.03 Planta xarxa d'abastament d'aigua potable
- SE.04 Planta xarxa de telefònica
- SE.05 Planta xarxa d'ONO
- SE.06 Planta xarxa de gas

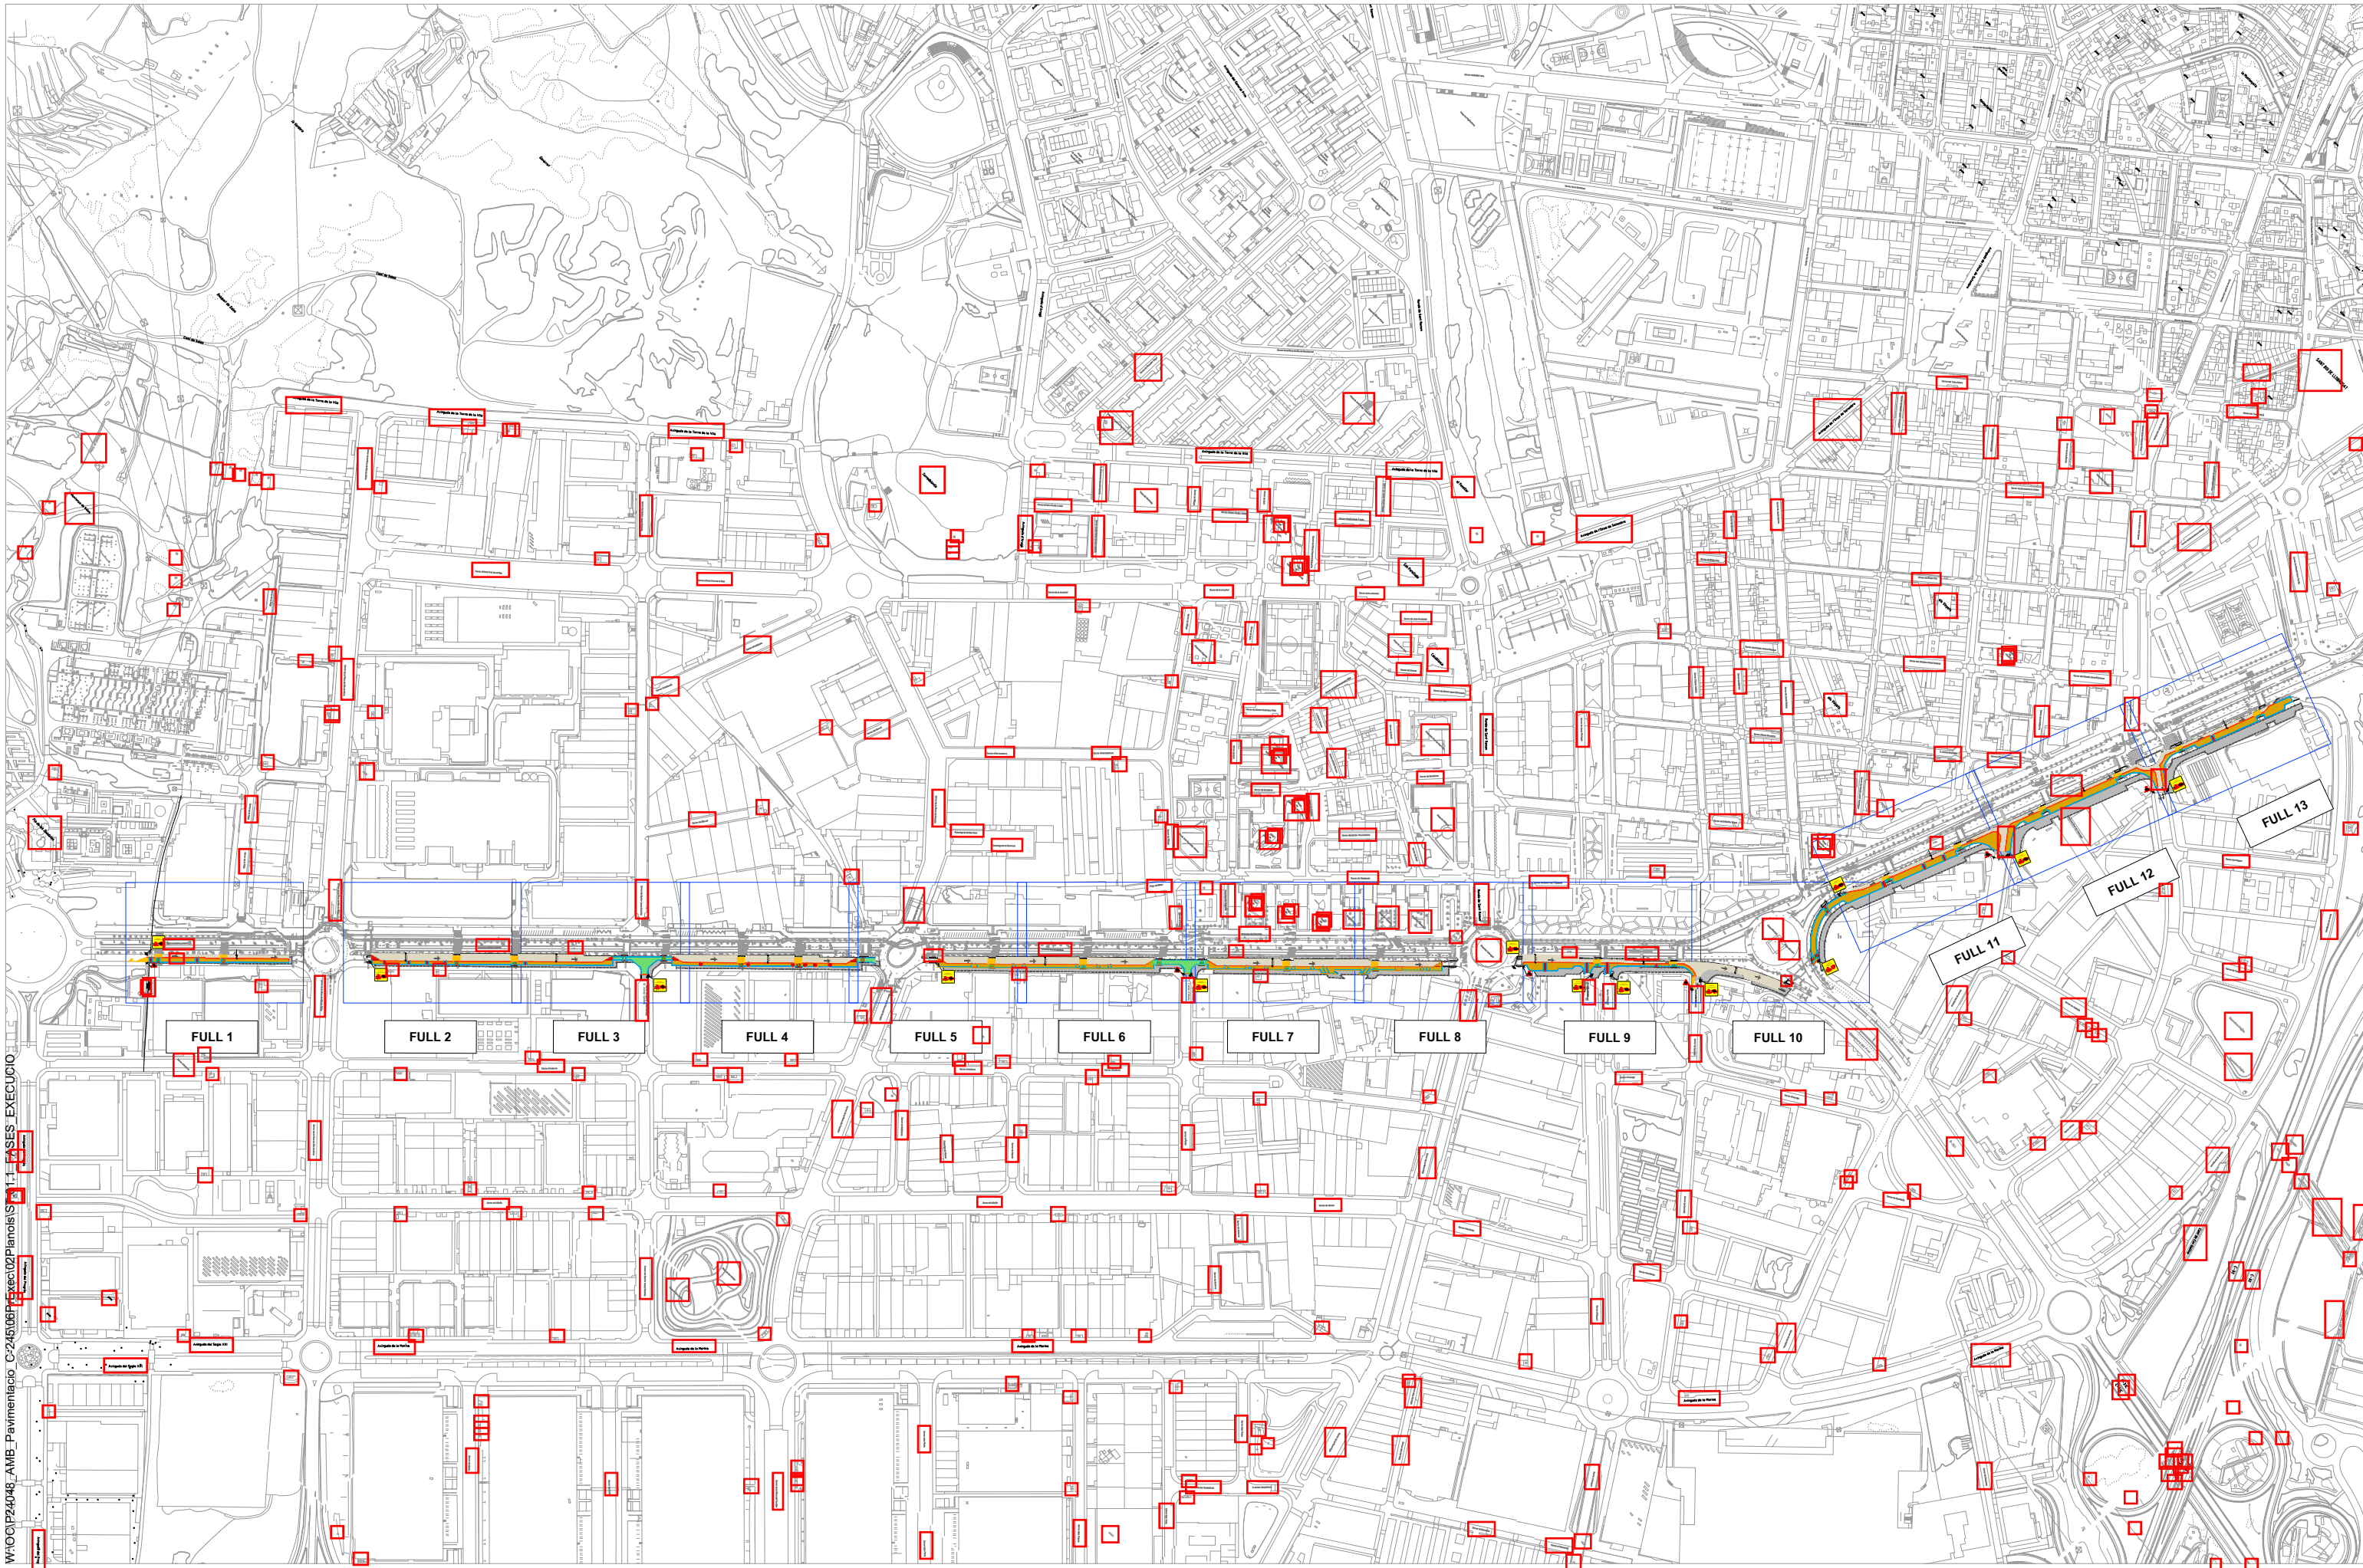

W:\OCIP\24048_AMB_Pavimentació_C-245\08\Exec02\Planos\ST.01.00_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
BANDA MAR DE LA C-245
SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ

FASE 1













ST.01.00
V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/7000

LLEGENDA


--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

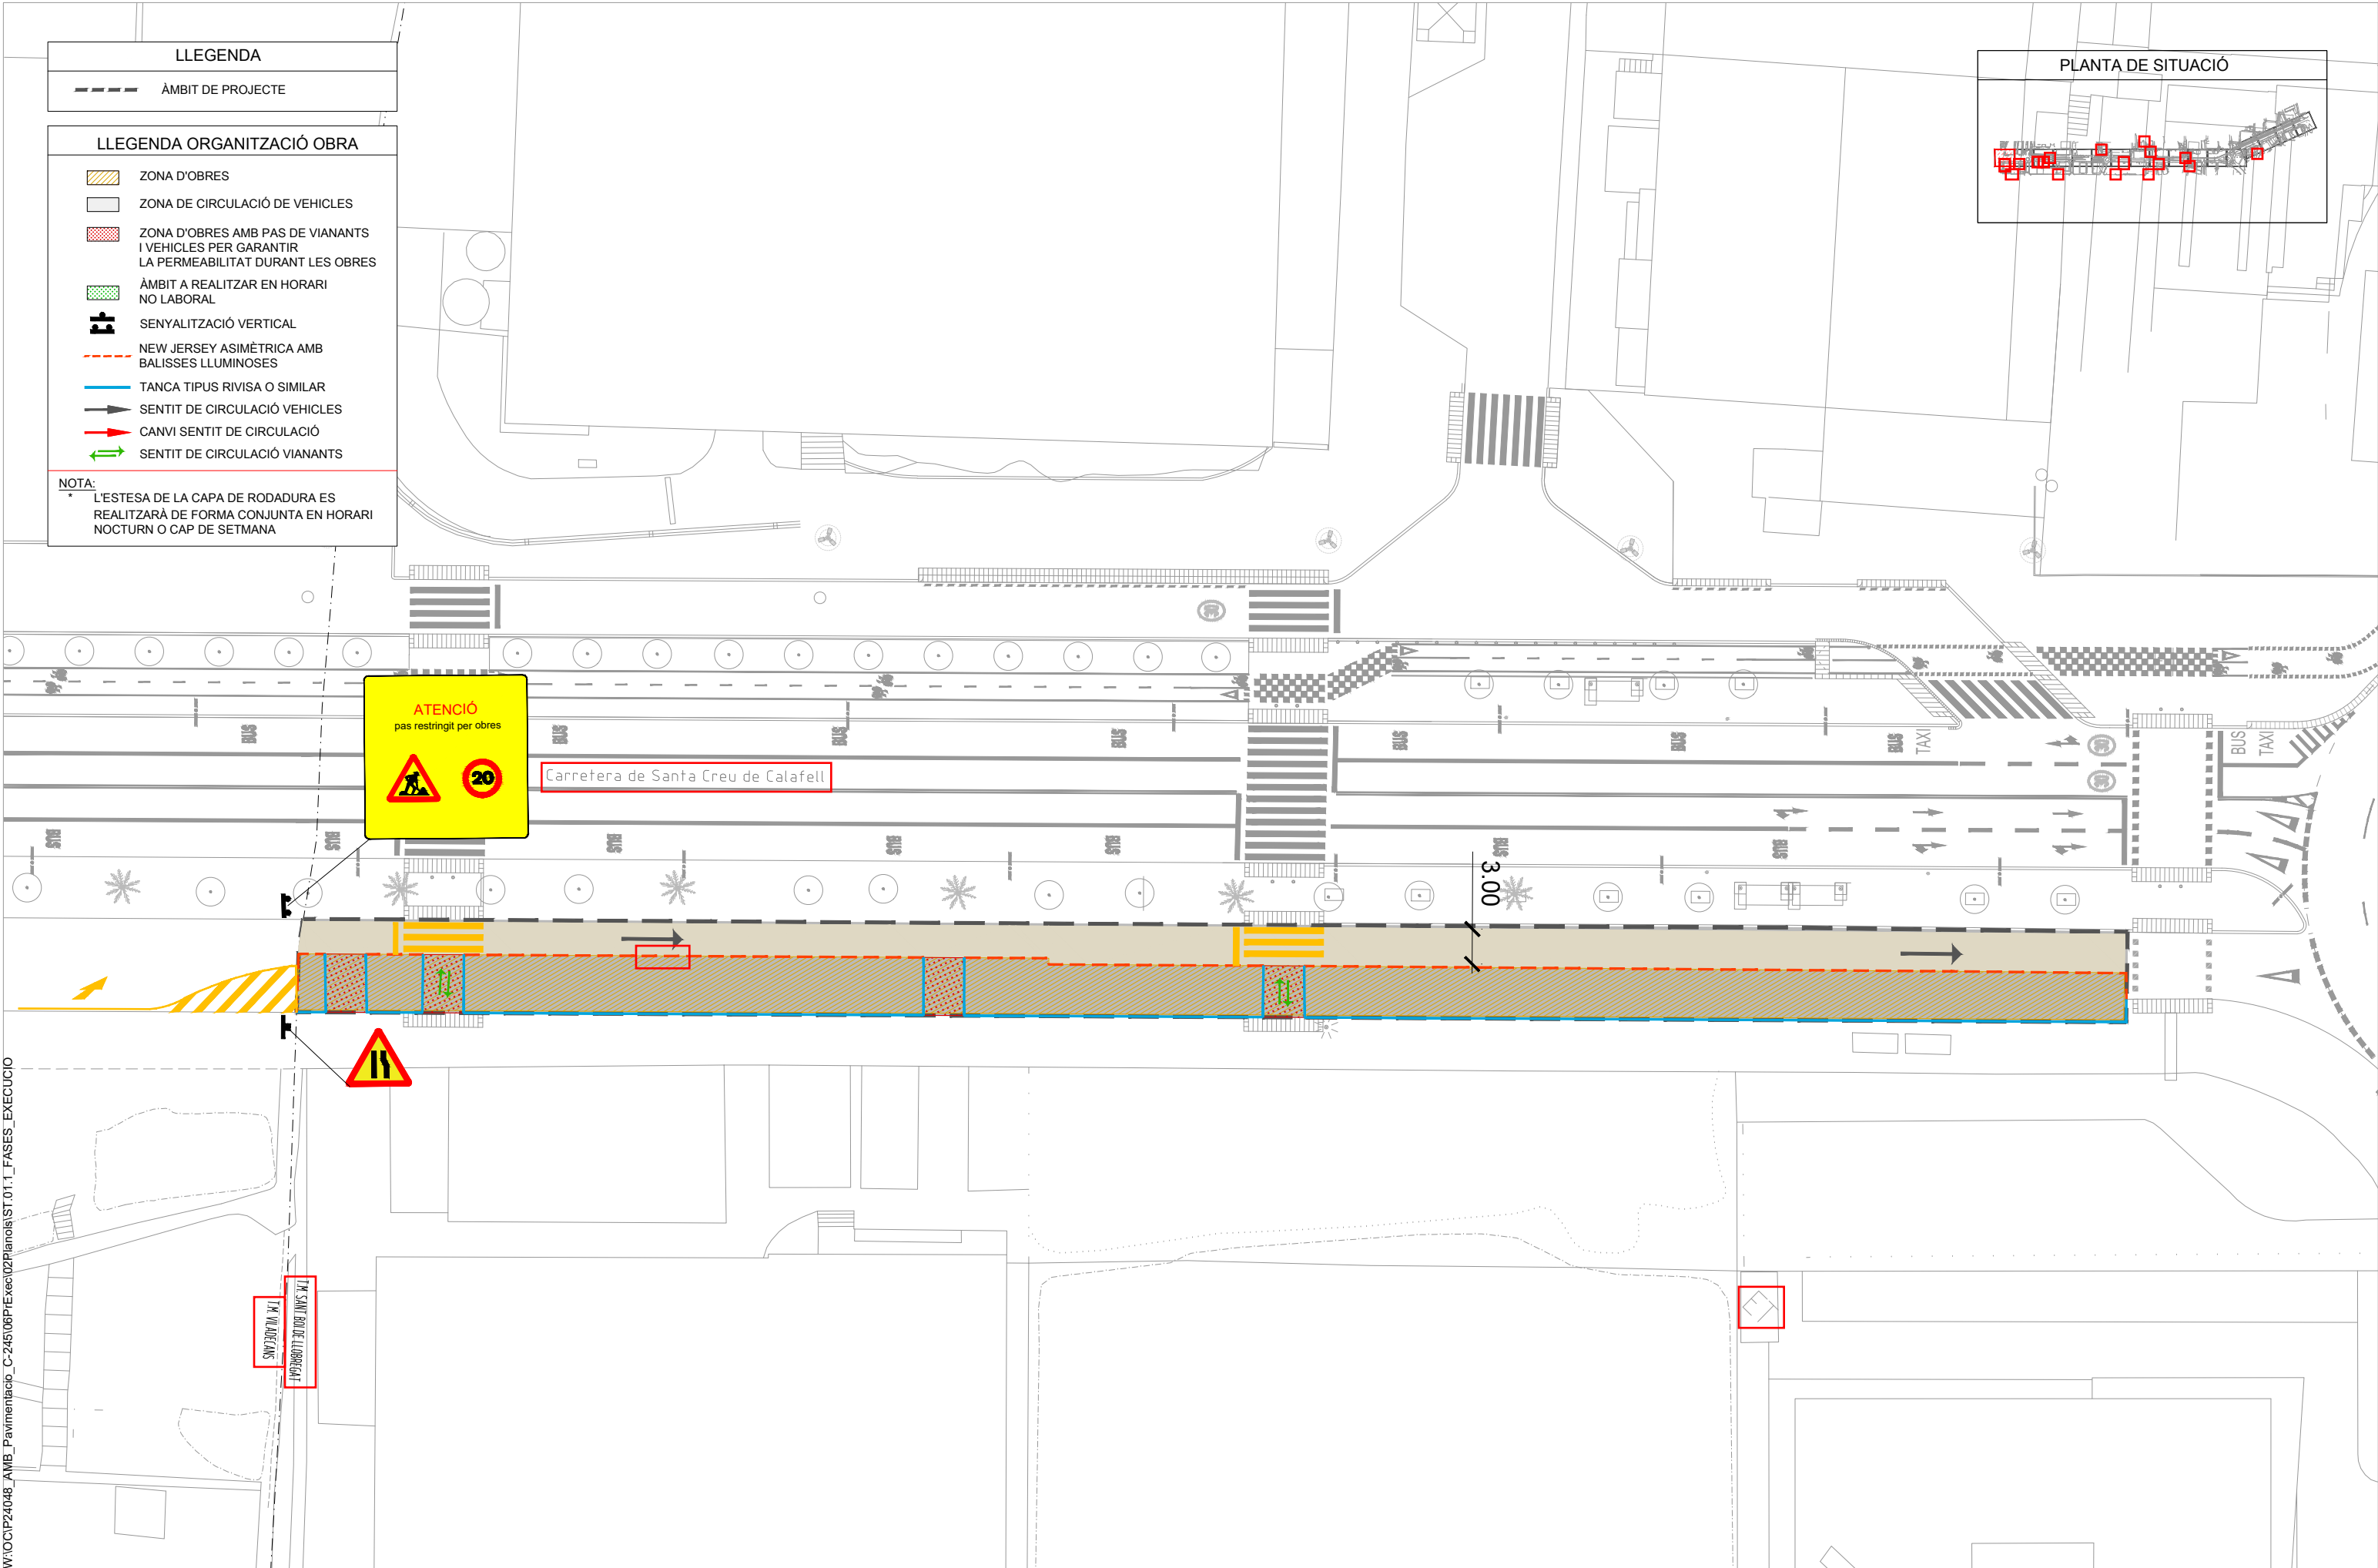

LA VIL·LEJANS
LA SANTA BONA DE LLOBREGAT

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PrExec\02Planois\ST.01.1_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
BANDA MAR DE LA C-245
SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 1

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ



ST.01.01
V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

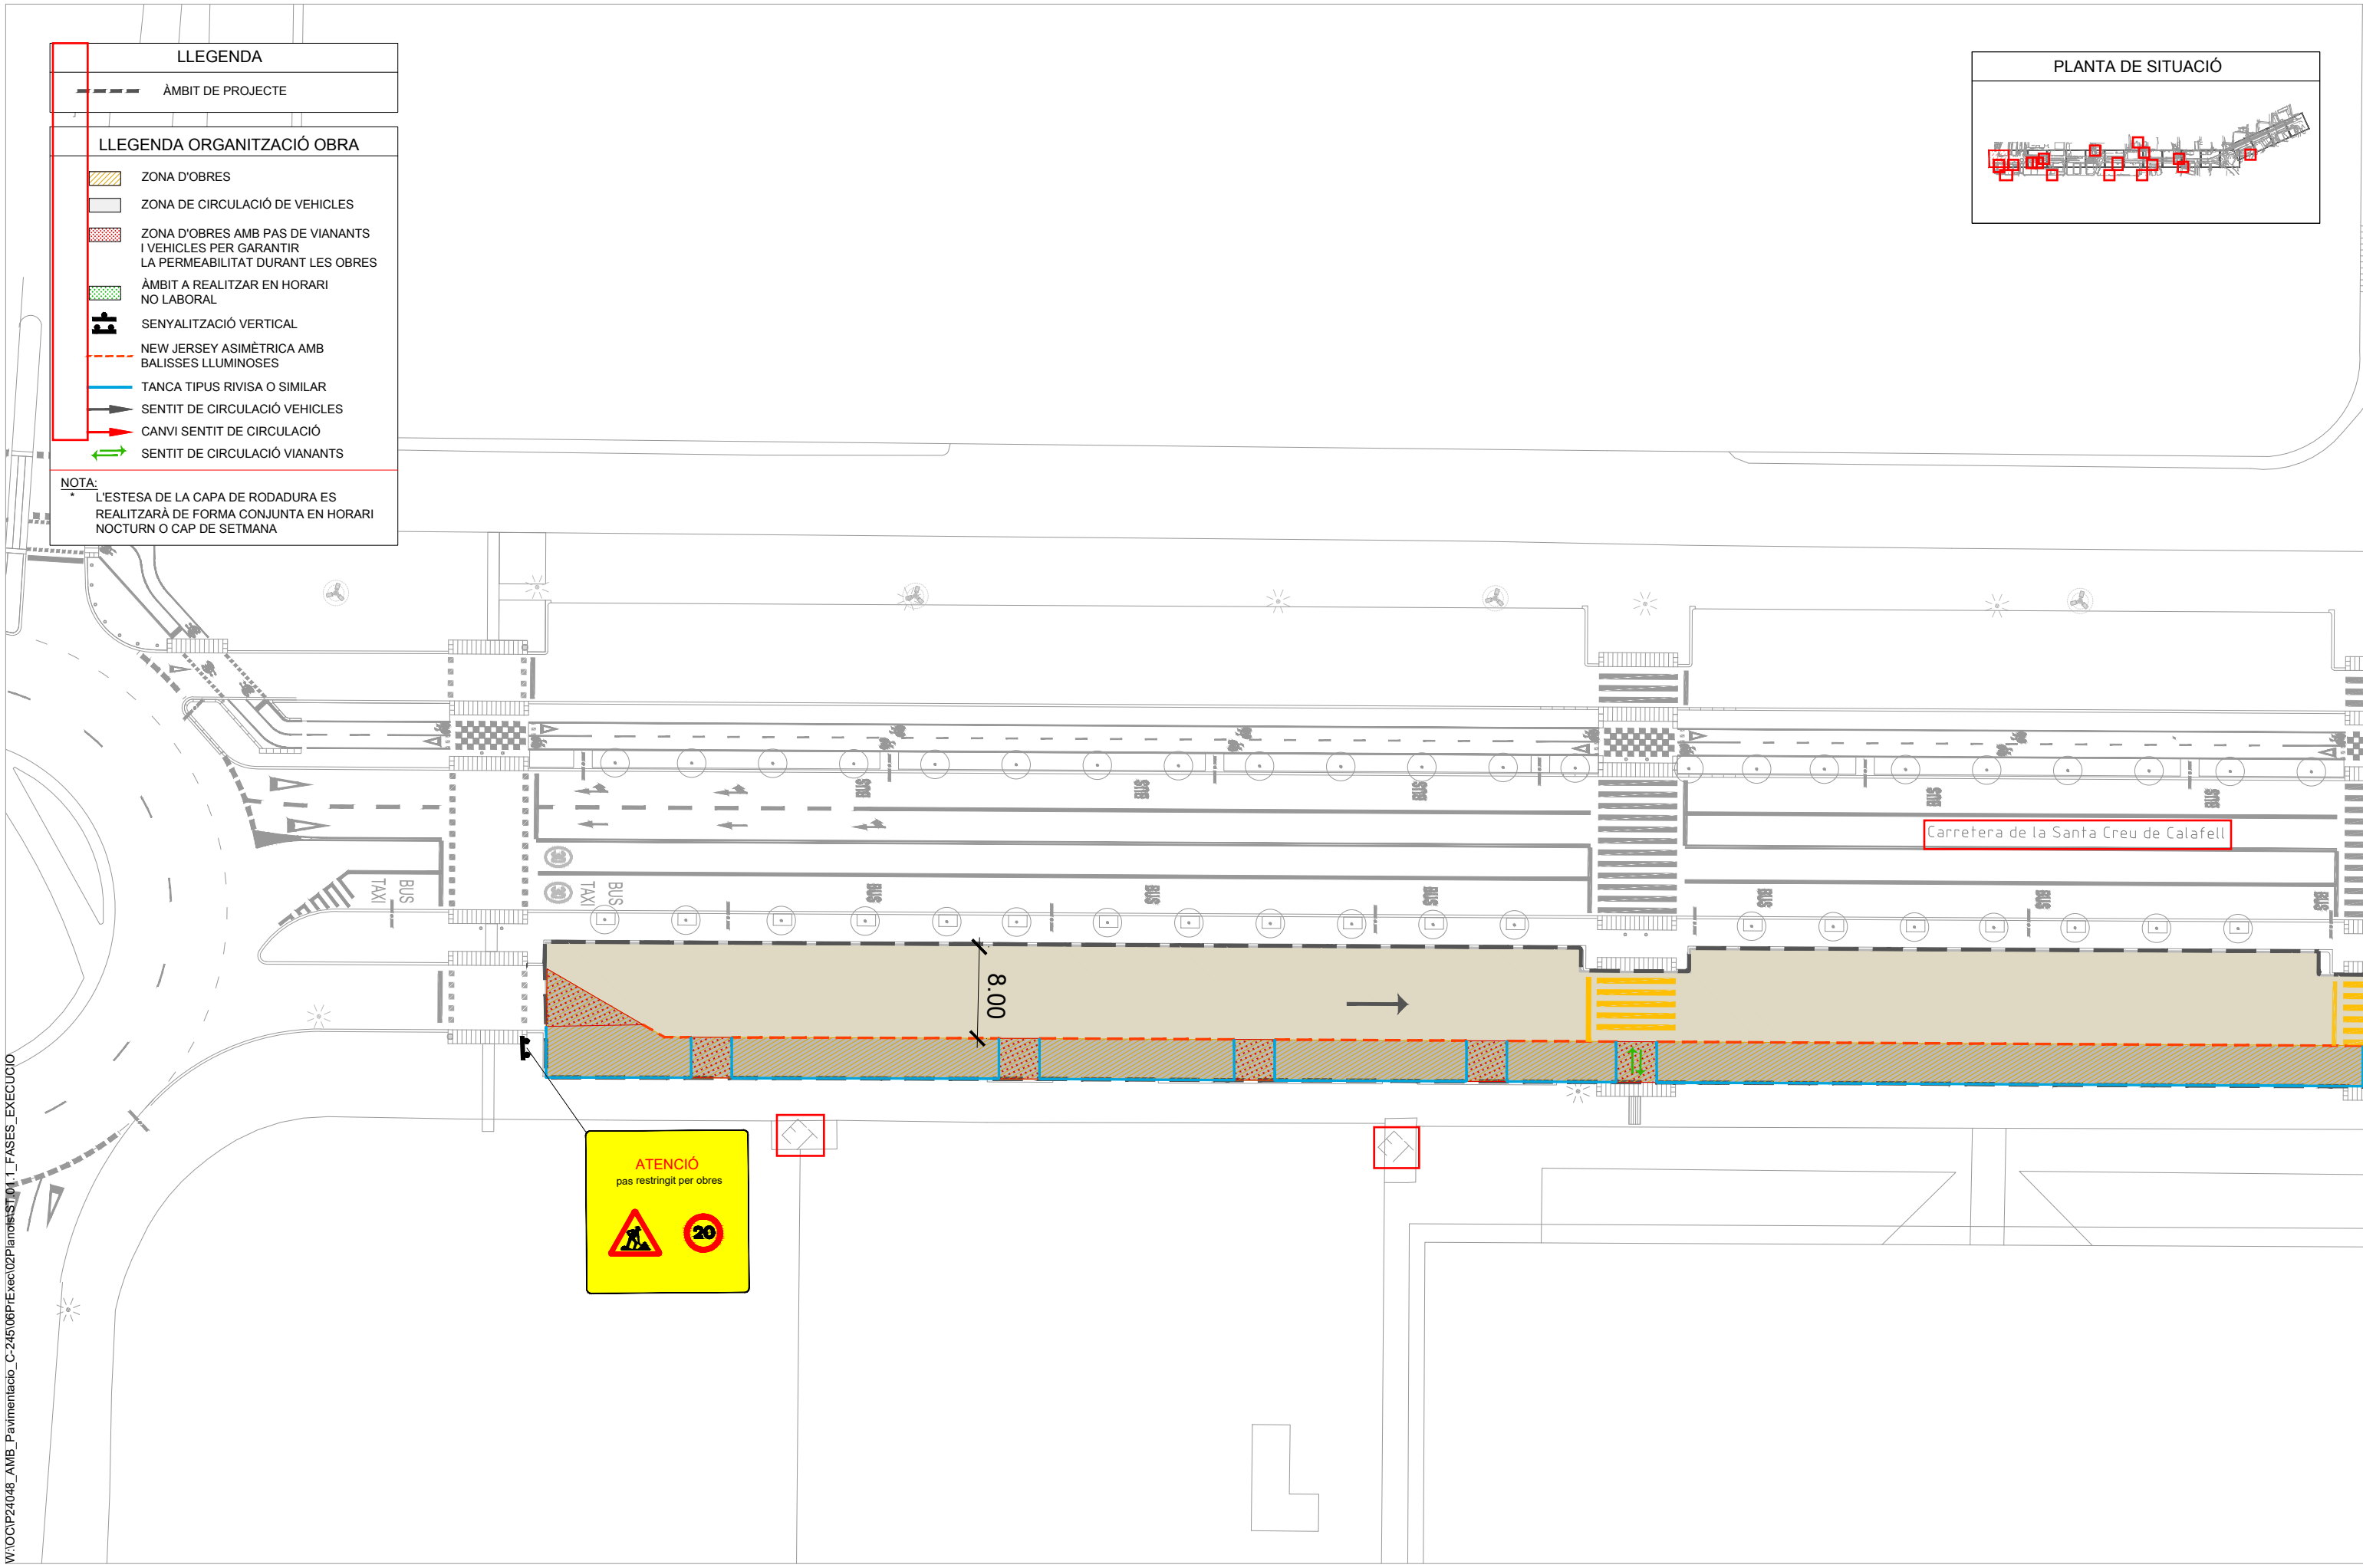

Carretera de la Santa Creu de Calafell

8.00



W:\OC\IP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PrExec\02Planols\ST.01.1_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 1

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.01.02











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
 * L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

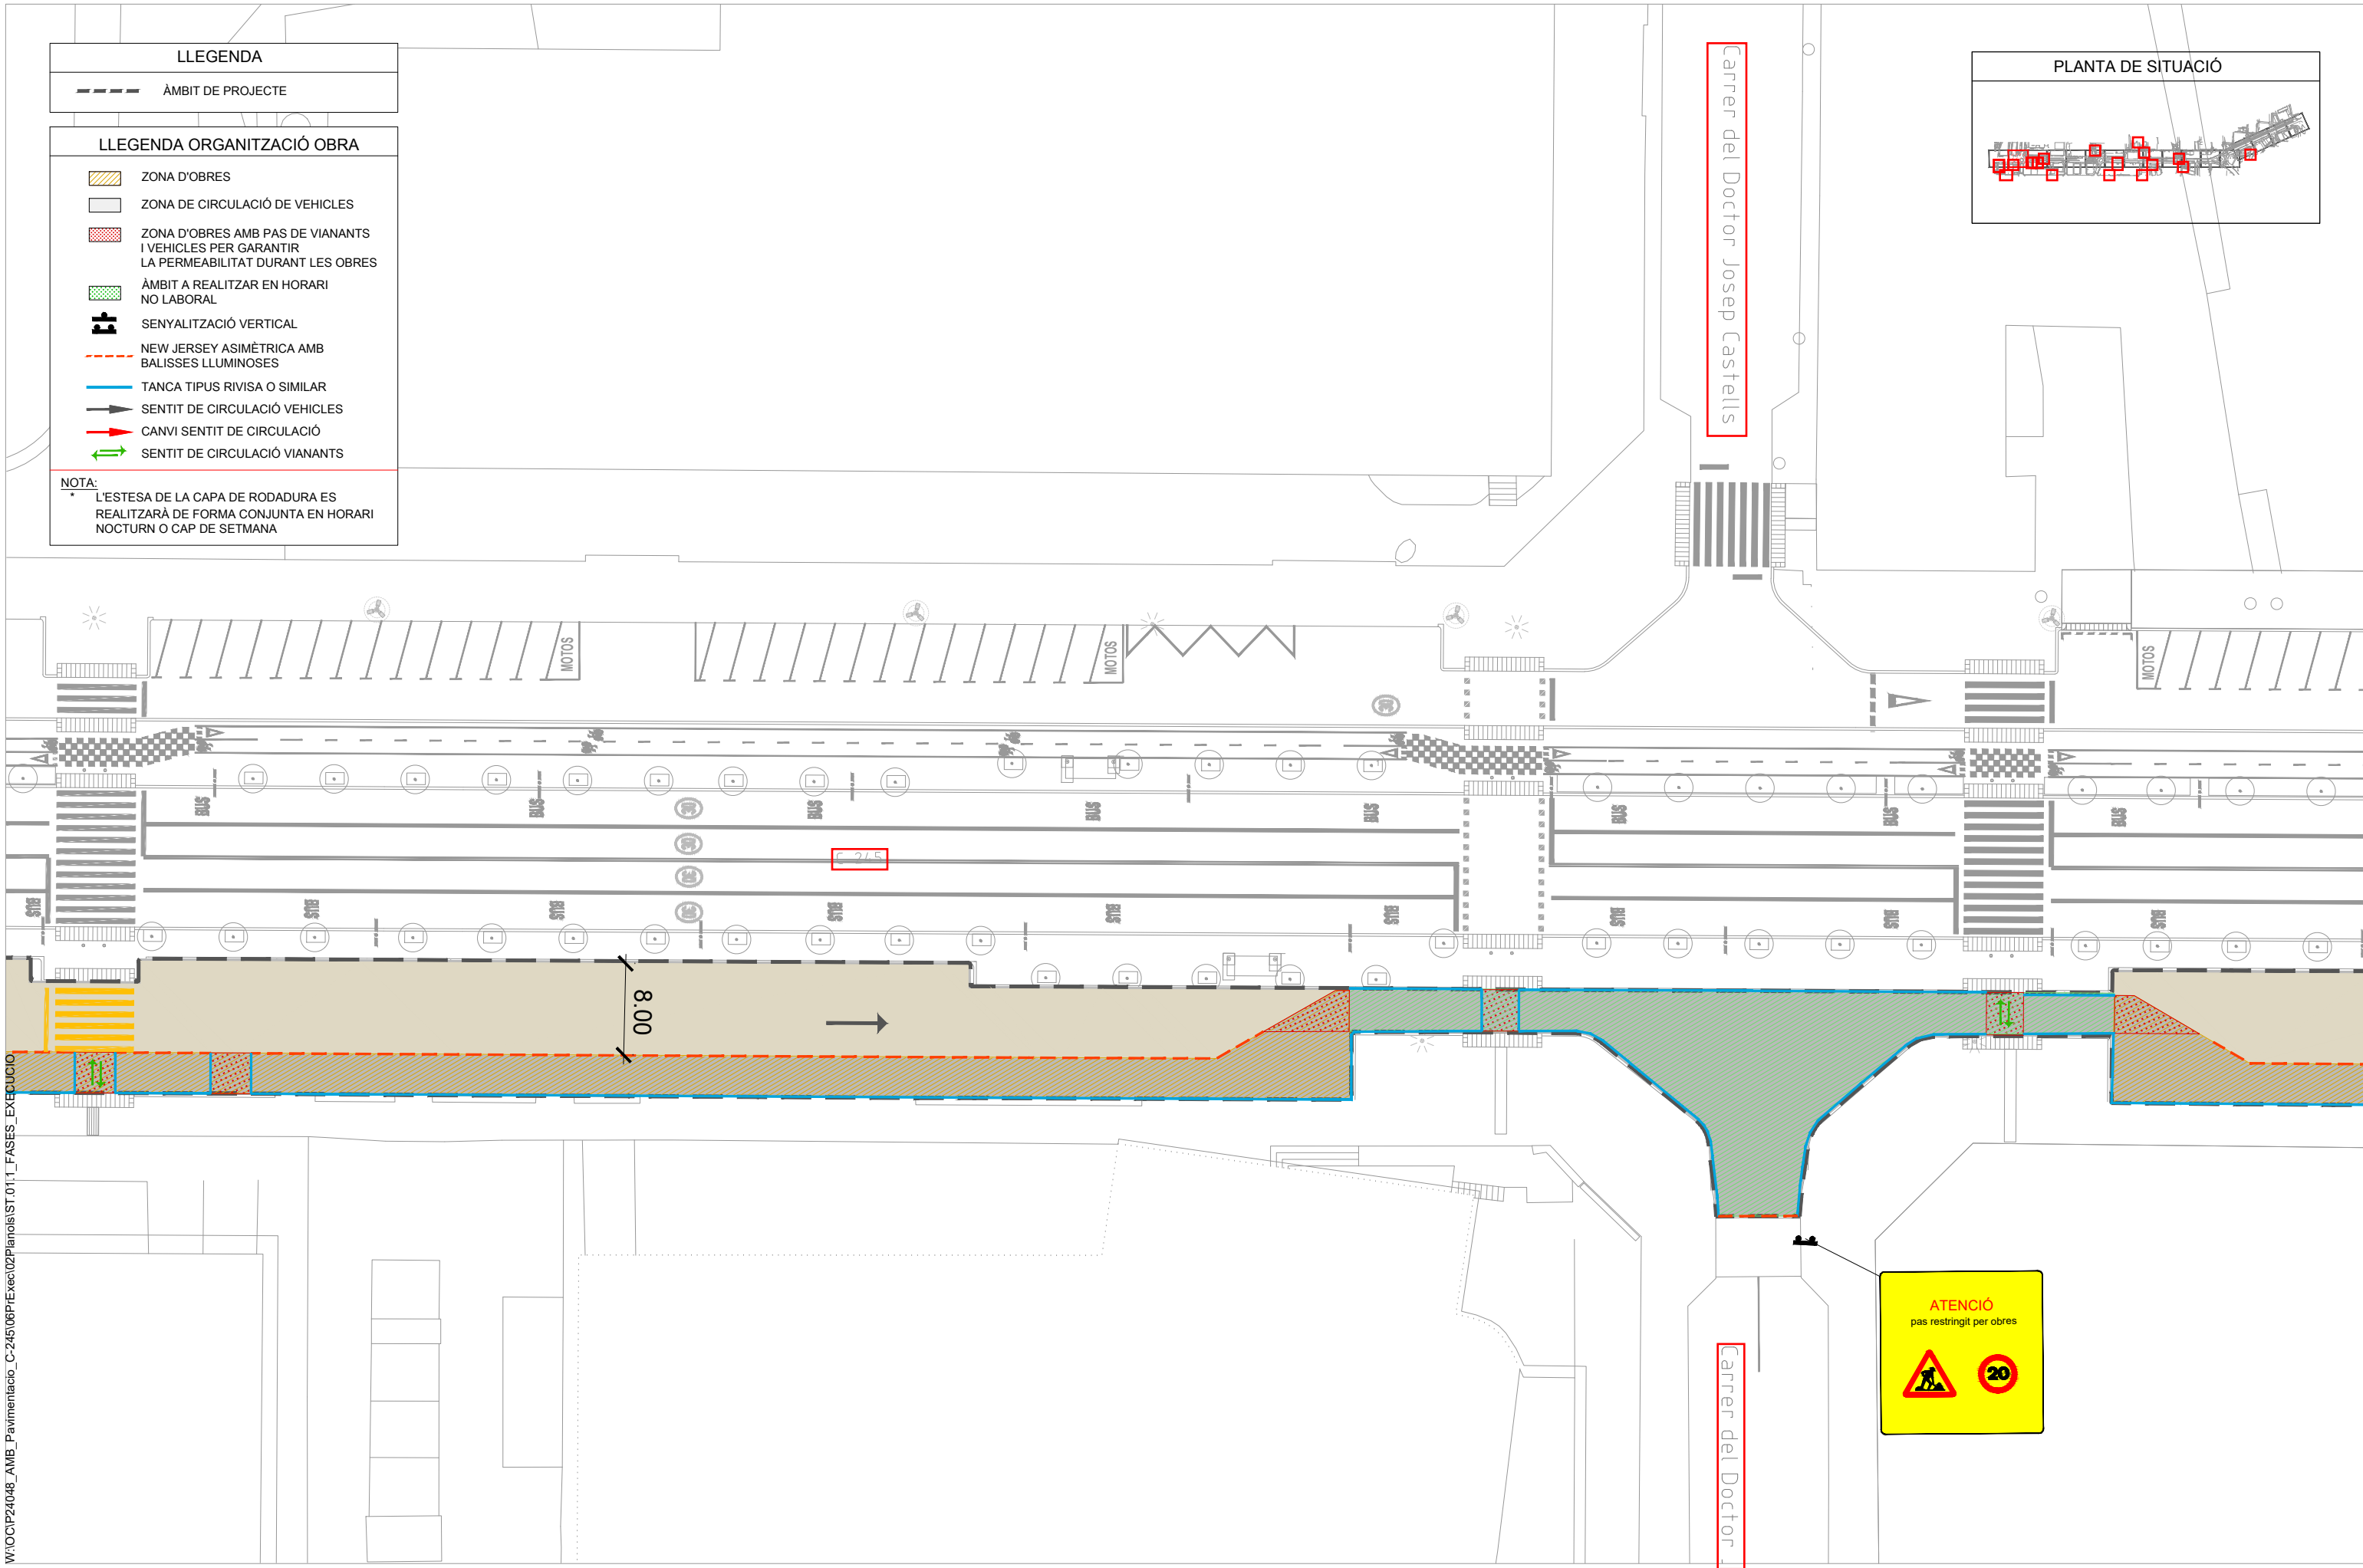

W:\OC\IP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PlExec\02Planois\ST.01.1_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ

FASE 1



ST.01.03











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
 * L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

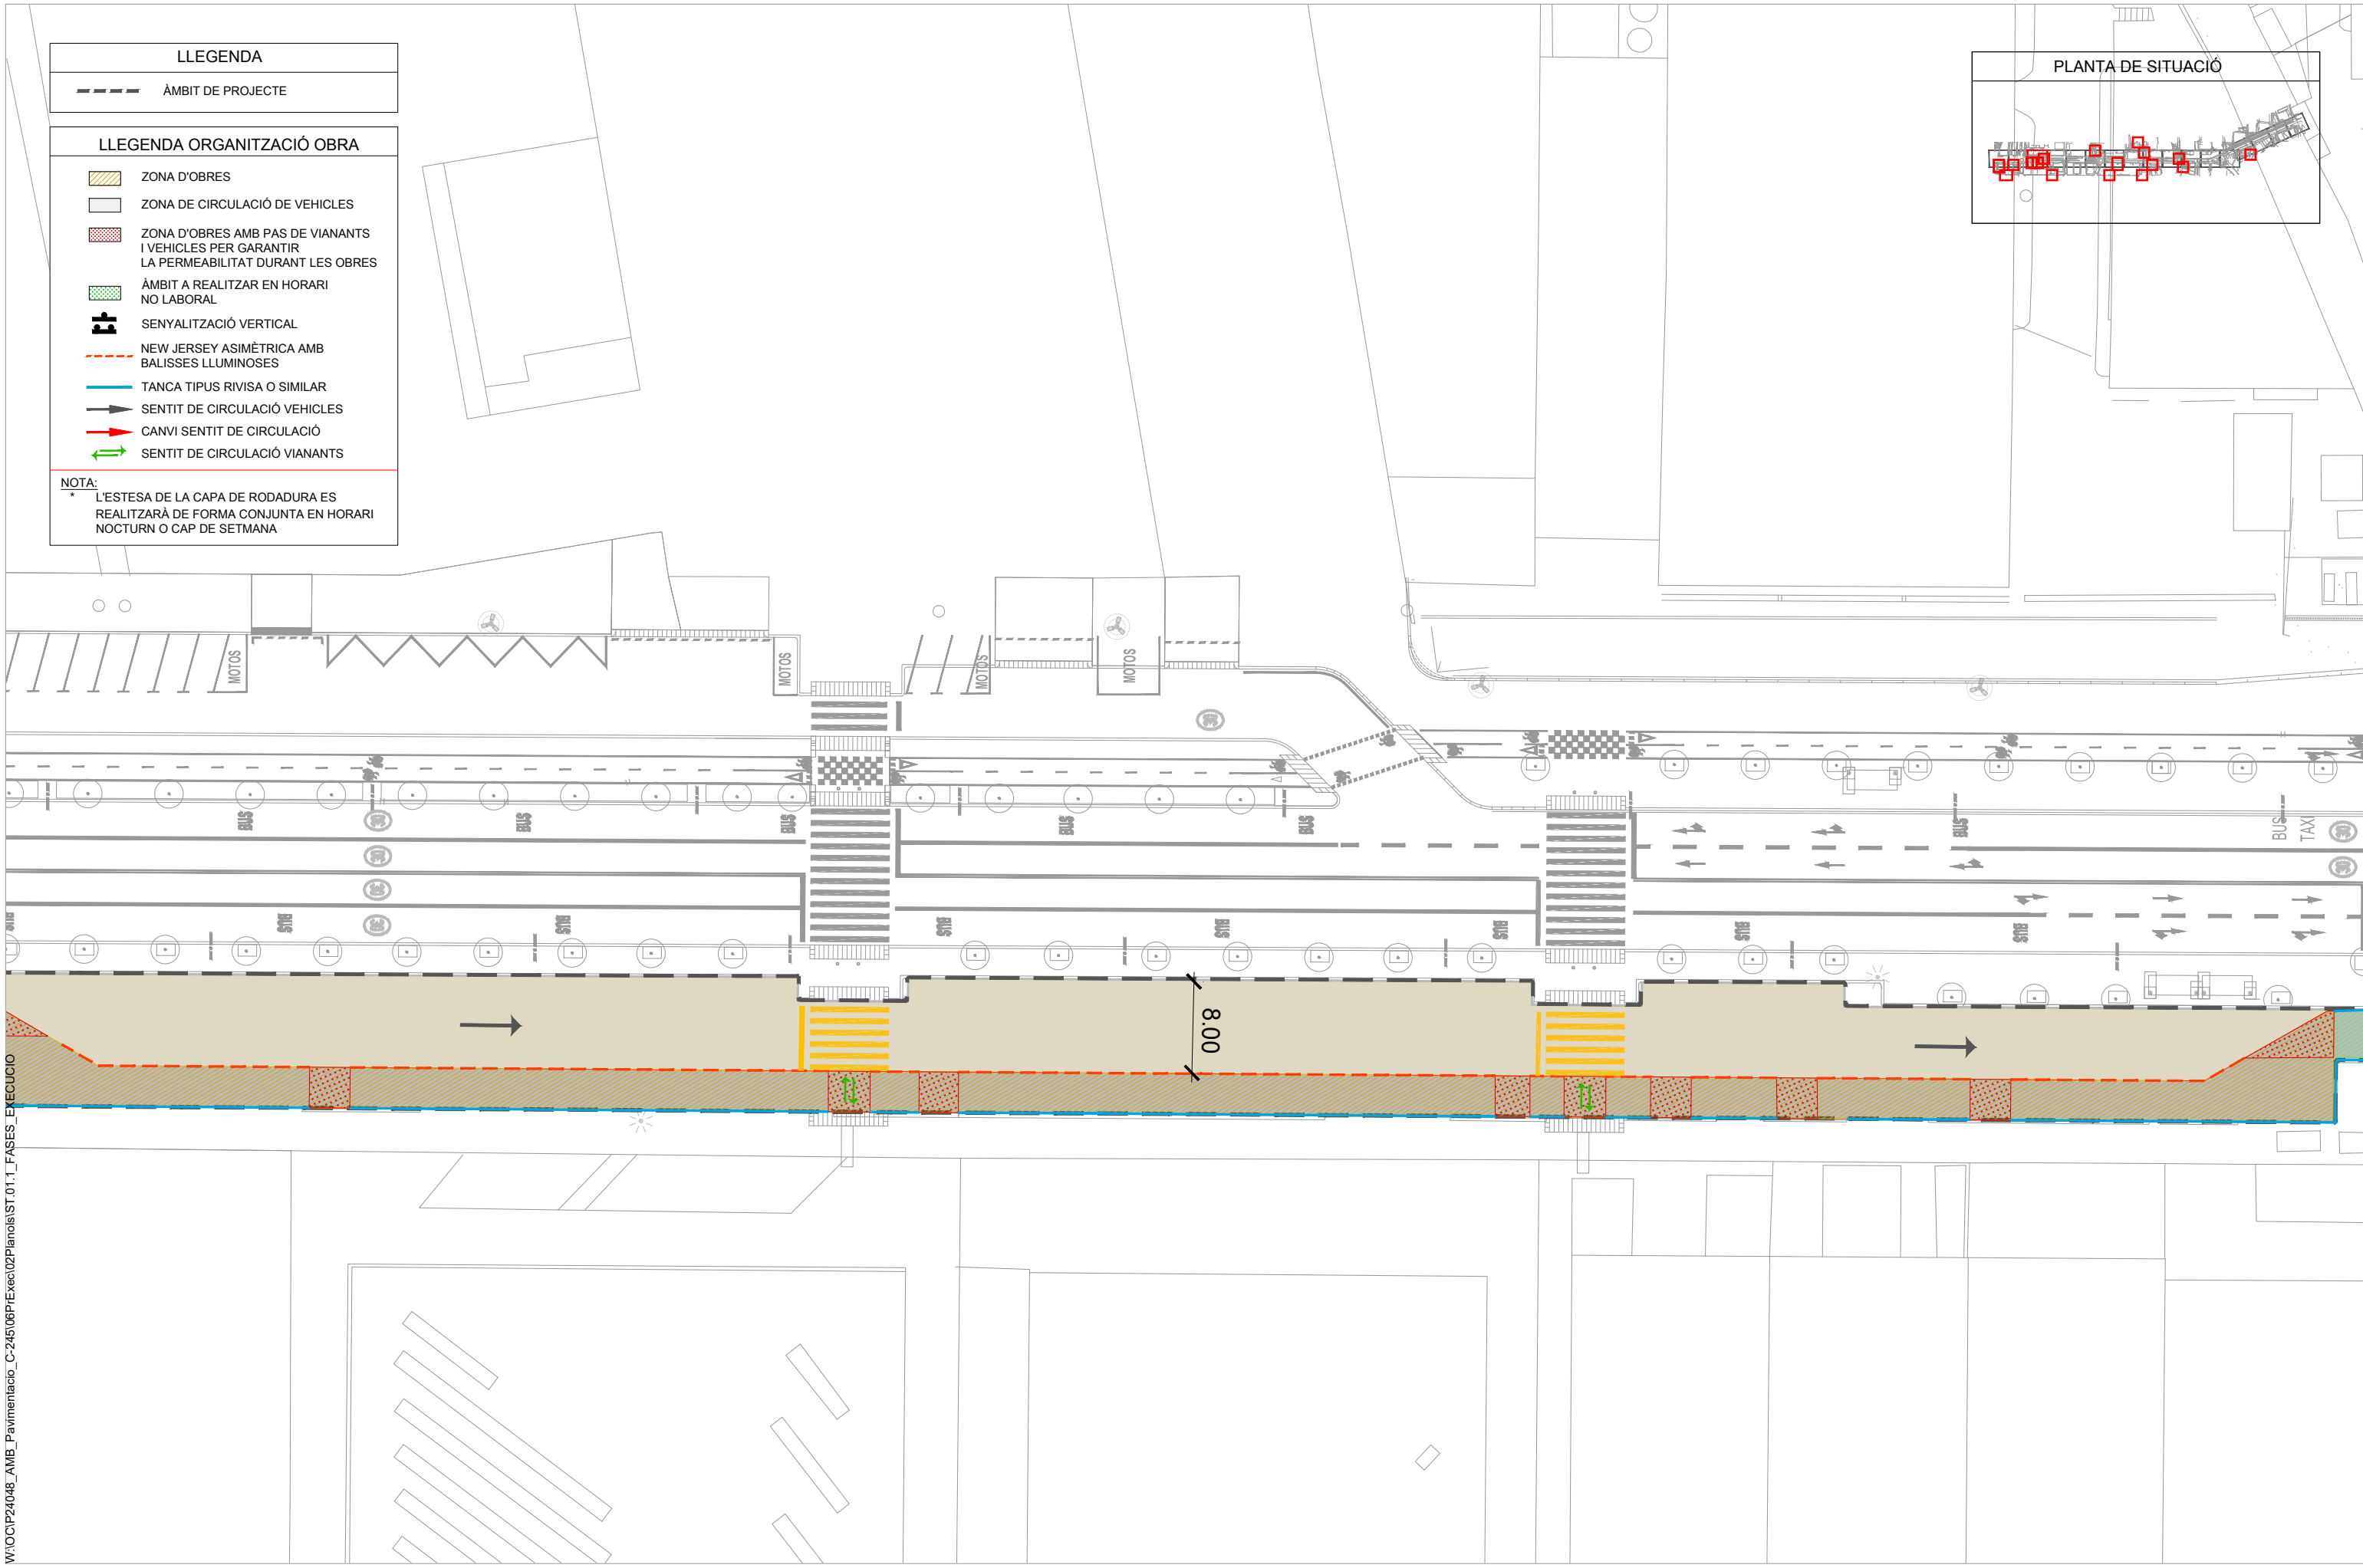

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PlExec\02Planois\ST.01.1_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
 DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
 BANDA MAR DE LA C-245
 SANT BOI DE LLOBREGAT

ST FASES EXECUCIÓ I
 SENYALITZACIÓ

JULIOL 2025 FASE 1



ST.01.04

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA


--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

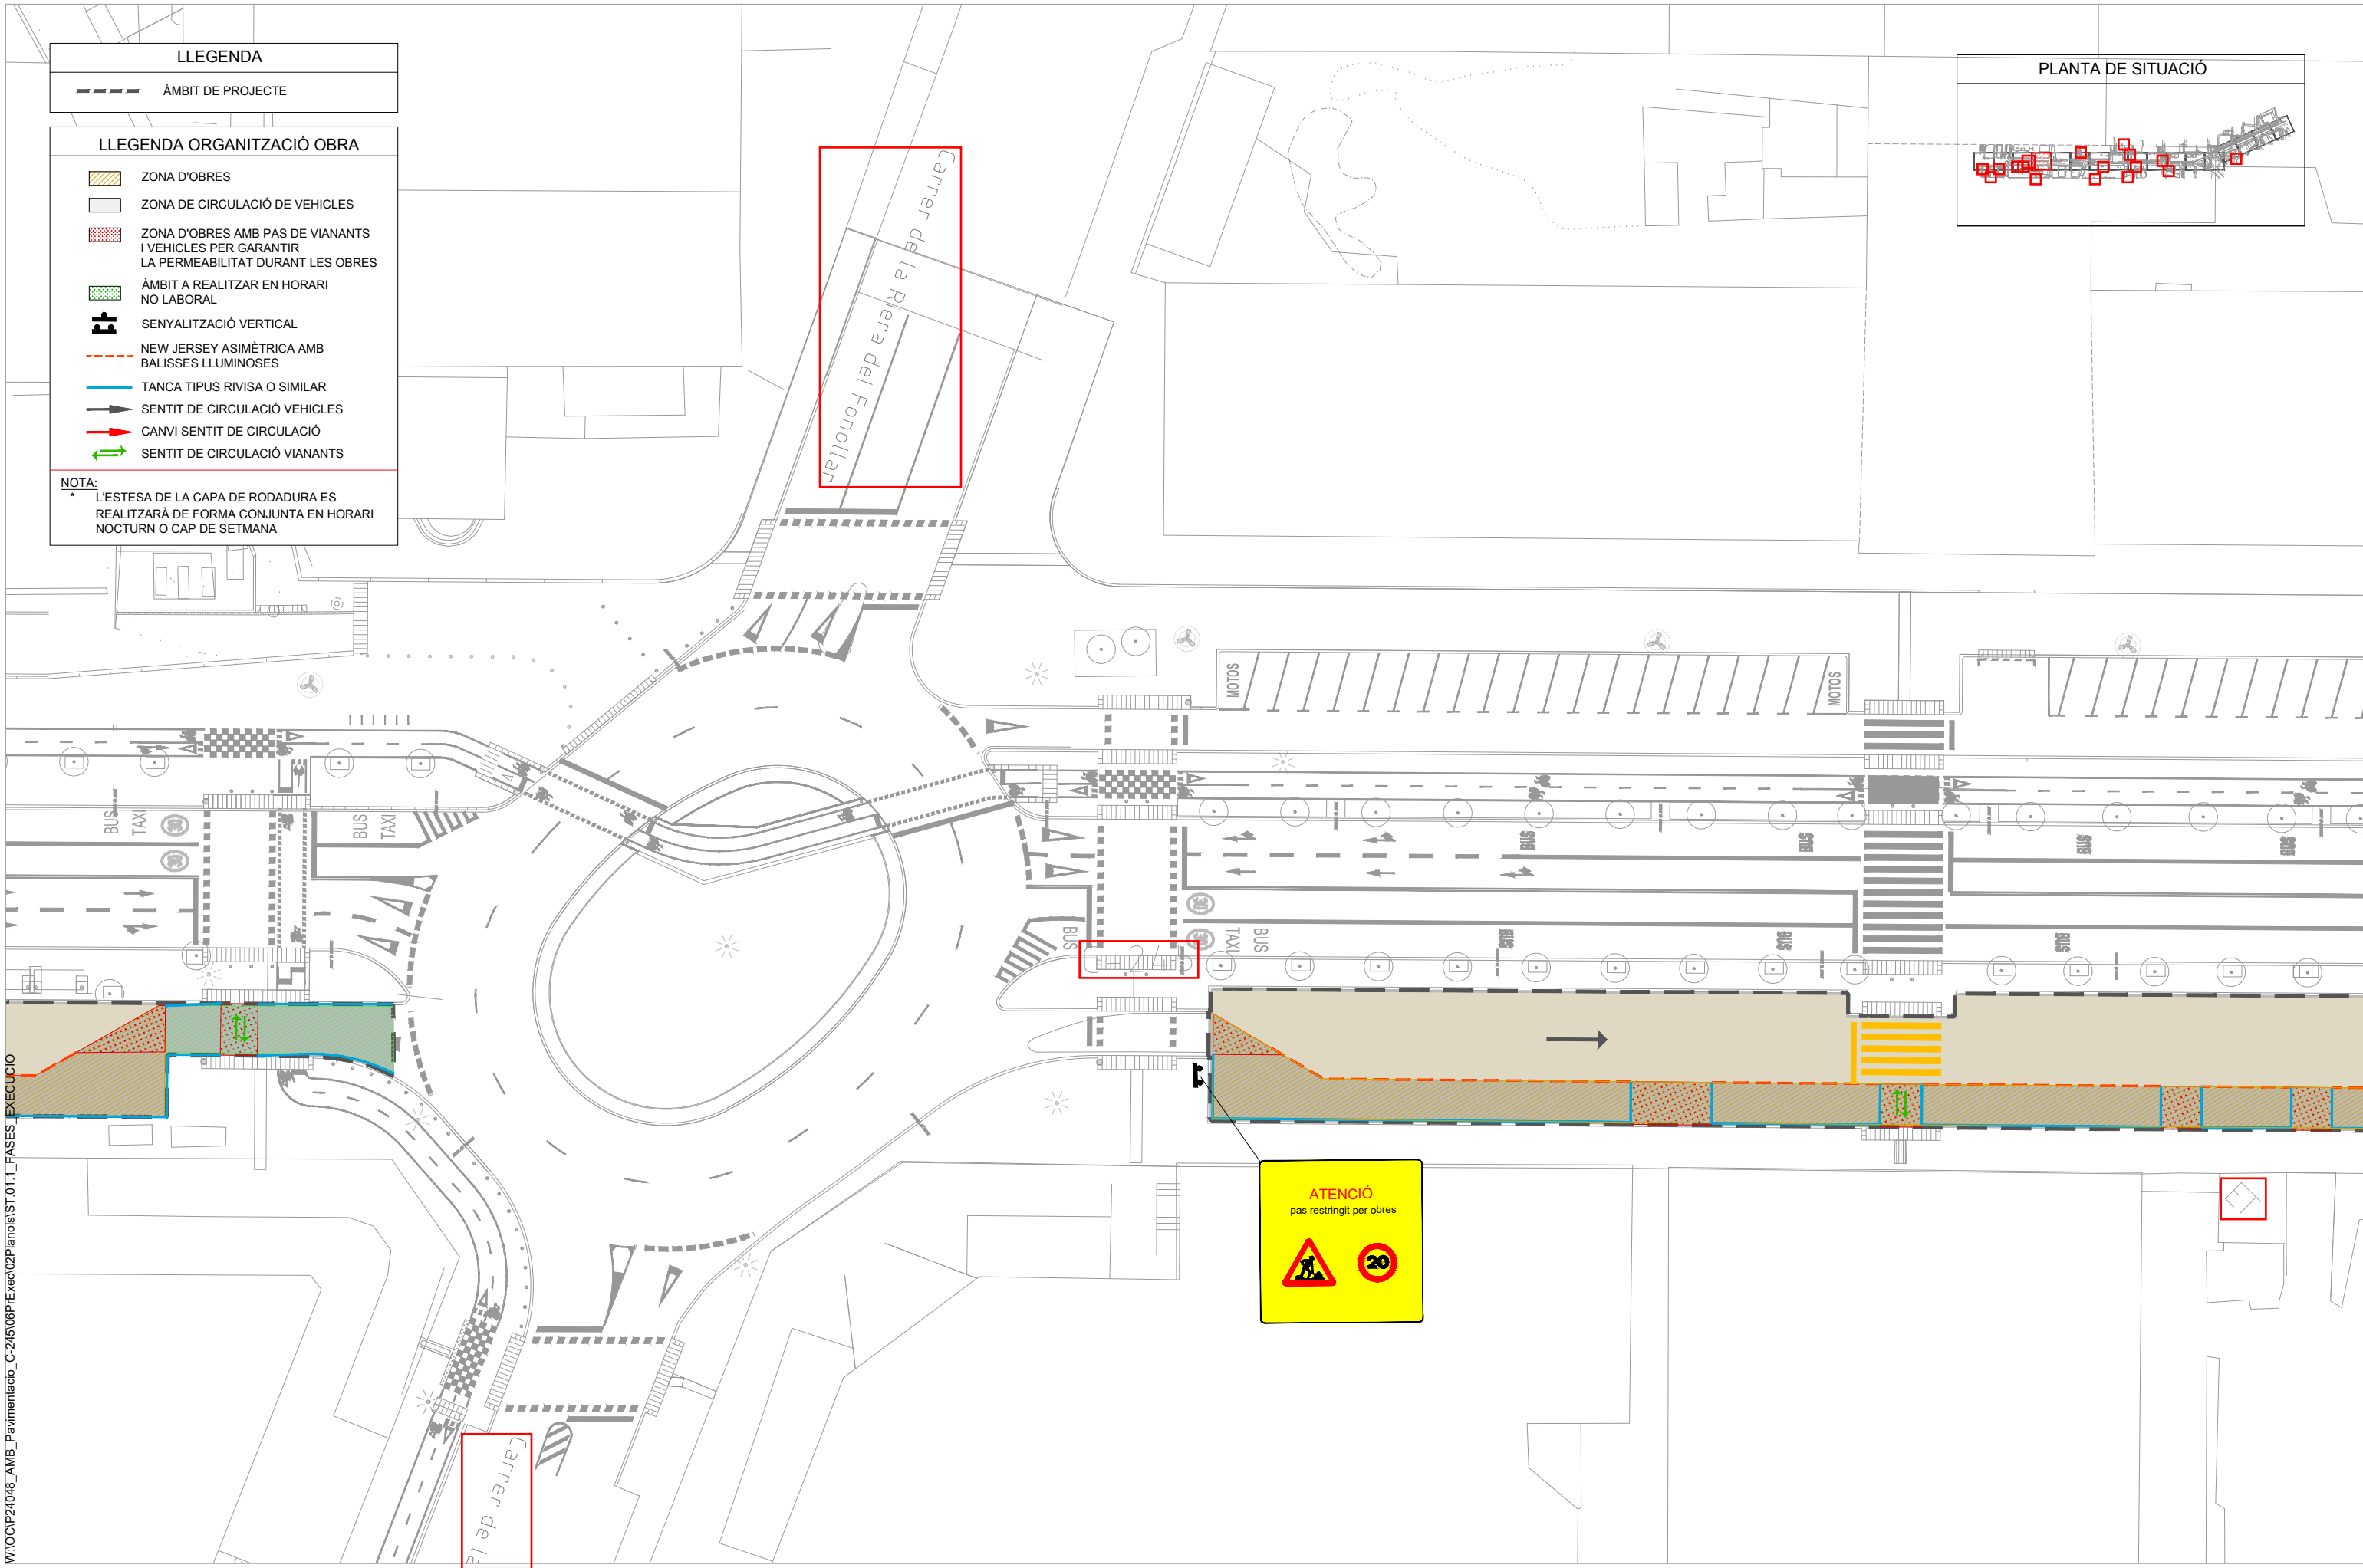

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PrExec\02Planois\ST.01.1_FASES EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 1

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ



ST.01.05

V.00 DD/MM/AAAA


A3 E: 1/500

LLEGENDA	
	ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA	
	ZONA D'OBRES
	ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
	ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
	ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
	SENYALITZACIÓ VERTICAL
	NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
	TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
	SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
	CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
	SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

Ptge. de Gàller



Carreter d'Àlaba

Carretera de Santa Creu de Calafell

8.00



Carreter d'Àlaba

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PrExec\02Planois\ST.01.06_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 1

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ



ST.01.06

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA


--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA: L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ



Passatge del Solsonès

Plaça de les Garrigues

Plaça del Vallespir

Plaça Ripollès

Plaça d'Osona

Passatge del Solsonès

C-245

8.00

ATENCIÓ pas restringit per obres



Carrer d'Àlaba

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PIExec\02Planois\ST.01.1_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 1

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.01.07











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

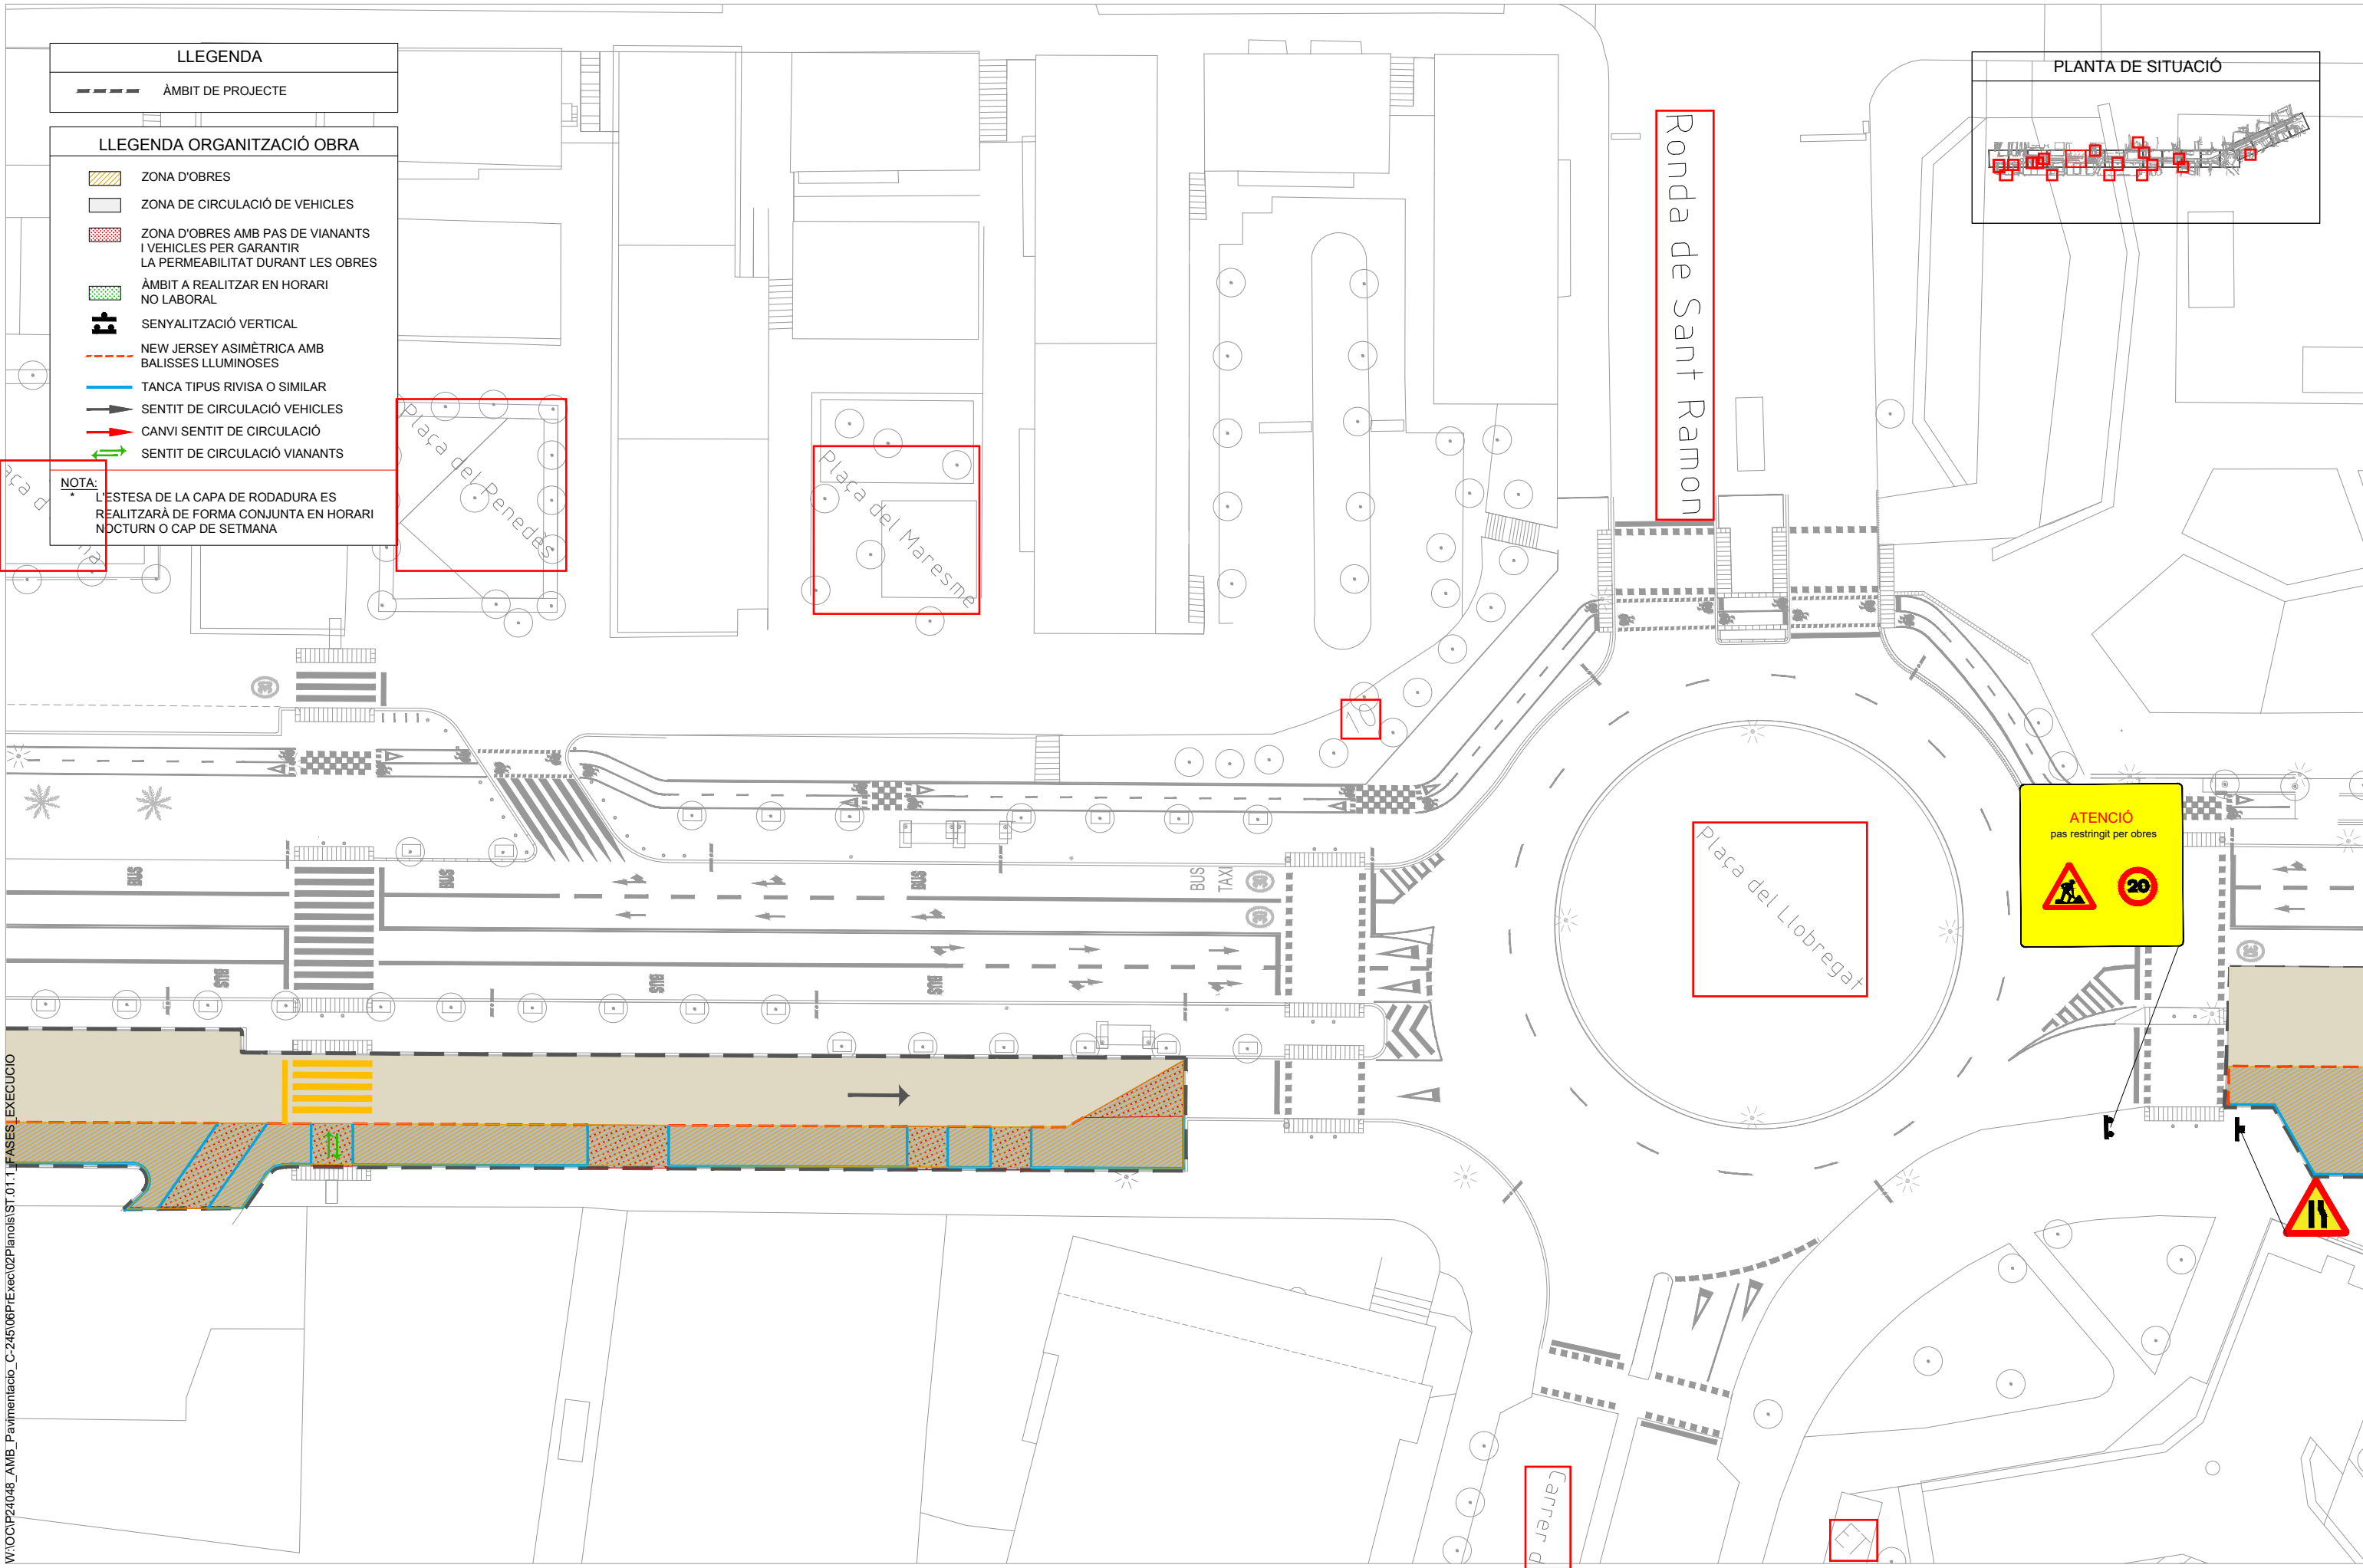

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06P1Exec\02Planois\ST.01.1_FASES EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ

JULIOL 2025 FASE 1



ST.01.08











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
 * L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

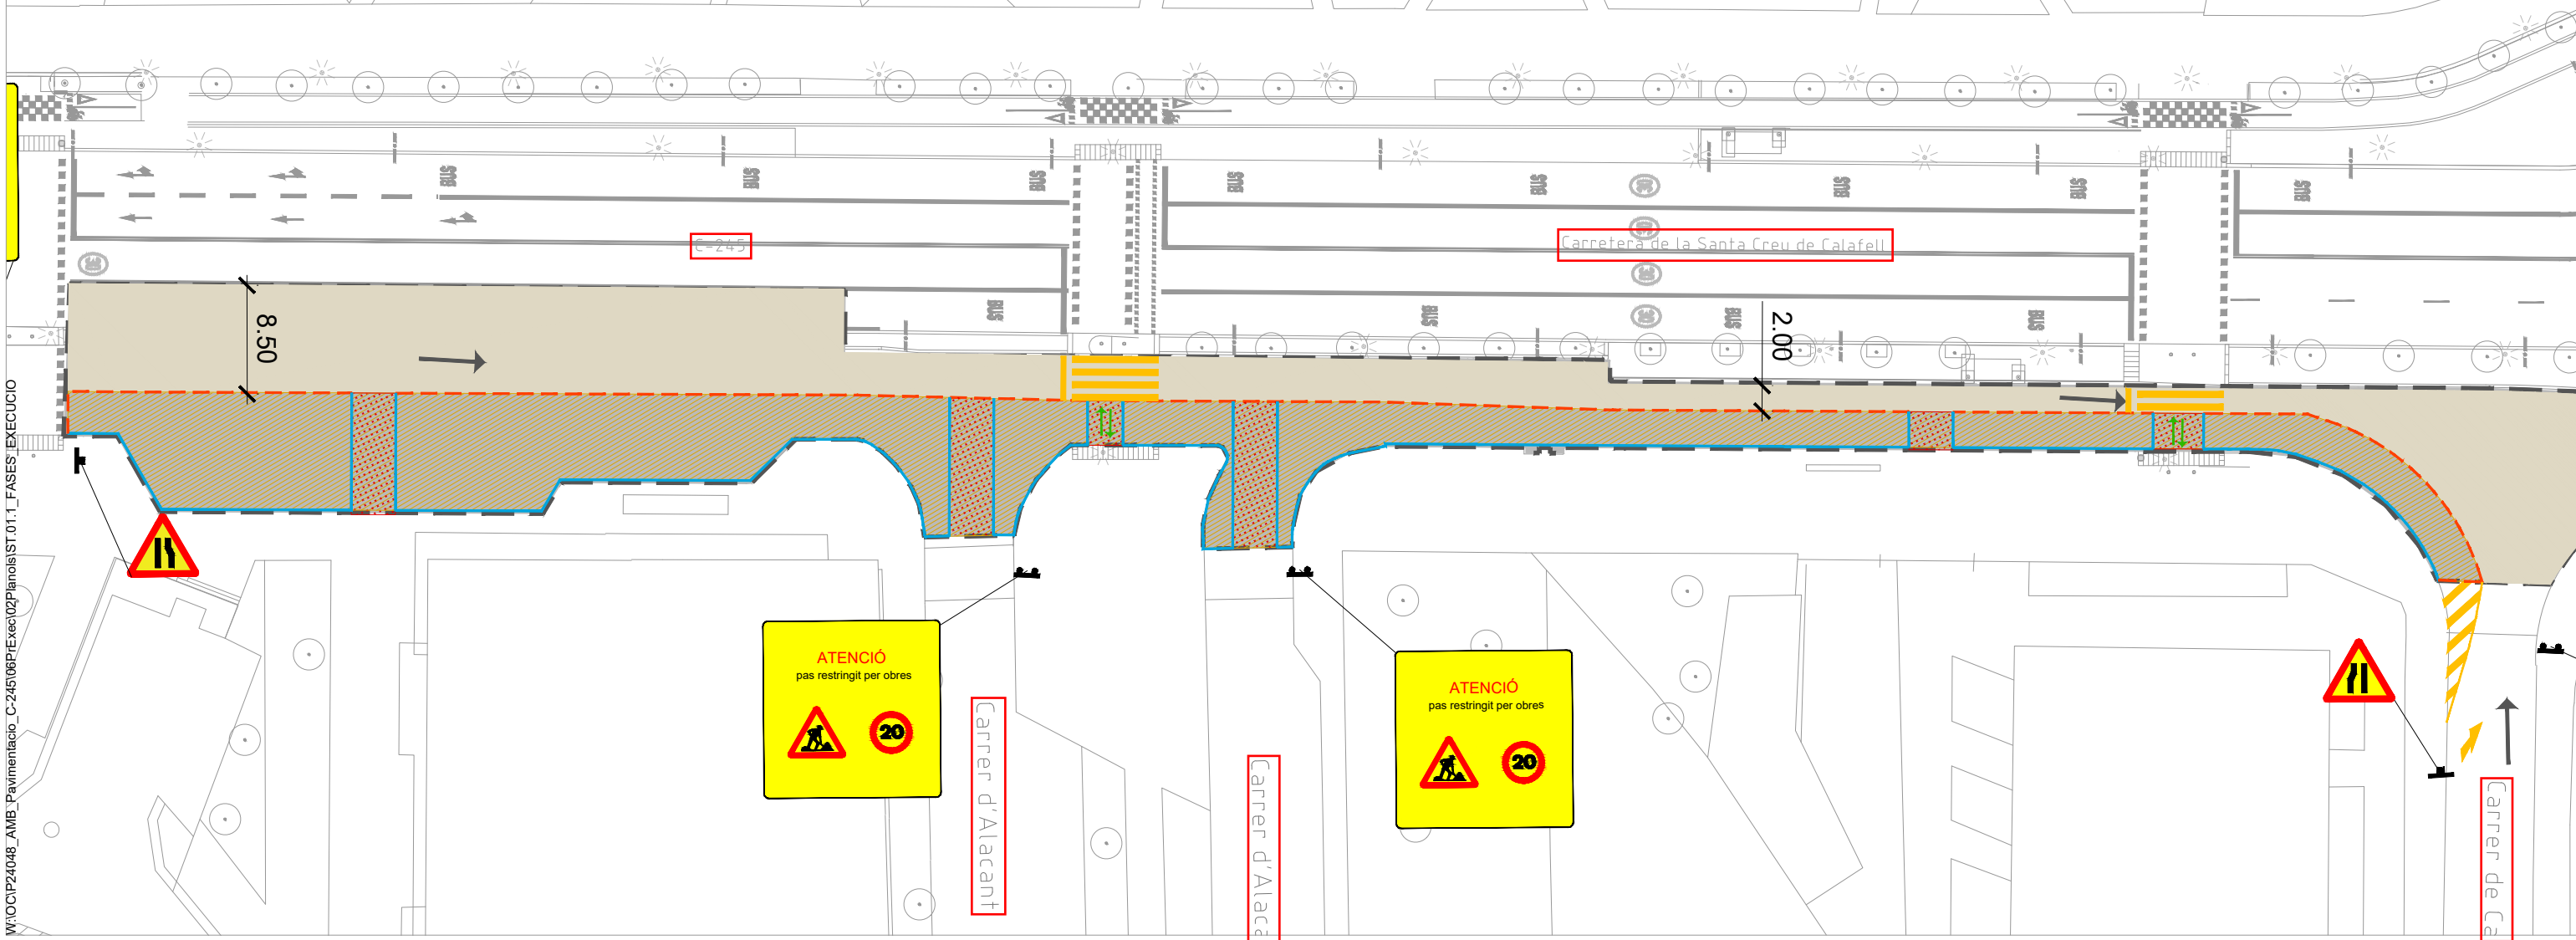











W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PlExec\02Planois\ST.01.1_FASES_EXECUCIO

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

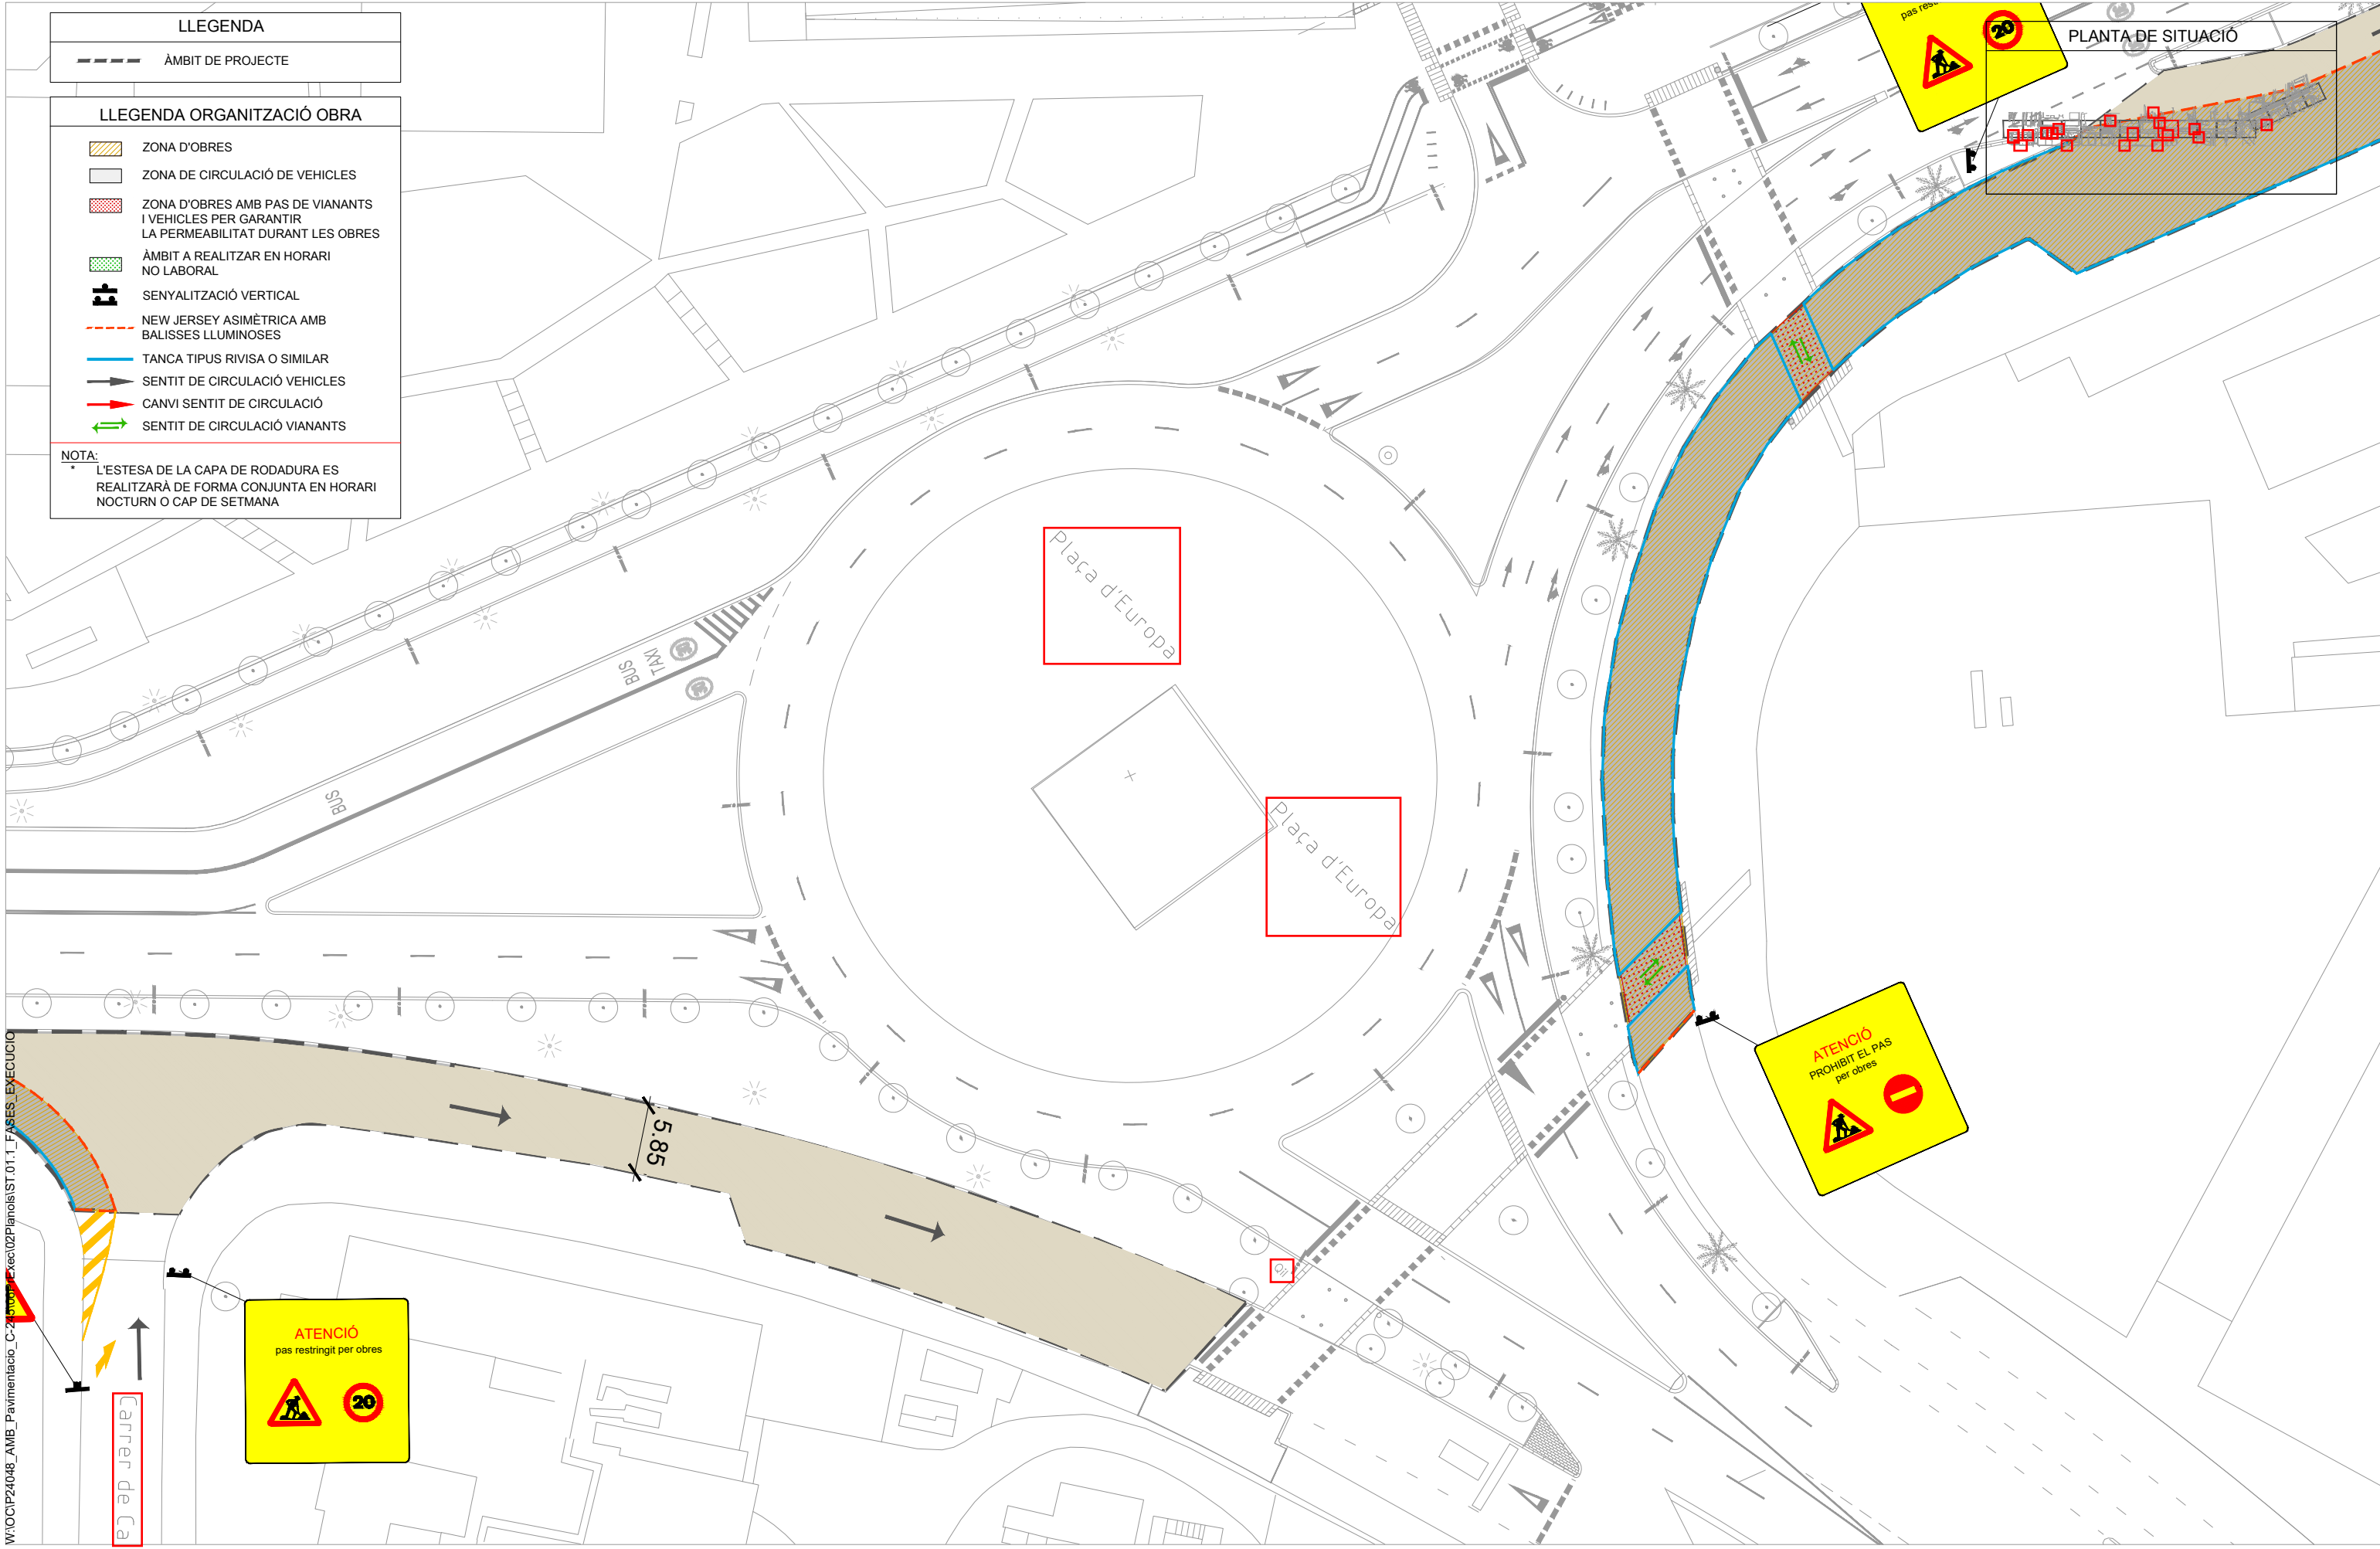

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\Exec02\Planois\ST.01.10_FASES_EXECUCIÓ



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ

JULIOL 2025 FASE 1



ST.01.10
V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA


--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ



8070

-24.5

3.50



W:\OC\IP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PlExec\02Planois\ST.01.1_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ

FASE 1



ST.01.11 V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA: L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

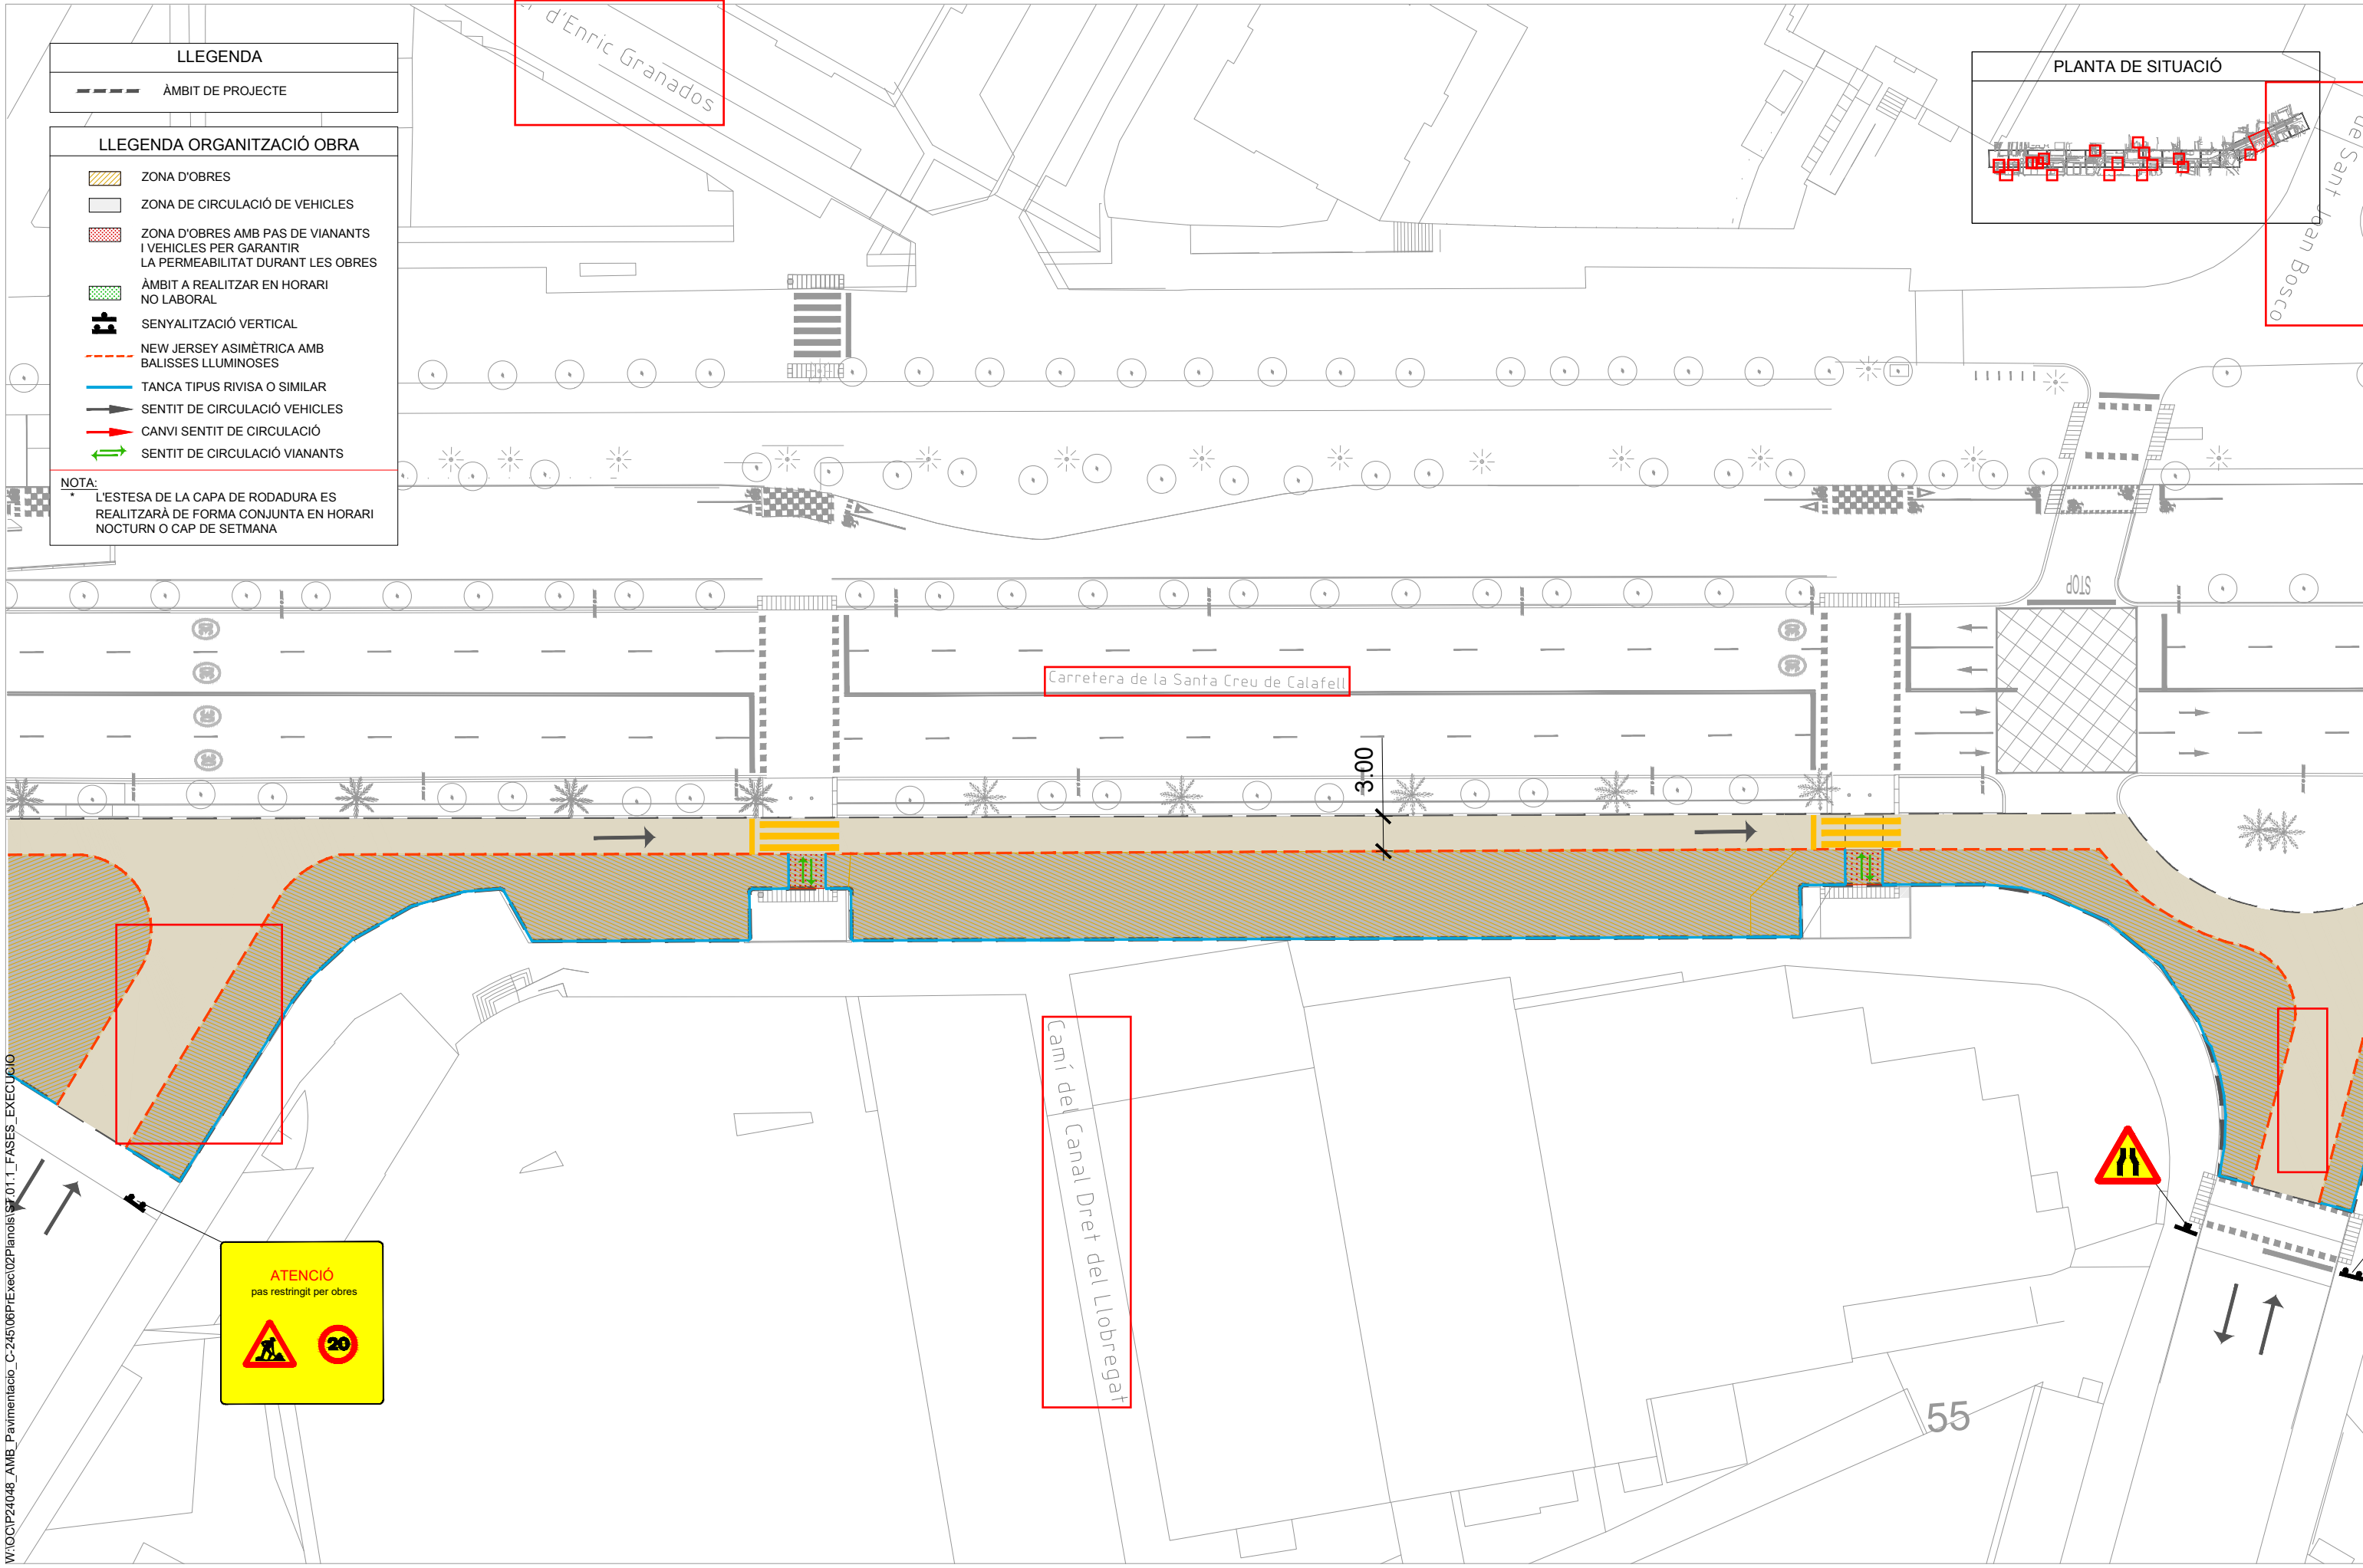

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PrExec\02Planols\ST.01.12_FASES_EXECUCIÓ



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 1

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.01.12











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

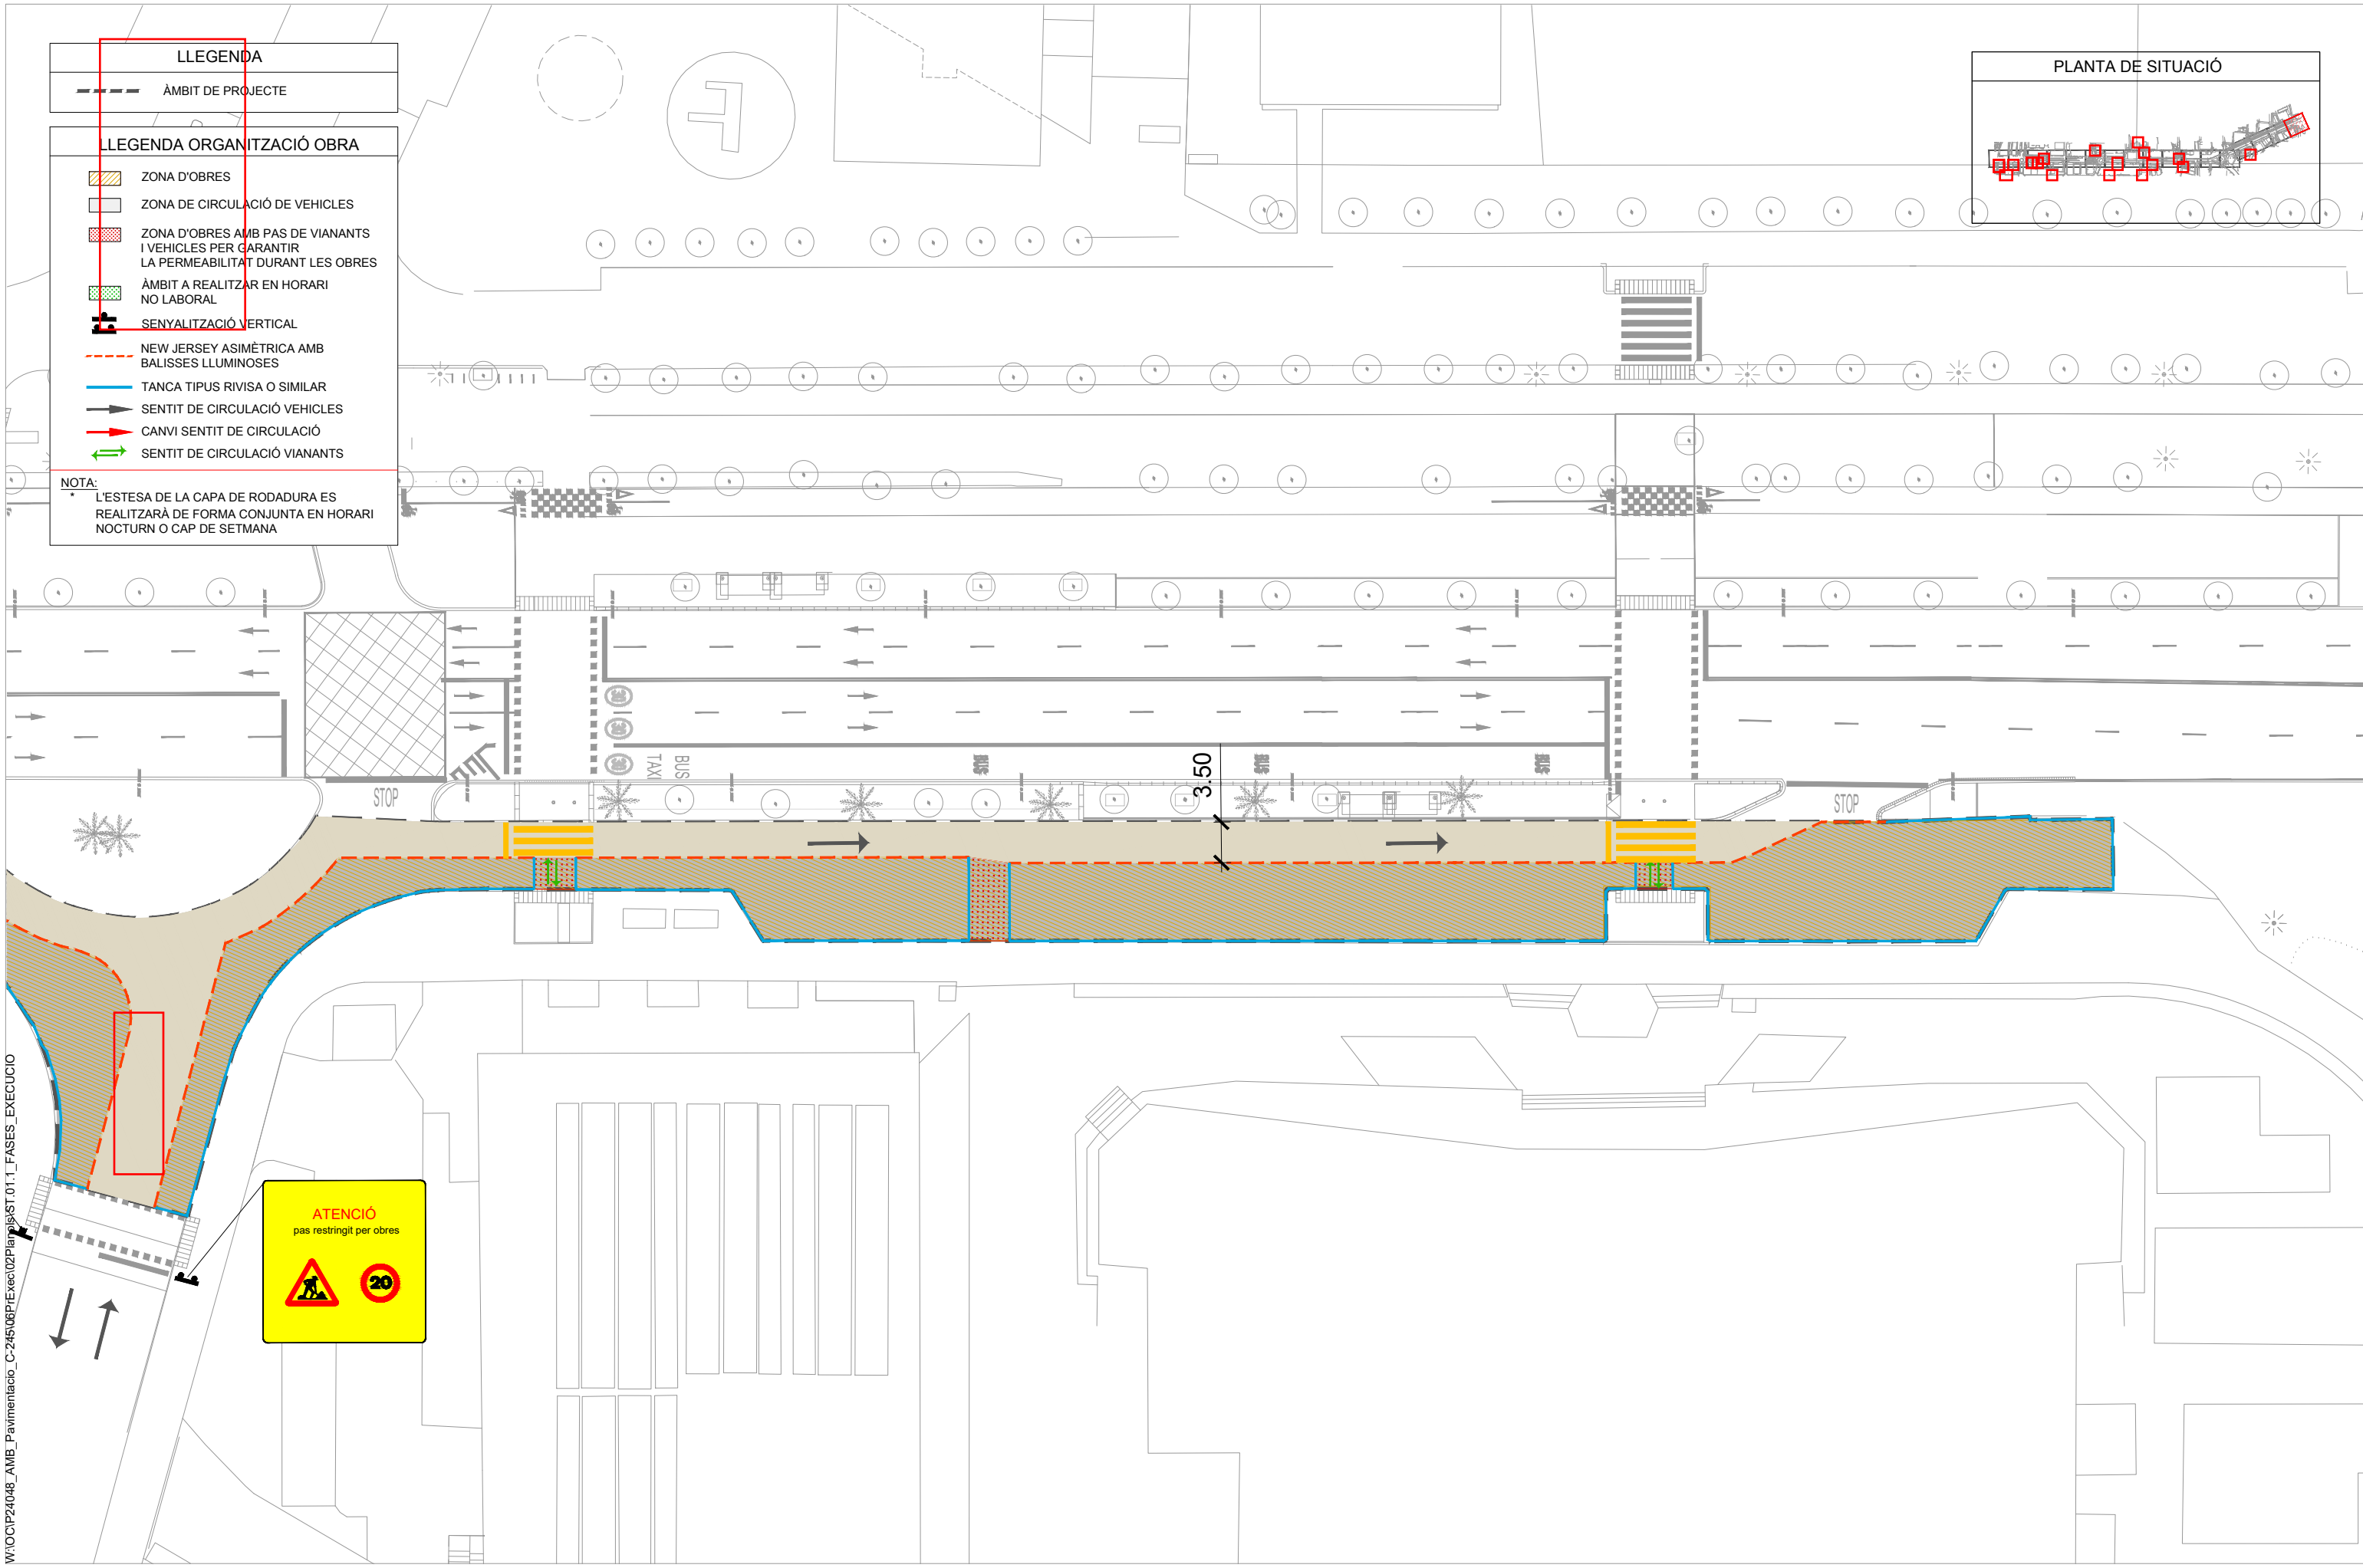

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PIExec\02Plans\ST.01.11_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ


FASE 1



ST.01.13

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

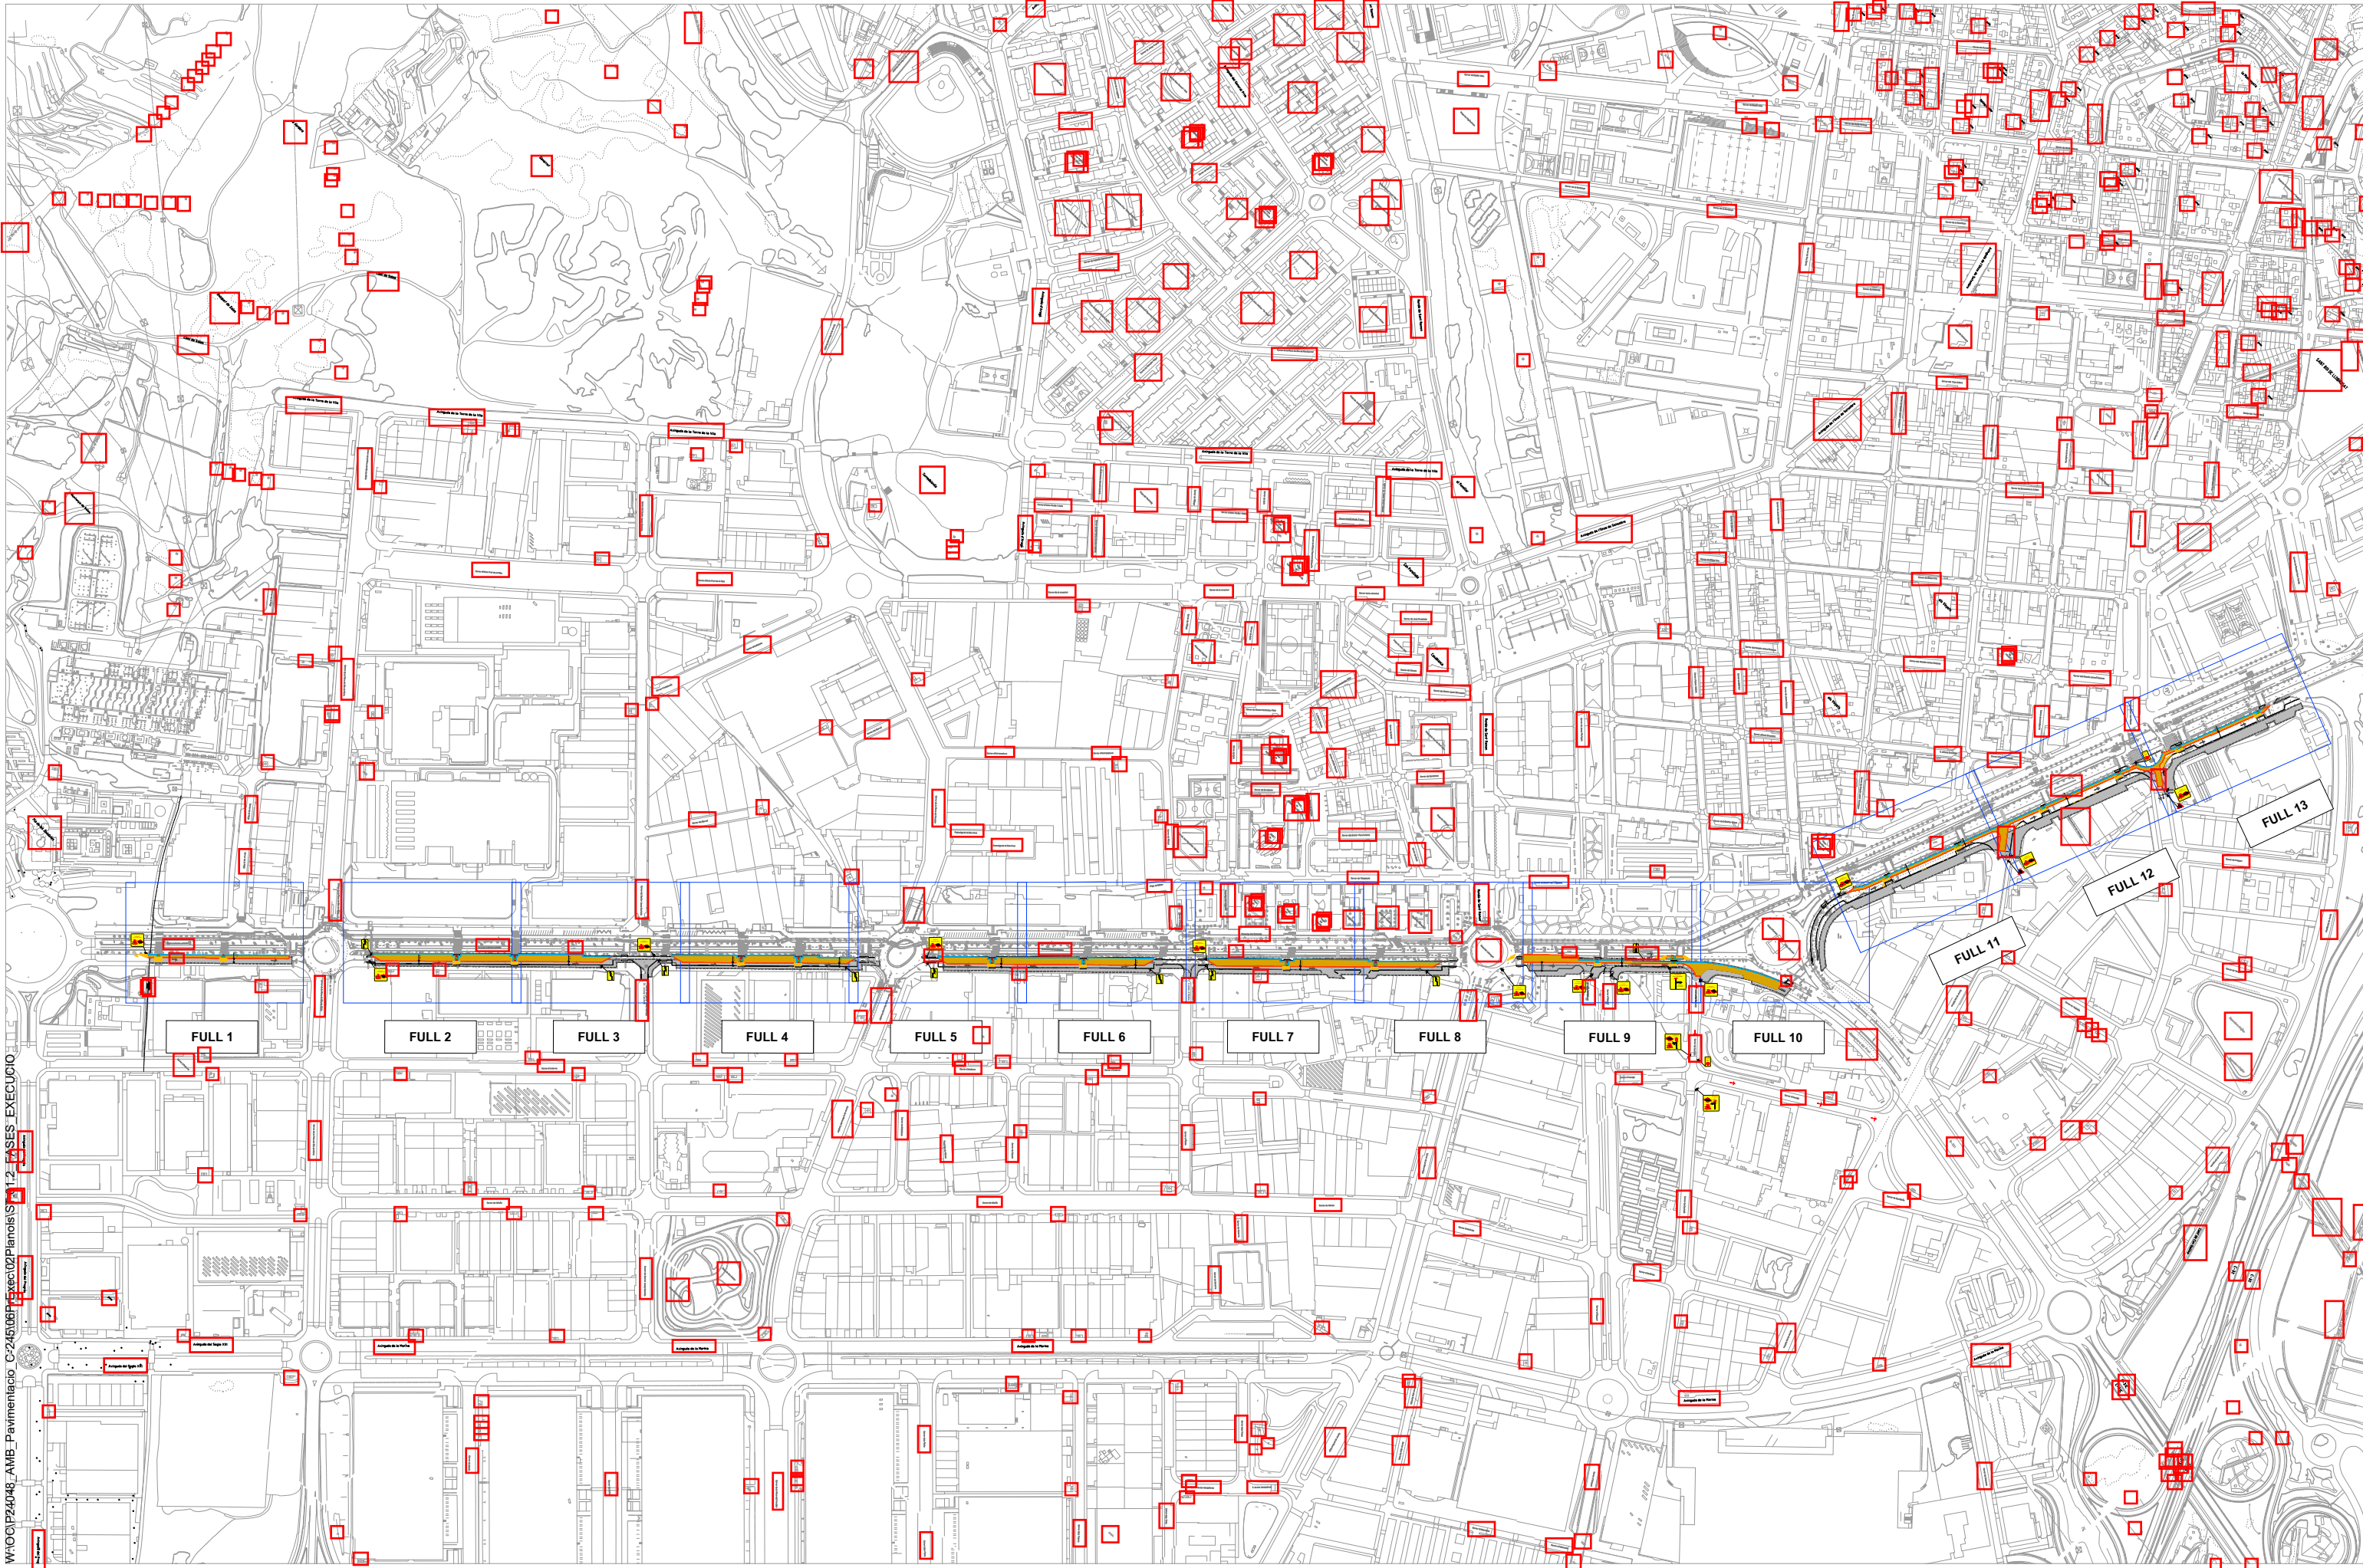

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C245\08Fases\Exec02\Planos\ST.02.00_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
BANDA MAR DE LA C-245
SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ













ST.02.00
V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/7000

LLEGENDA

--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ



ATENCIÓ
pas restringit per obres



Carretera de Santa Creu de Calafell

W:\OCIP\24048_AMB_Pavimentació_C-245\06PrExec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIÓ

LA VILLOREANA
LA SANTA BONA DE LLOBREGAT



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ













ST.02.01
V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

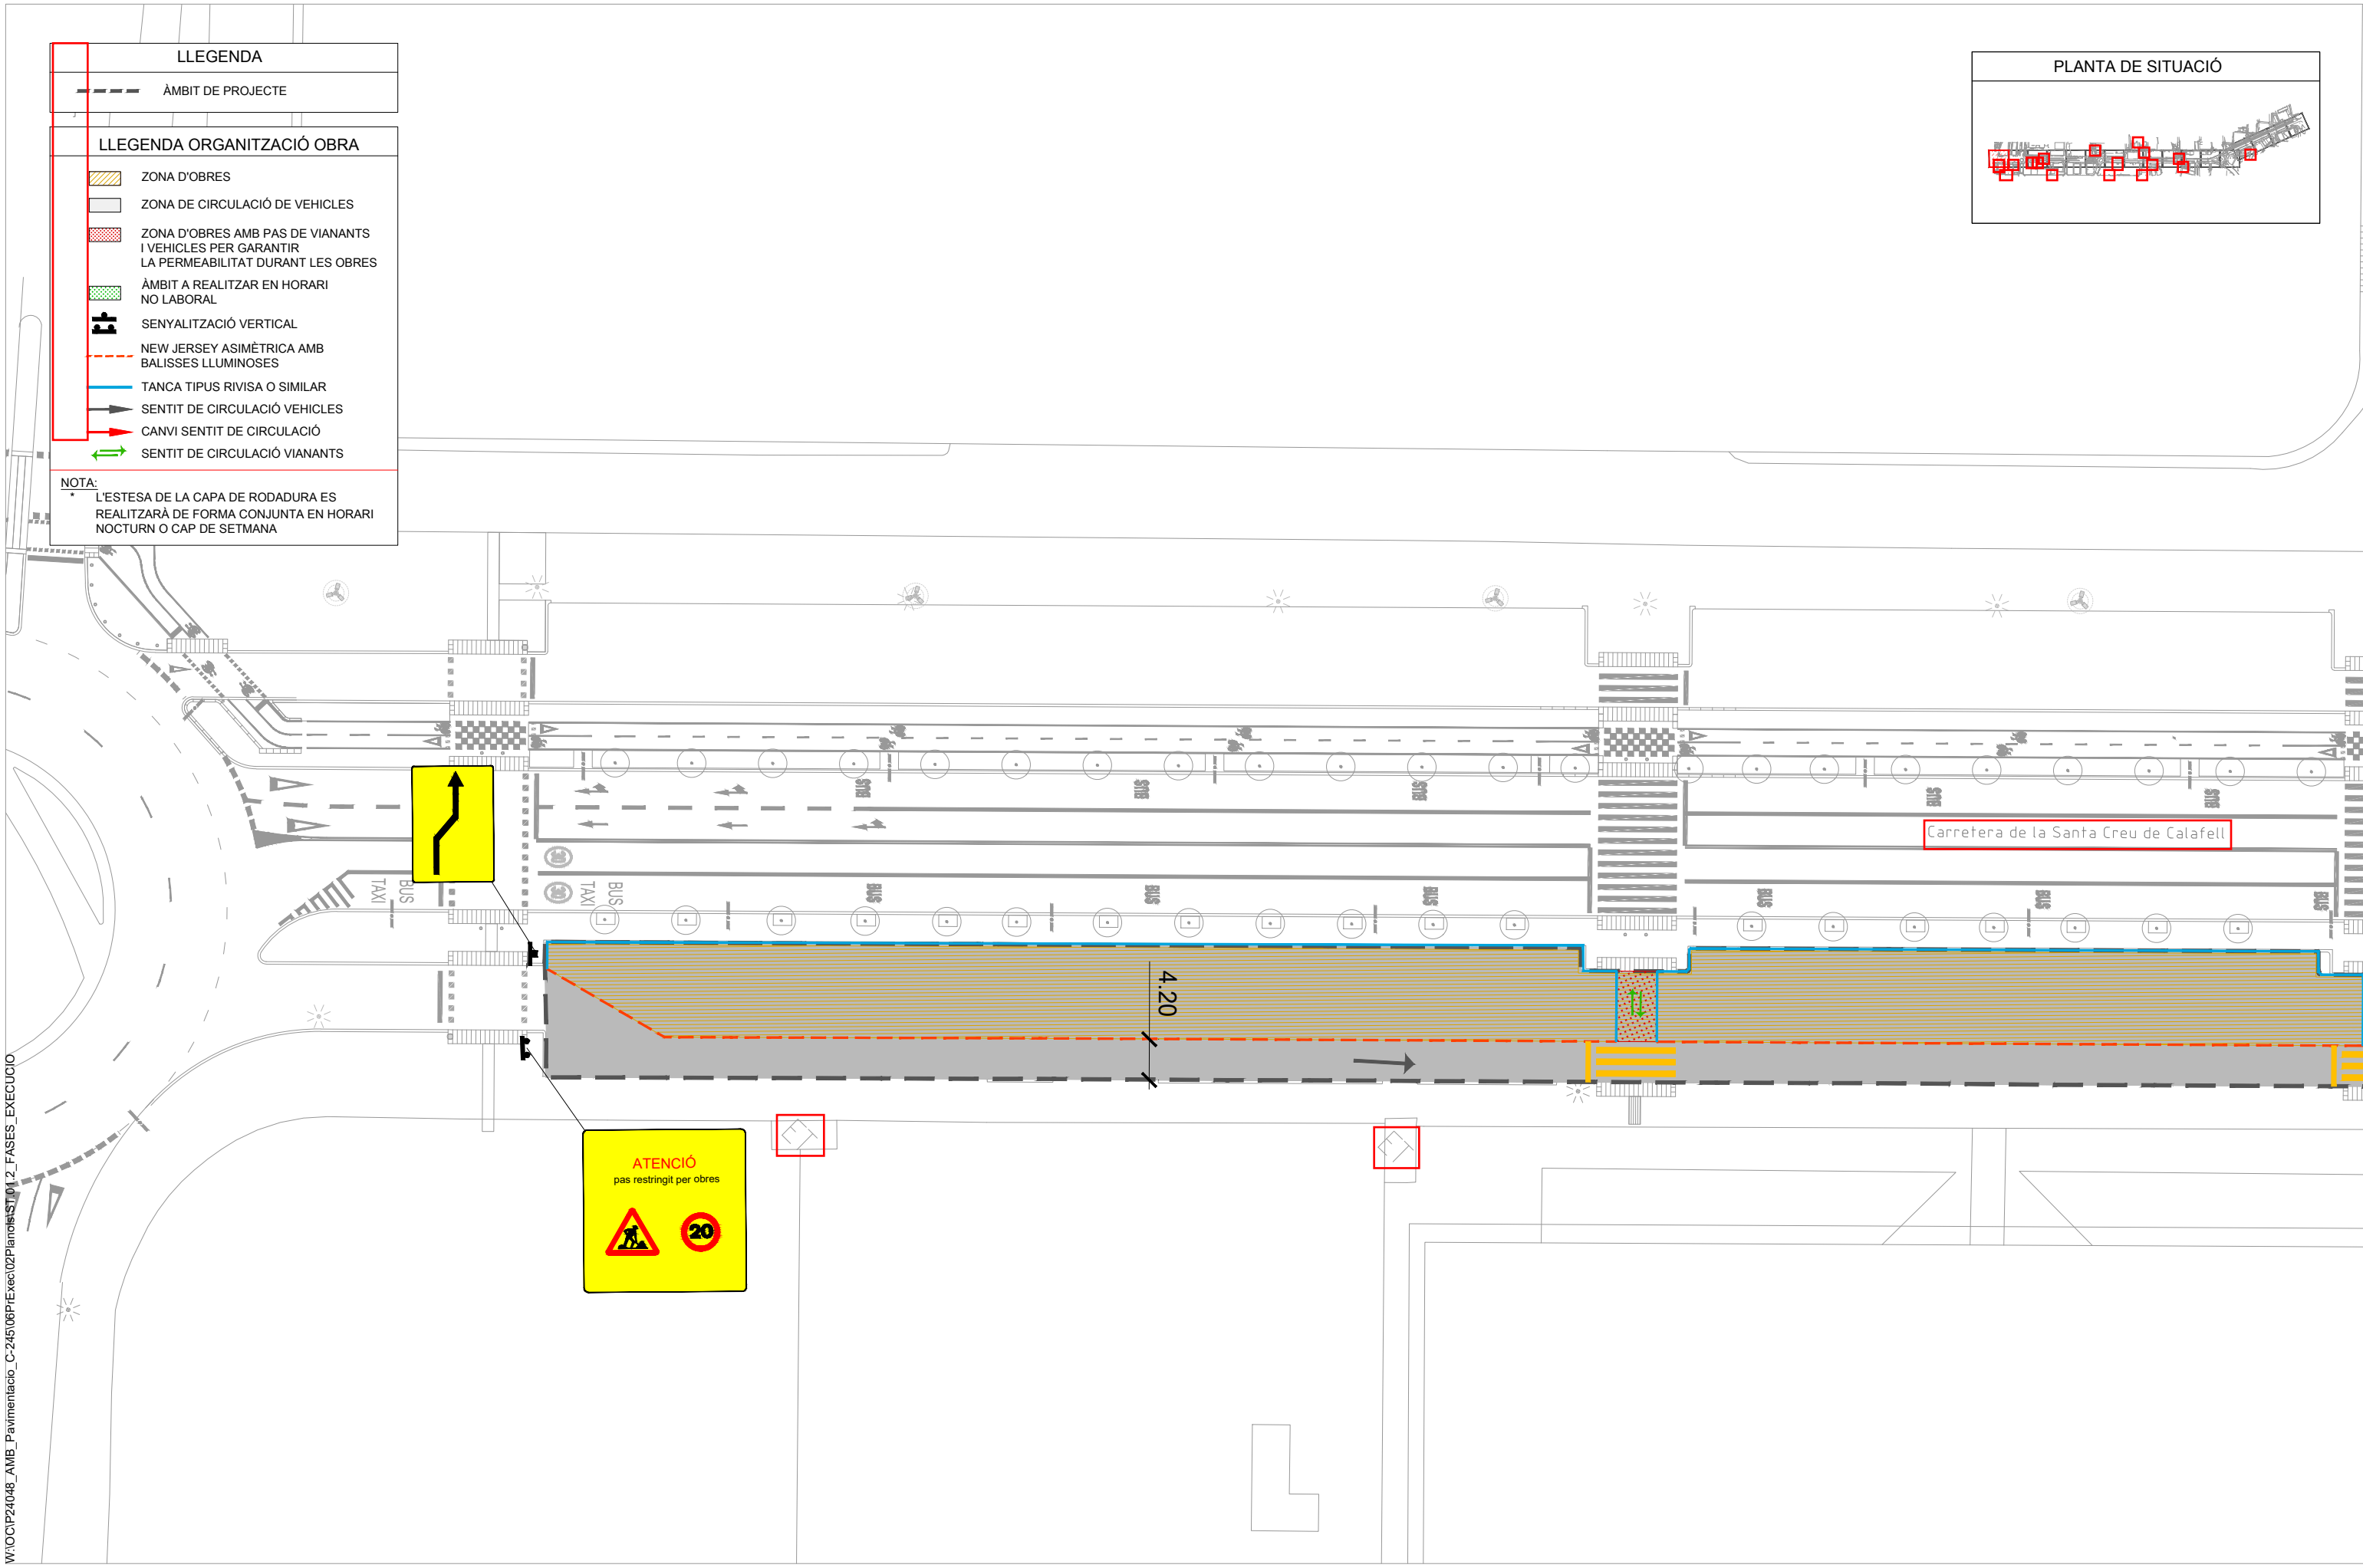

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PrExec\02Planos\ST.02_2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.02.02











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
 * L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

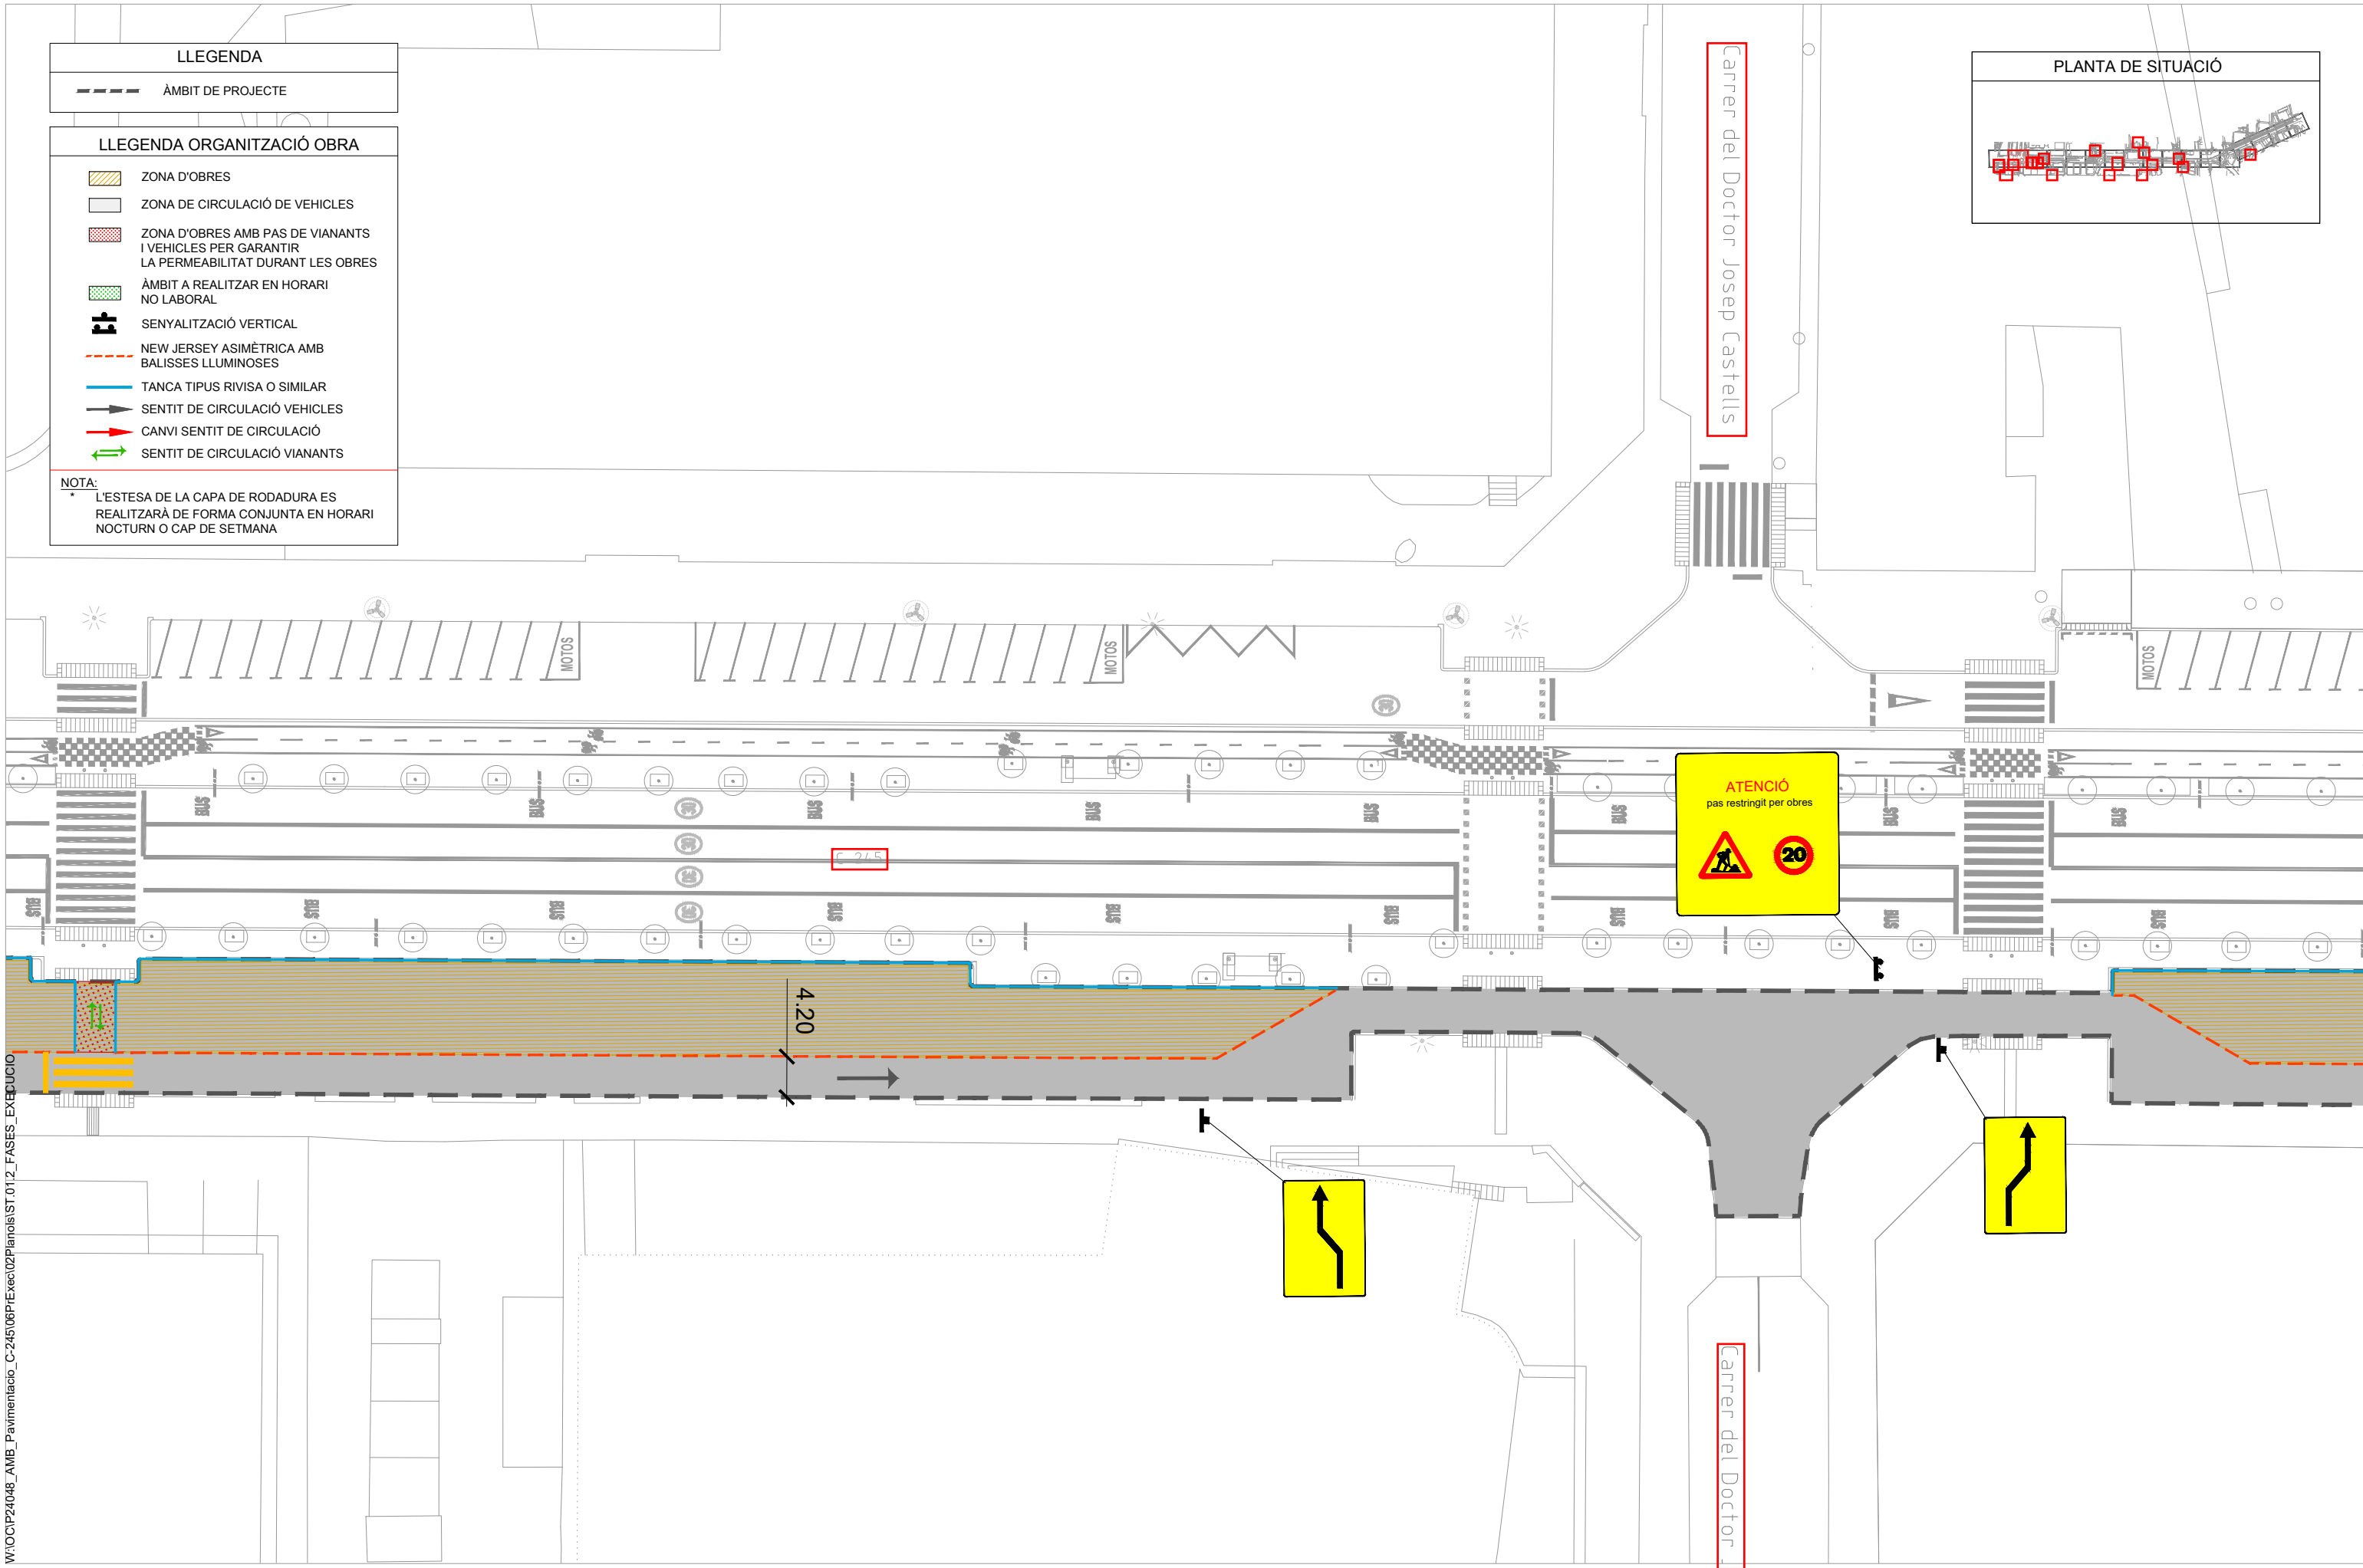

W:\OC\IP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PlExec\02Plans\IST.01.2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ

JULIOL 2025 FASE 2













ST.02.03
 V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
 L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

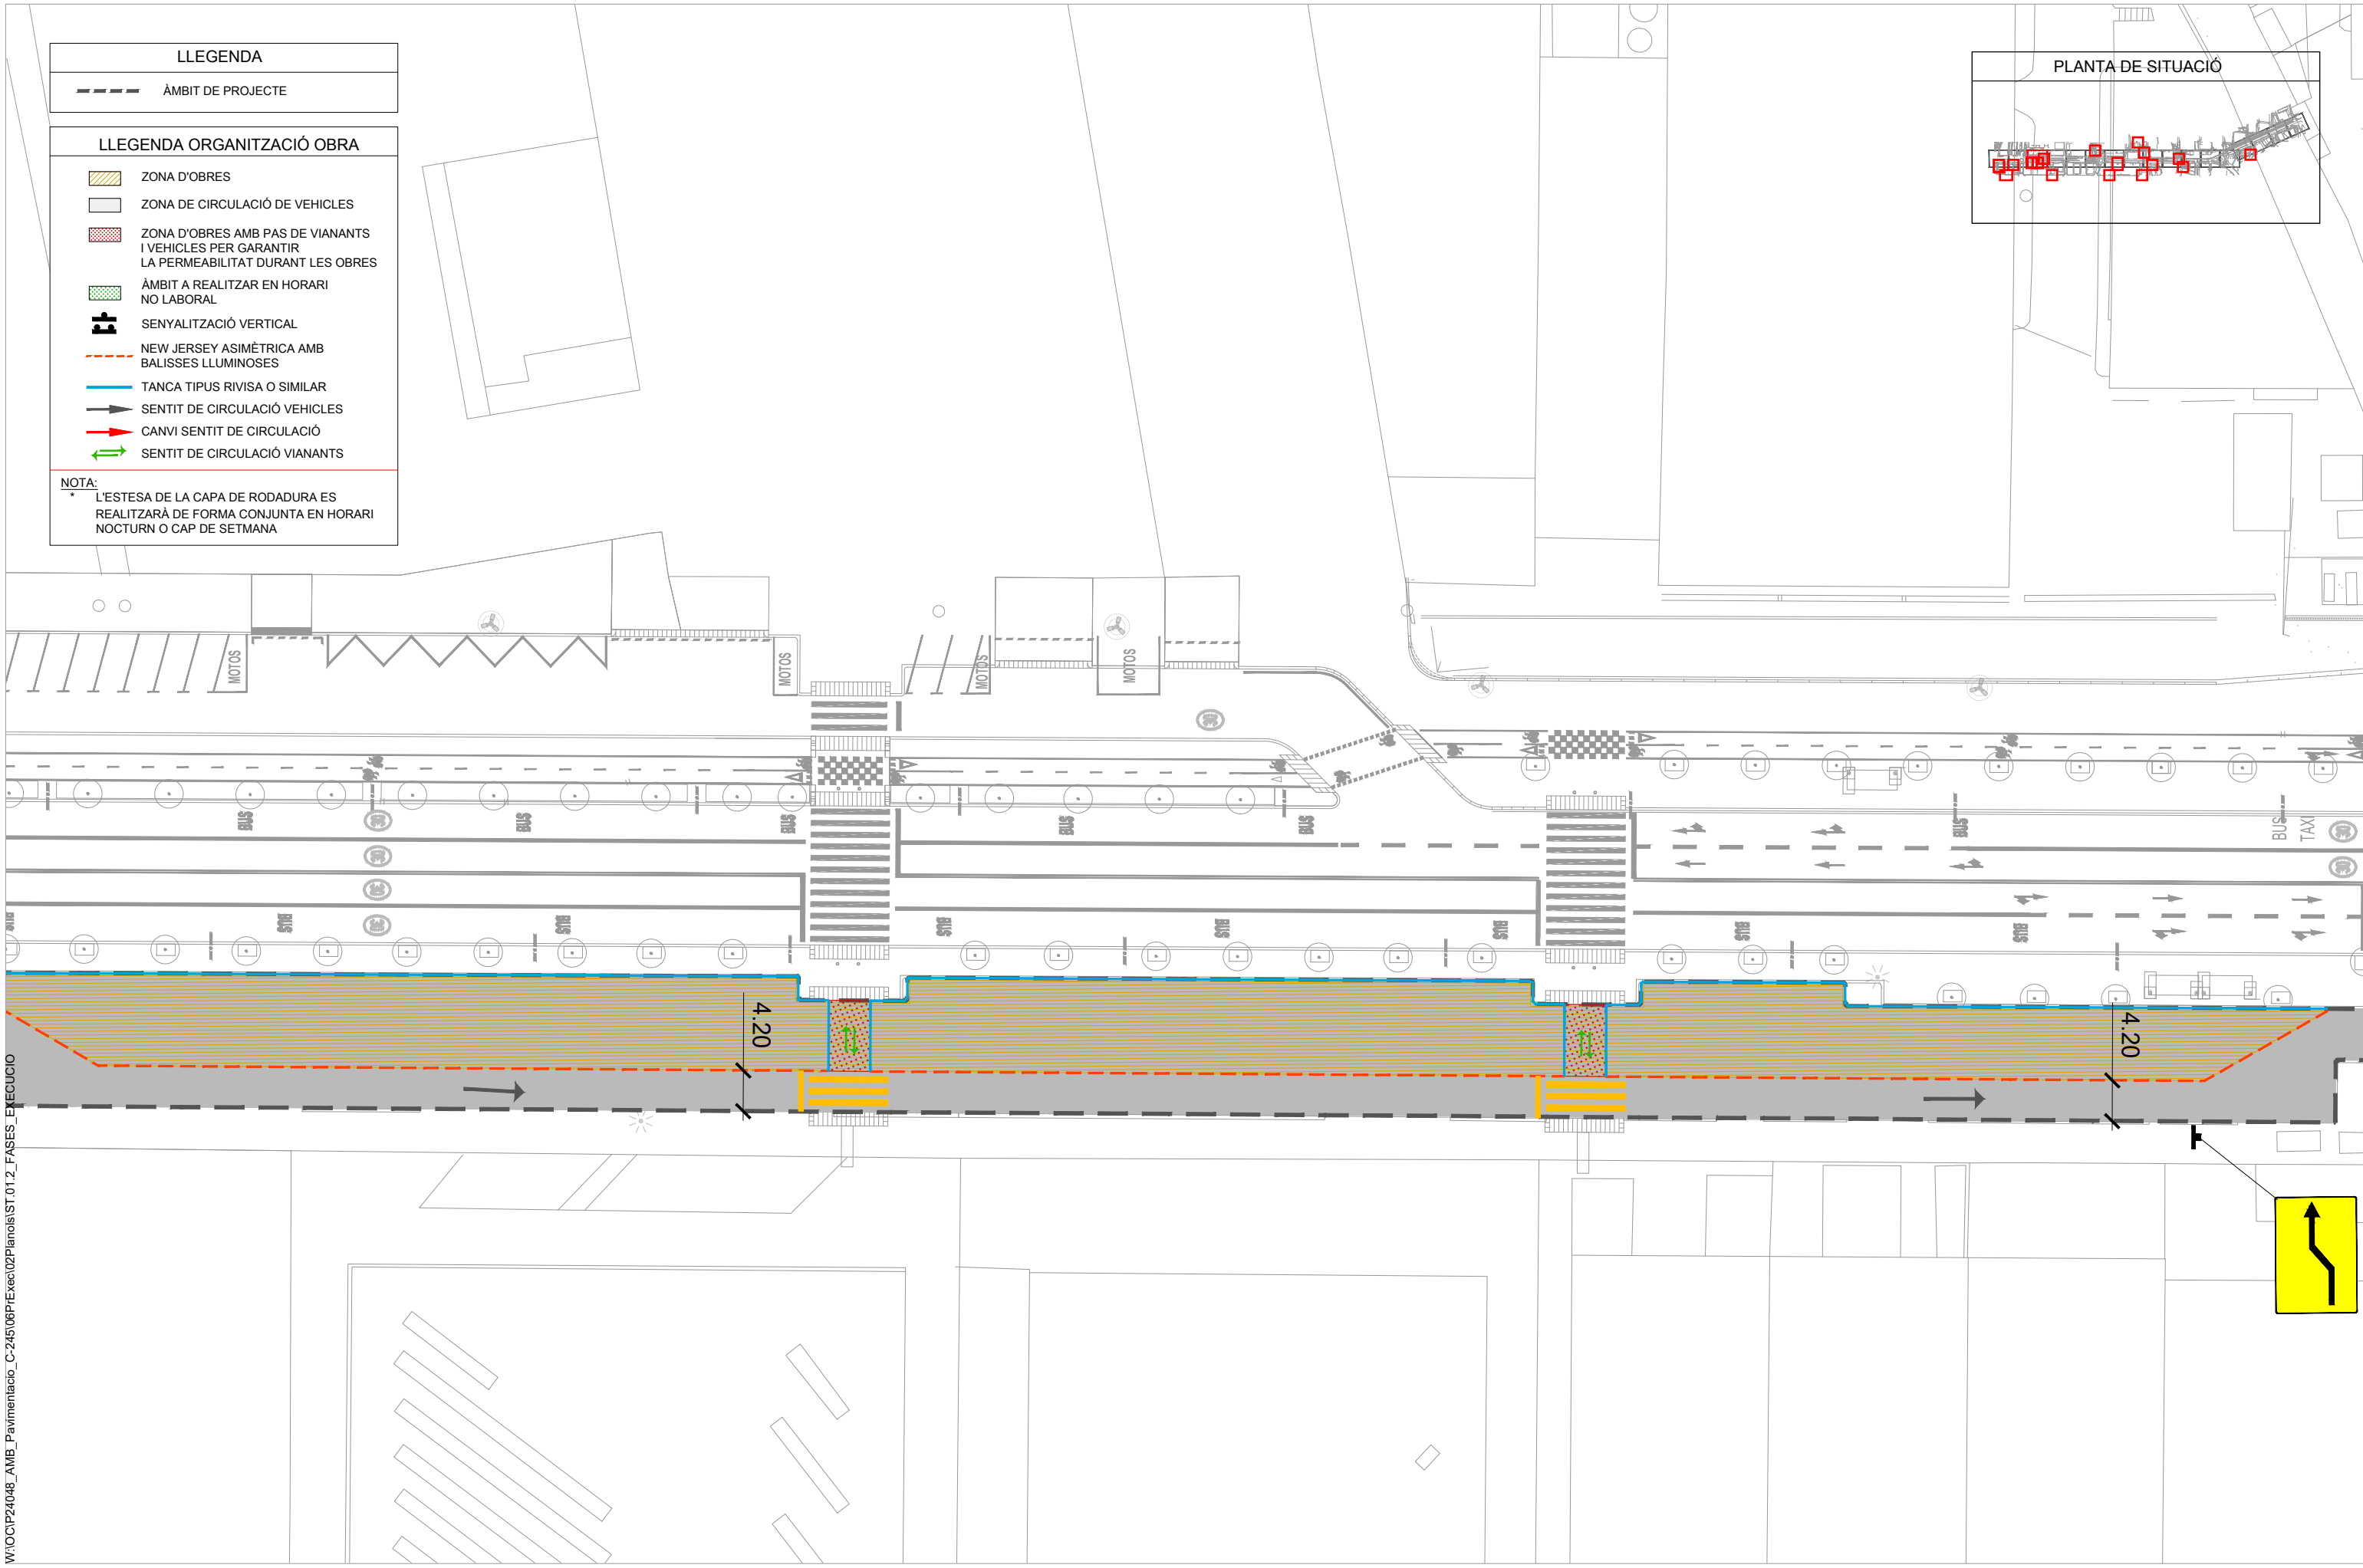

W:\OC\IP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PlExec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

ST FASES EXECUCIÓ I
 SENYALITZACIÓ



ST.02.04











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

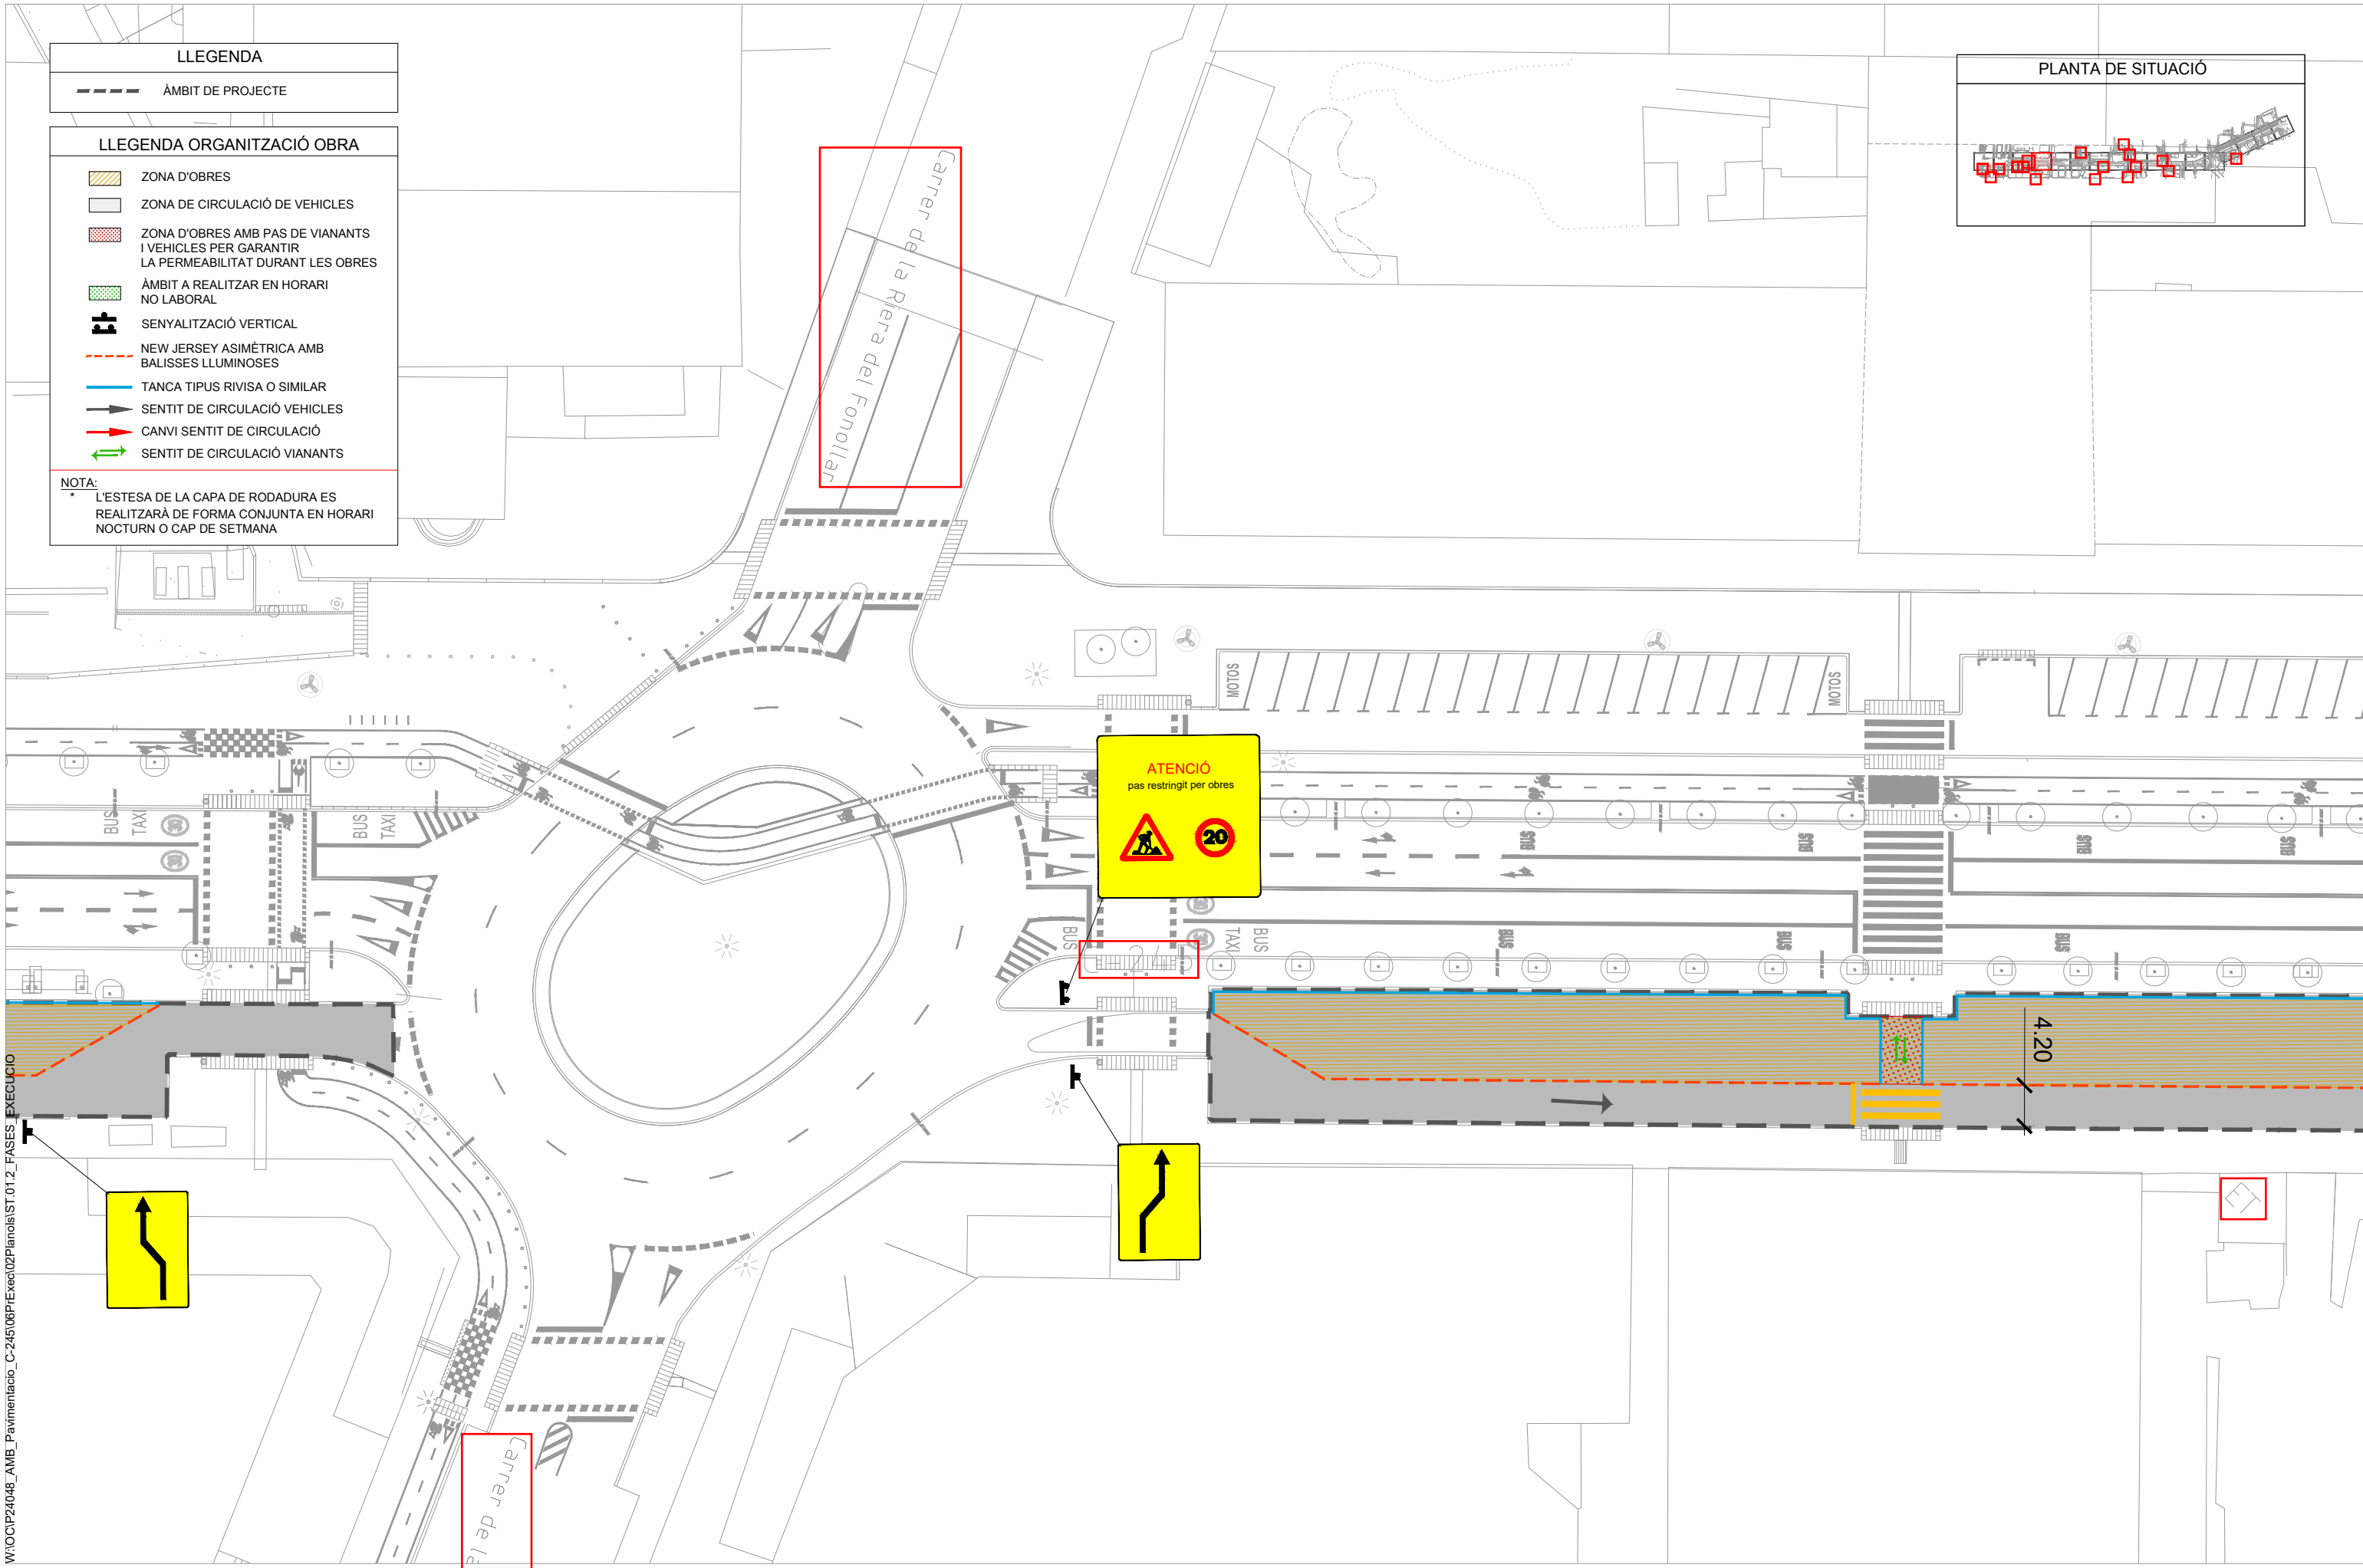

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PrExec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIÓ



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
BANDA MAR DE LA C-245
SANT BOI DE LLOBREGAT

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ

JULIOL 2025 FASE 2




ST.02.05
V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA	
	ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA	
	ZONA D'OBRES
	ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
	ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
	ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
	SENYALITZACIÓ VERTICAL
	NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSSES
	TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
	SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
	CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
	SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS
NOTA: L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA	

Ptge. de Gàller




Carreter d'Àlaba

Carretera de Santa Creu de Calafell

Carreter d'Àlaba

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PtExec\02Plans\ST.01.02_FASES_EXECUCIO

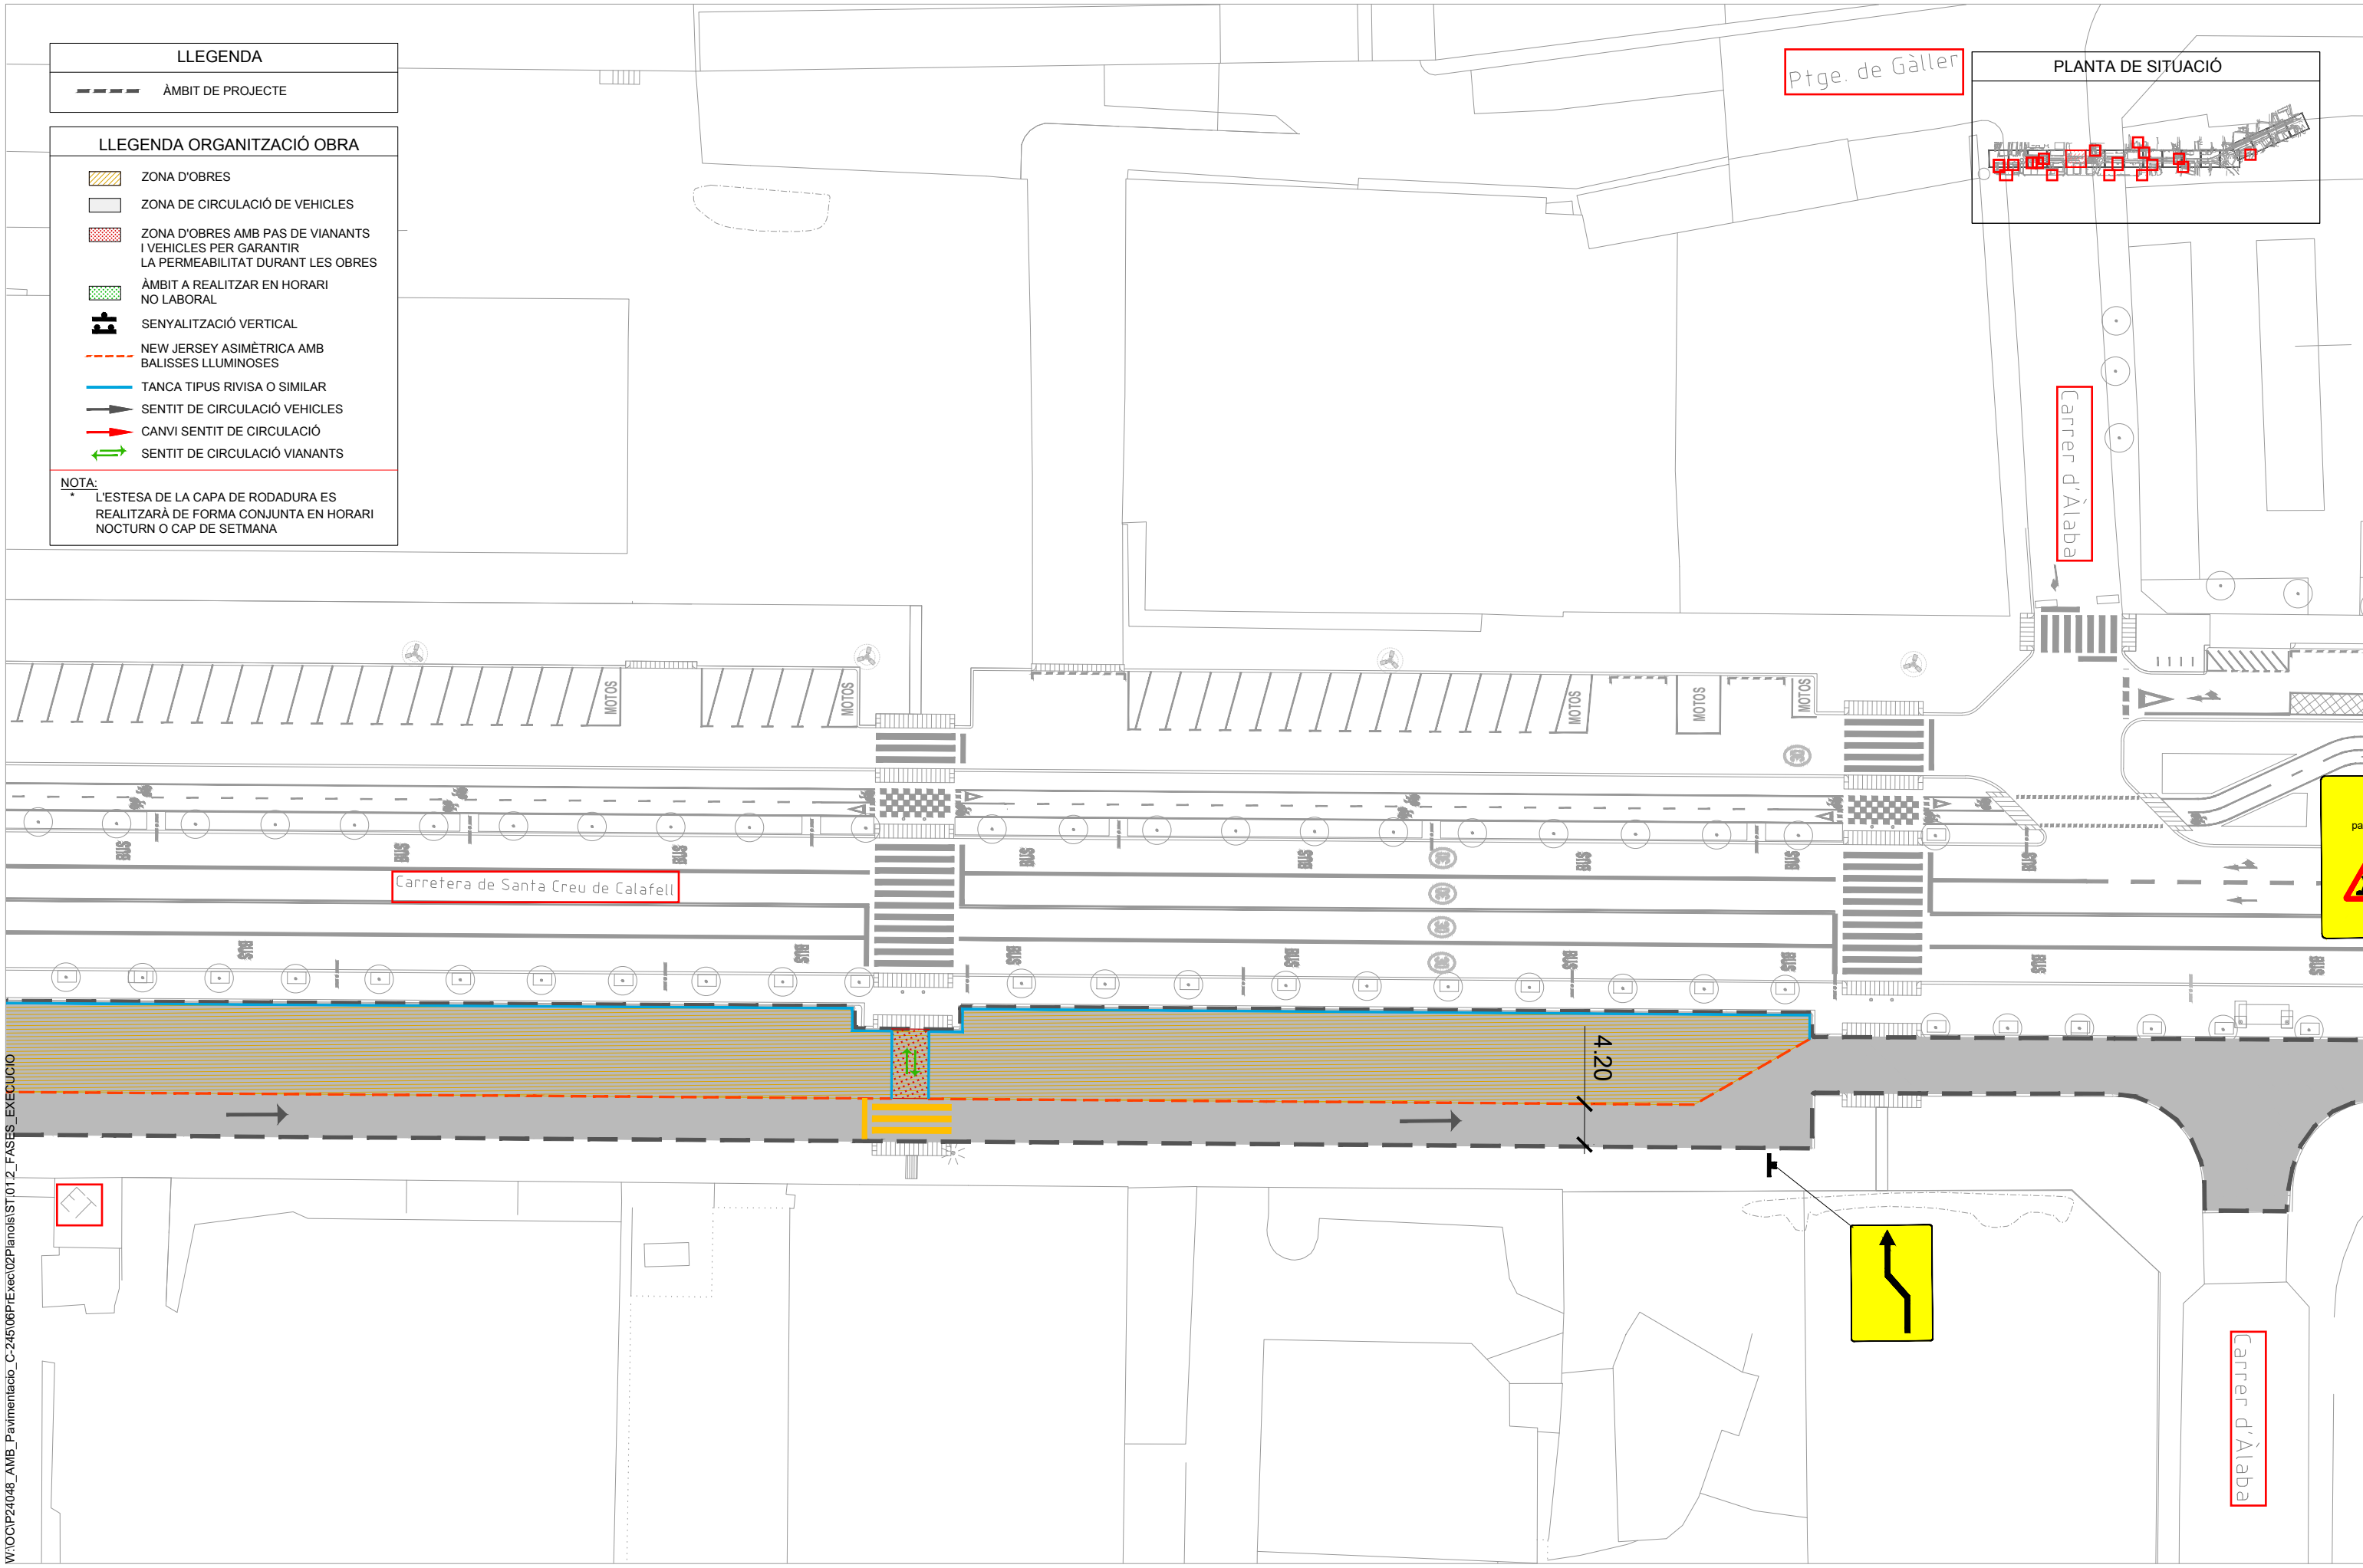

SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
BANDA MAR DE LA C-245
SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ

FASE 2



ST.02.06

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA


--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA: L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ



Passatge del Solsonès

Plaça de les Garrigues


Plaça del Vallespir

Plaça Ripollès

Plaça d'Osona

Passatge del Solsonès

ATENCIÓ
pas restringit per obres



Carrer d'Àlaba

4.20

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PIExec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2


ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.02.07

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

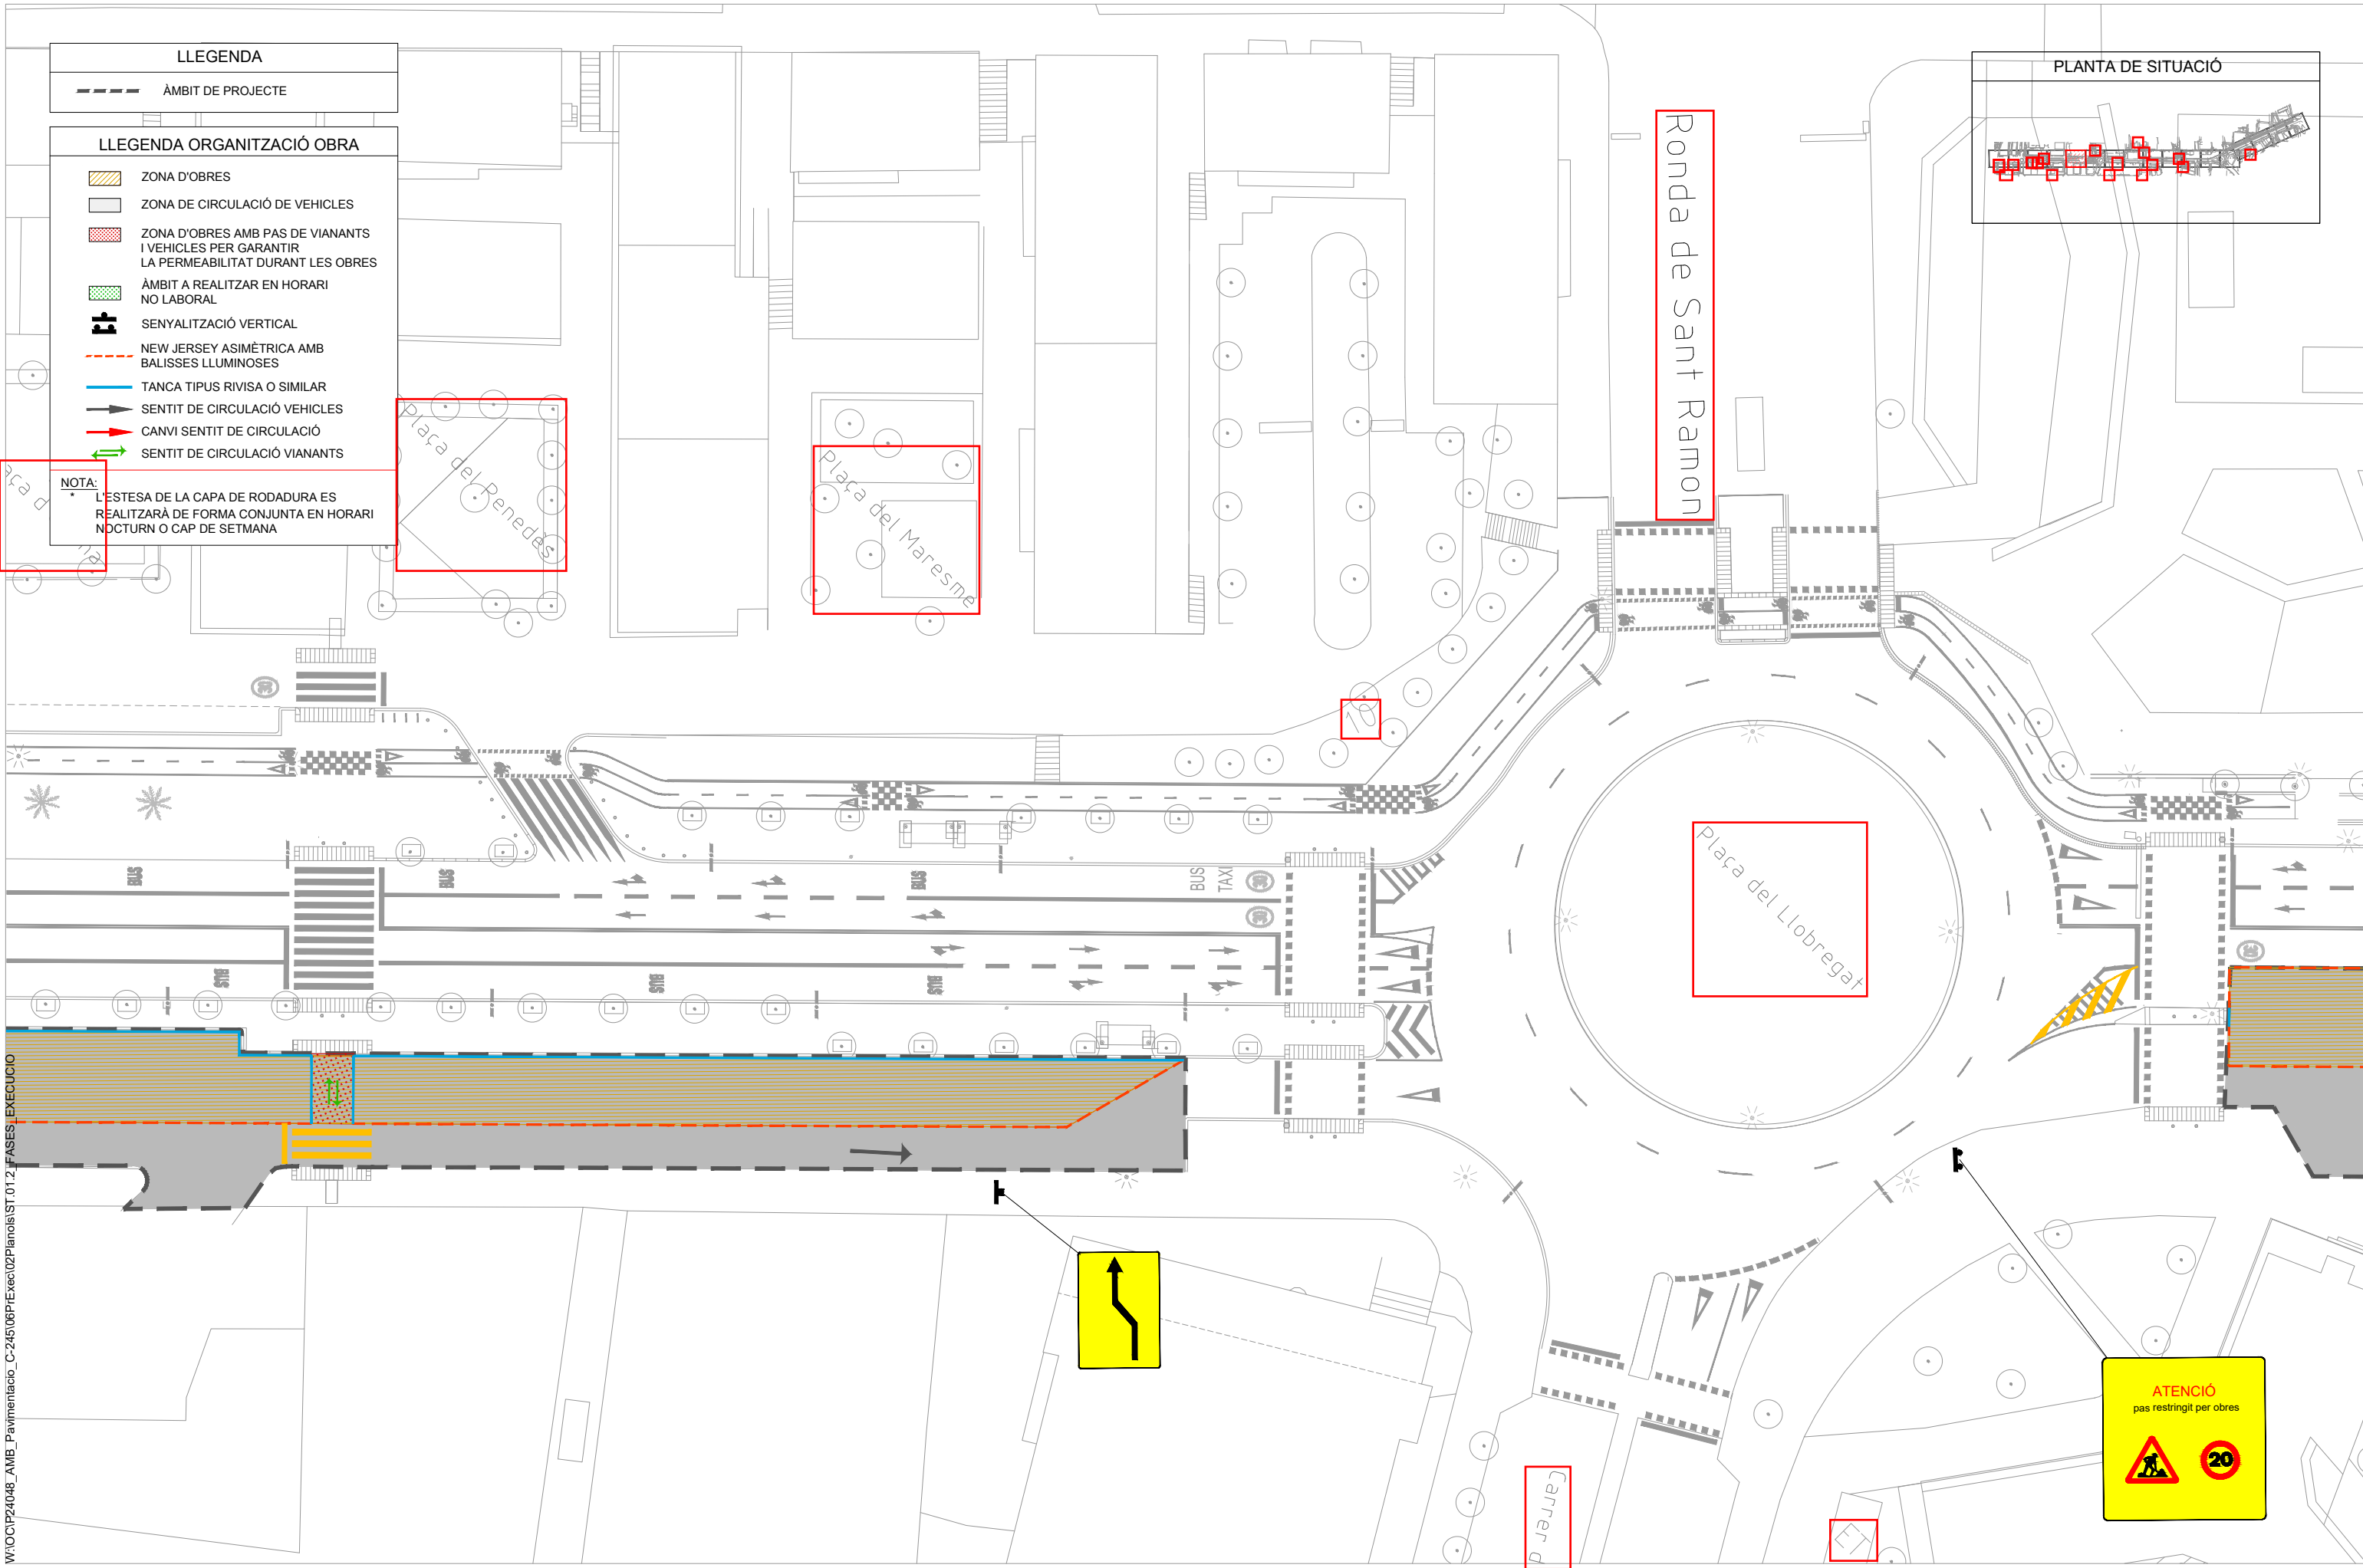


LLEGENDA
 - - - - - ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
 L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA



W:\OCIP\24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PlExec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2


ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.02.08

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500



LLEGGENDA



--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA: L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

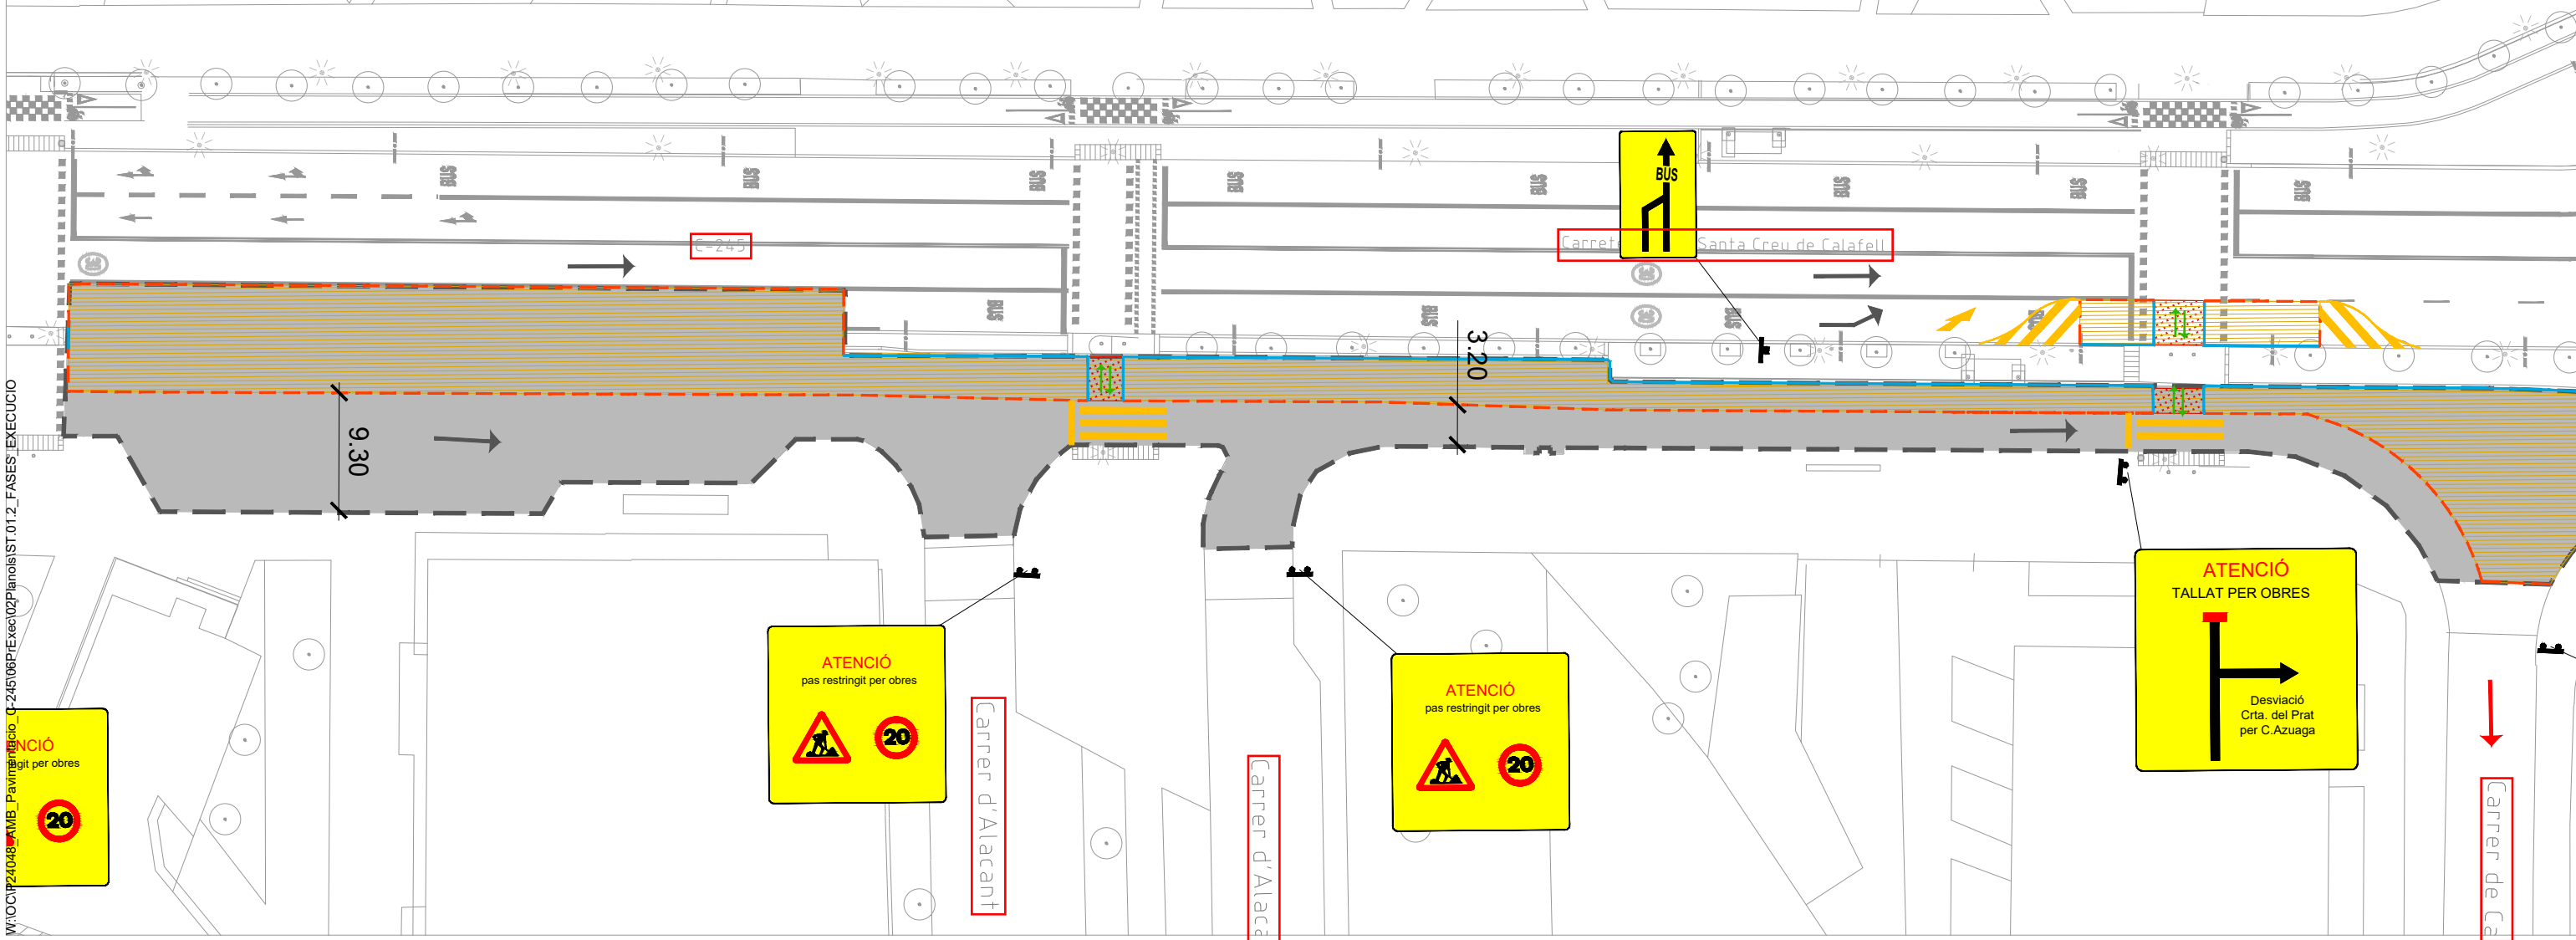

W:\OC\IP24048\MB_Paving\Biboc_C-245\06P1Exec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIÓ



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.02.09

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500



LLEGENDA

--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

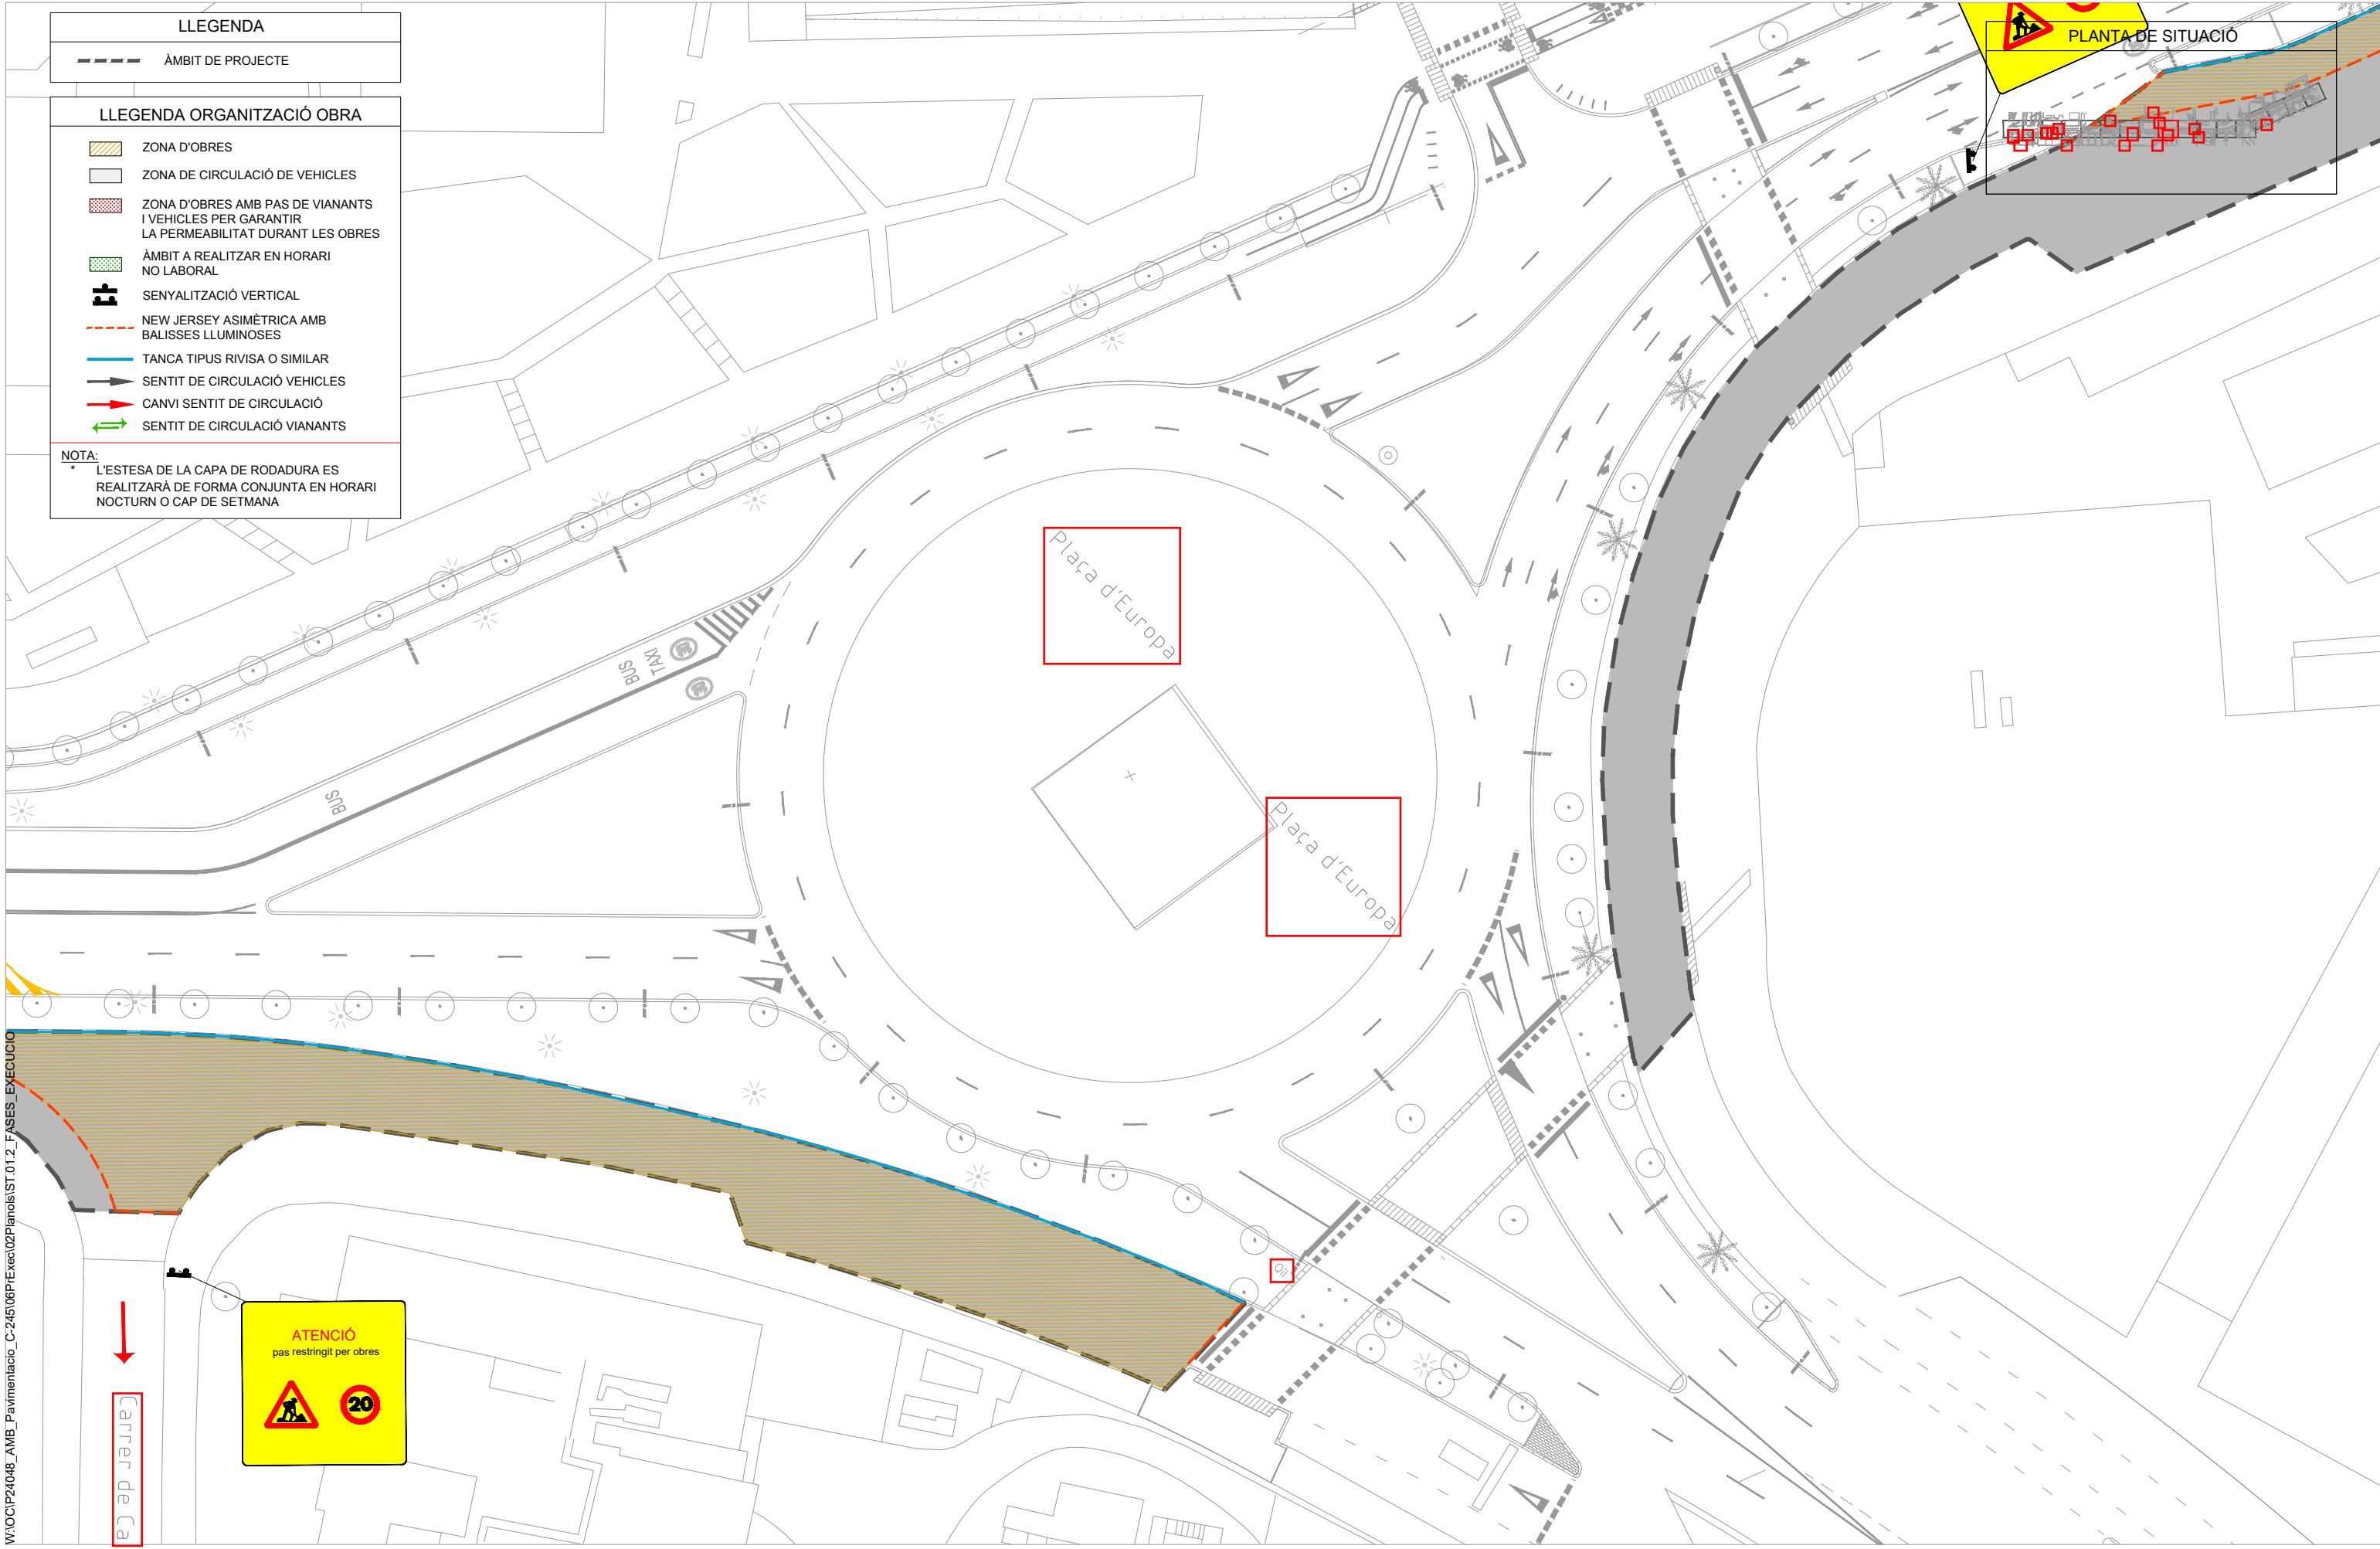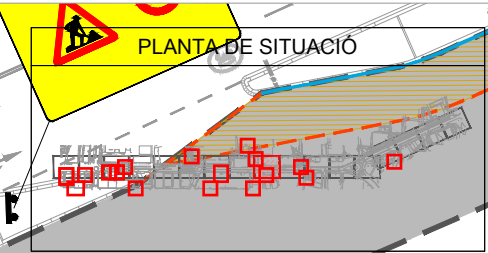

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PlExec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
BANDA MAR DE LA C-245
SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ













ST.02.10
V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA


--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ



8070

-24.5



W:\OC\IP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PlExec\02Plans\IST.01.2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2


ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.02.11

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

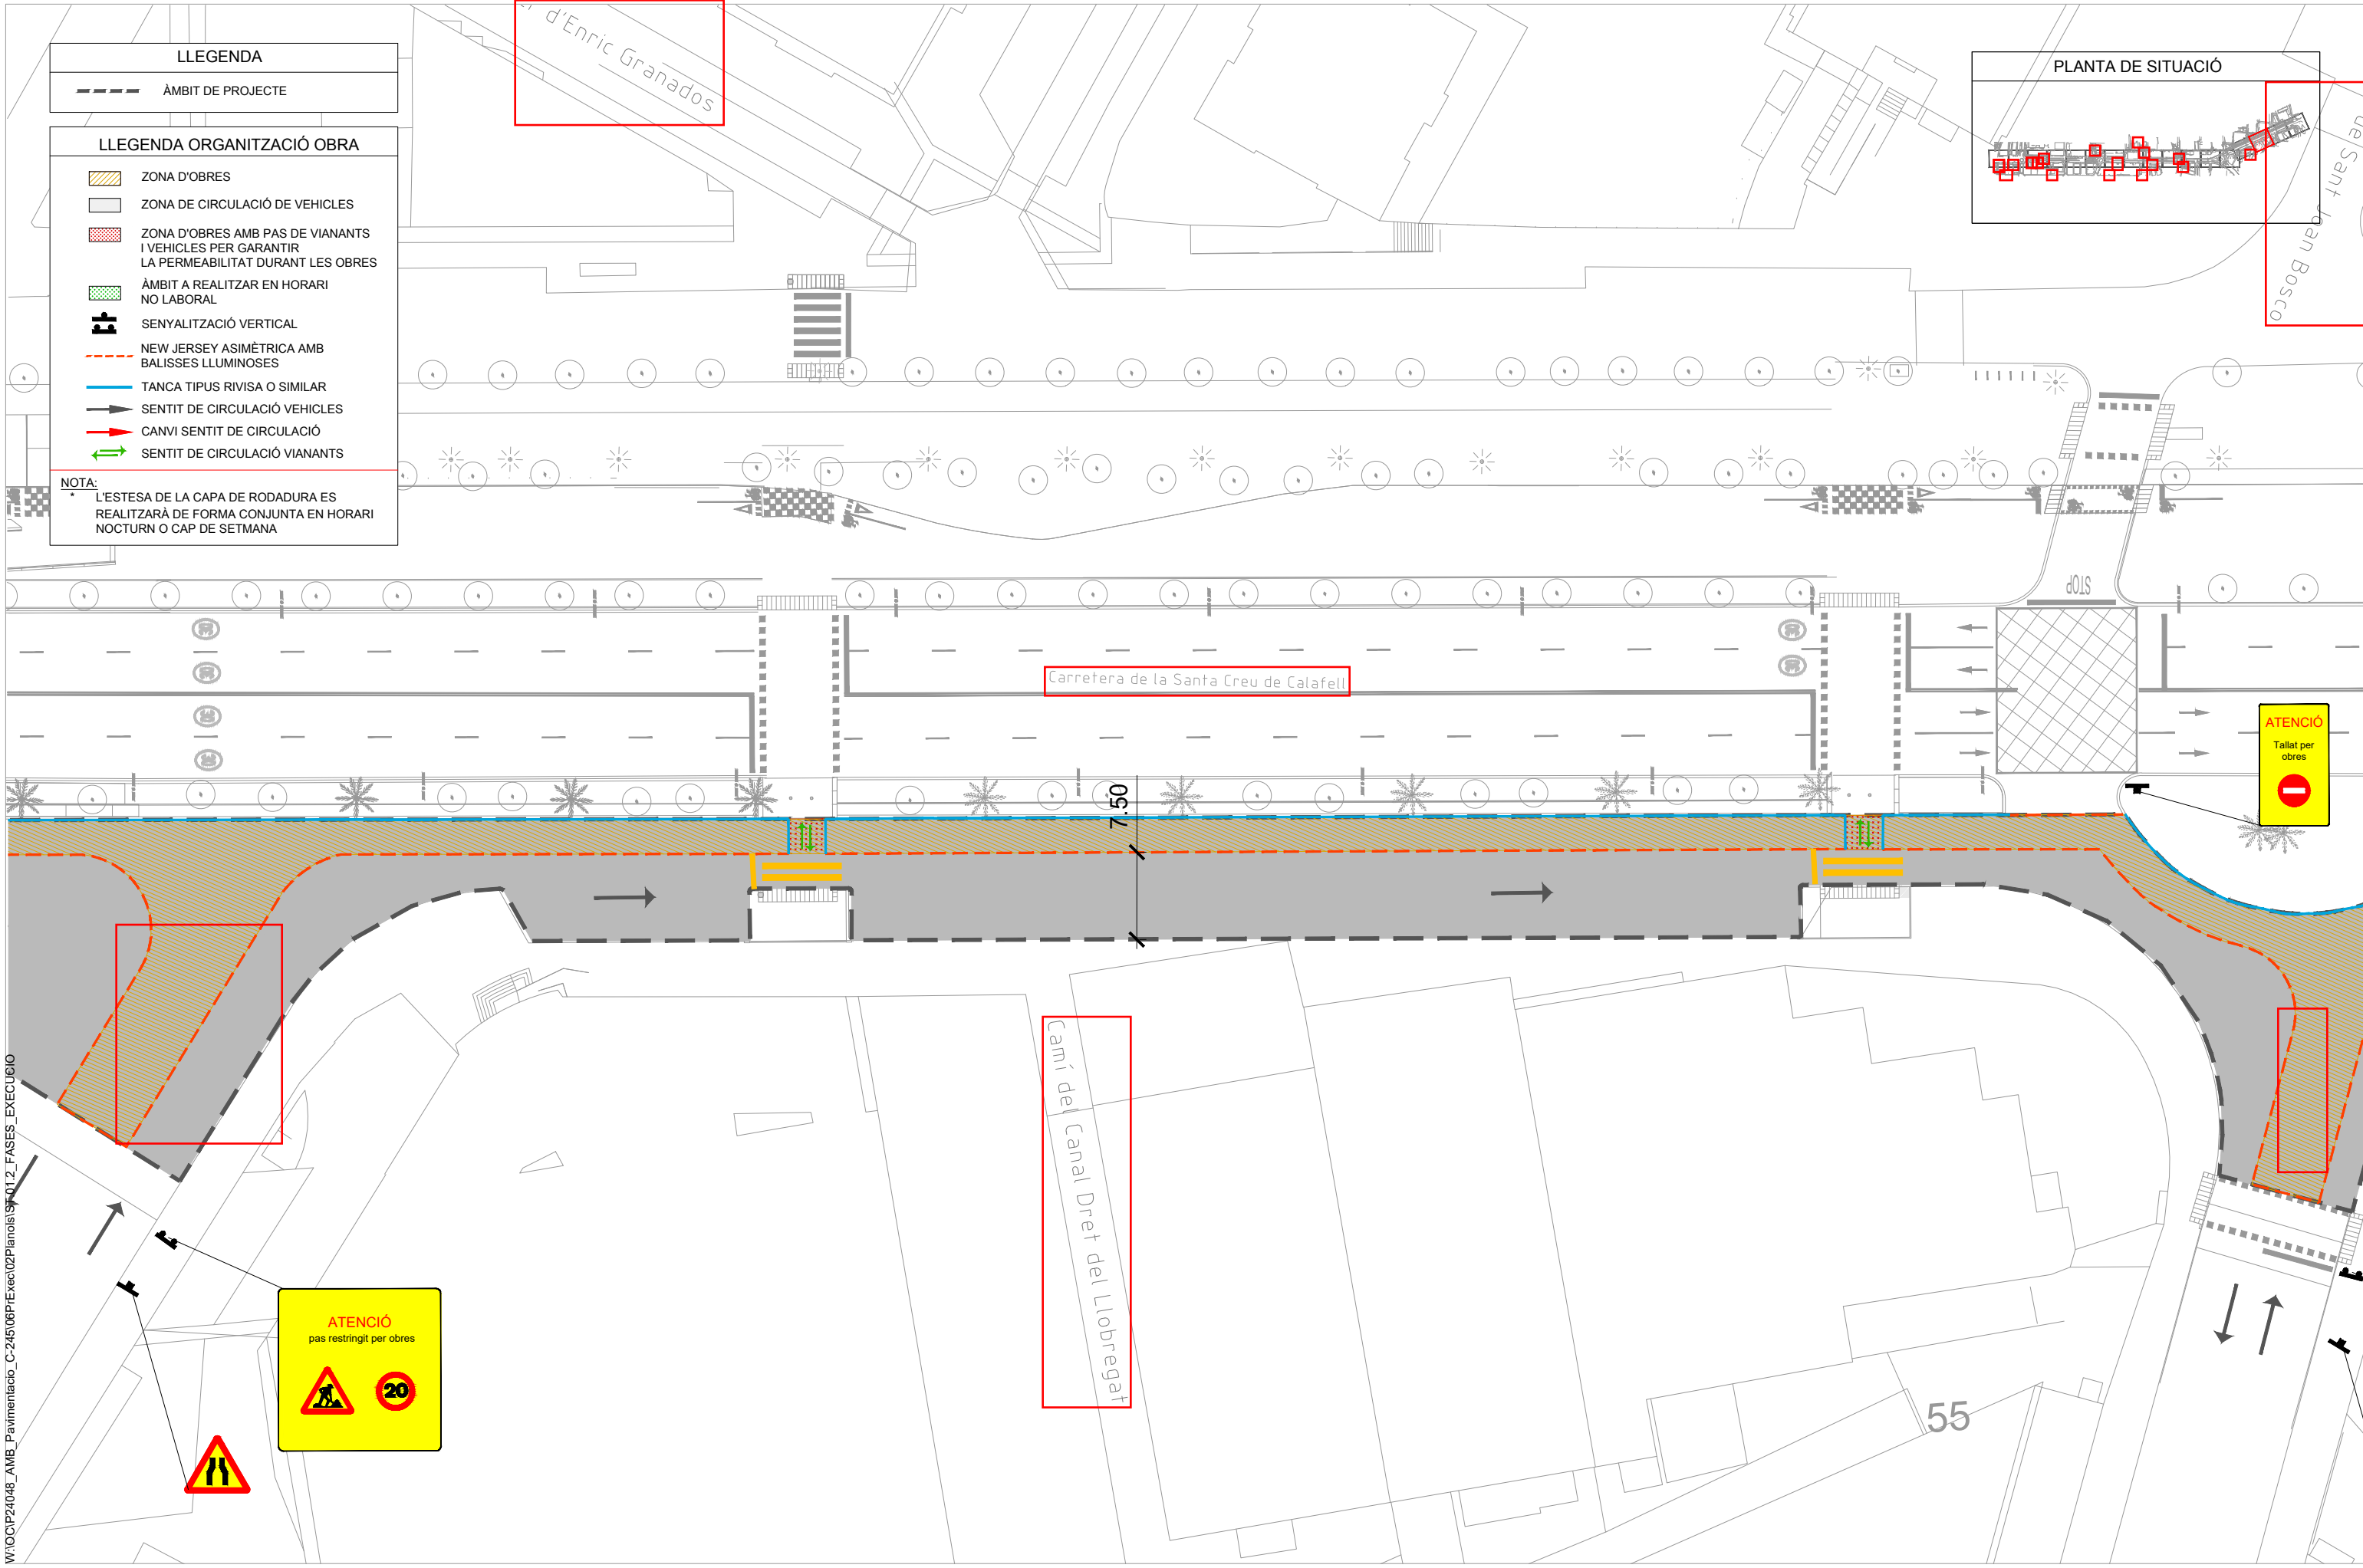


LLEGENDA

--- ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

- ZONA D'OBRES
- ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
- ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
- ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
- SENYALITZACIÓ VERTICAL
- NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
- TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
- CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
- SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

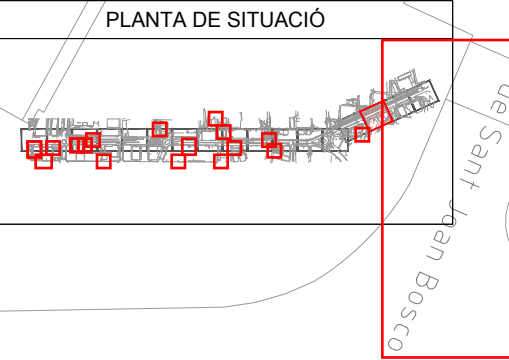

W:\OCIP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\06PrExec\02Planois\SP\01.2_FASES_EXECUCIO

ATENCIÓ
pas restringit per obres

ATENCIÓ
Tallat per obres



SAMS

Autoria

Equip

Expedient
904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL
BANDA MAR DE LA C-245
SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

**ST FASES EXECUCIÓ I
SENYALITZACIÓ**



ST.02.12











V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500

LLEGENDA



ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA ORGANITZACIÓ OBRA

-  ZONA D'OBRES
-  ZONA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
-  ZONA D'OBRES AMB PAS DE VIANANTS I VEHICLES PER GARANTIR LA PERMEABILITAT DURANT LES OBRES
-  ÀMBIT A REALITZAR EN HORARI NO LABORAL
-  SENYALITZACIÓ VERTICAL
-  NEW JERSEY ASIMÈTRICA AMB BALISSES LLUMINOSES
-  TANCA TIPUS RIVISA O SIMILAR
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VEHICLES
-  CANVI SENTIT DE CIRCULACIÓ
-  SENTIT DE CIRCULACIÓ VIANANTS

NOTA:
L'ESTESA DE LA CAPA DE RODADURA ES REALITZARÀ DE FORMA CONJUNTA EN HORARI NOCTURN O CAP DE SETMANA

PLANTA DE SITUACIÓ

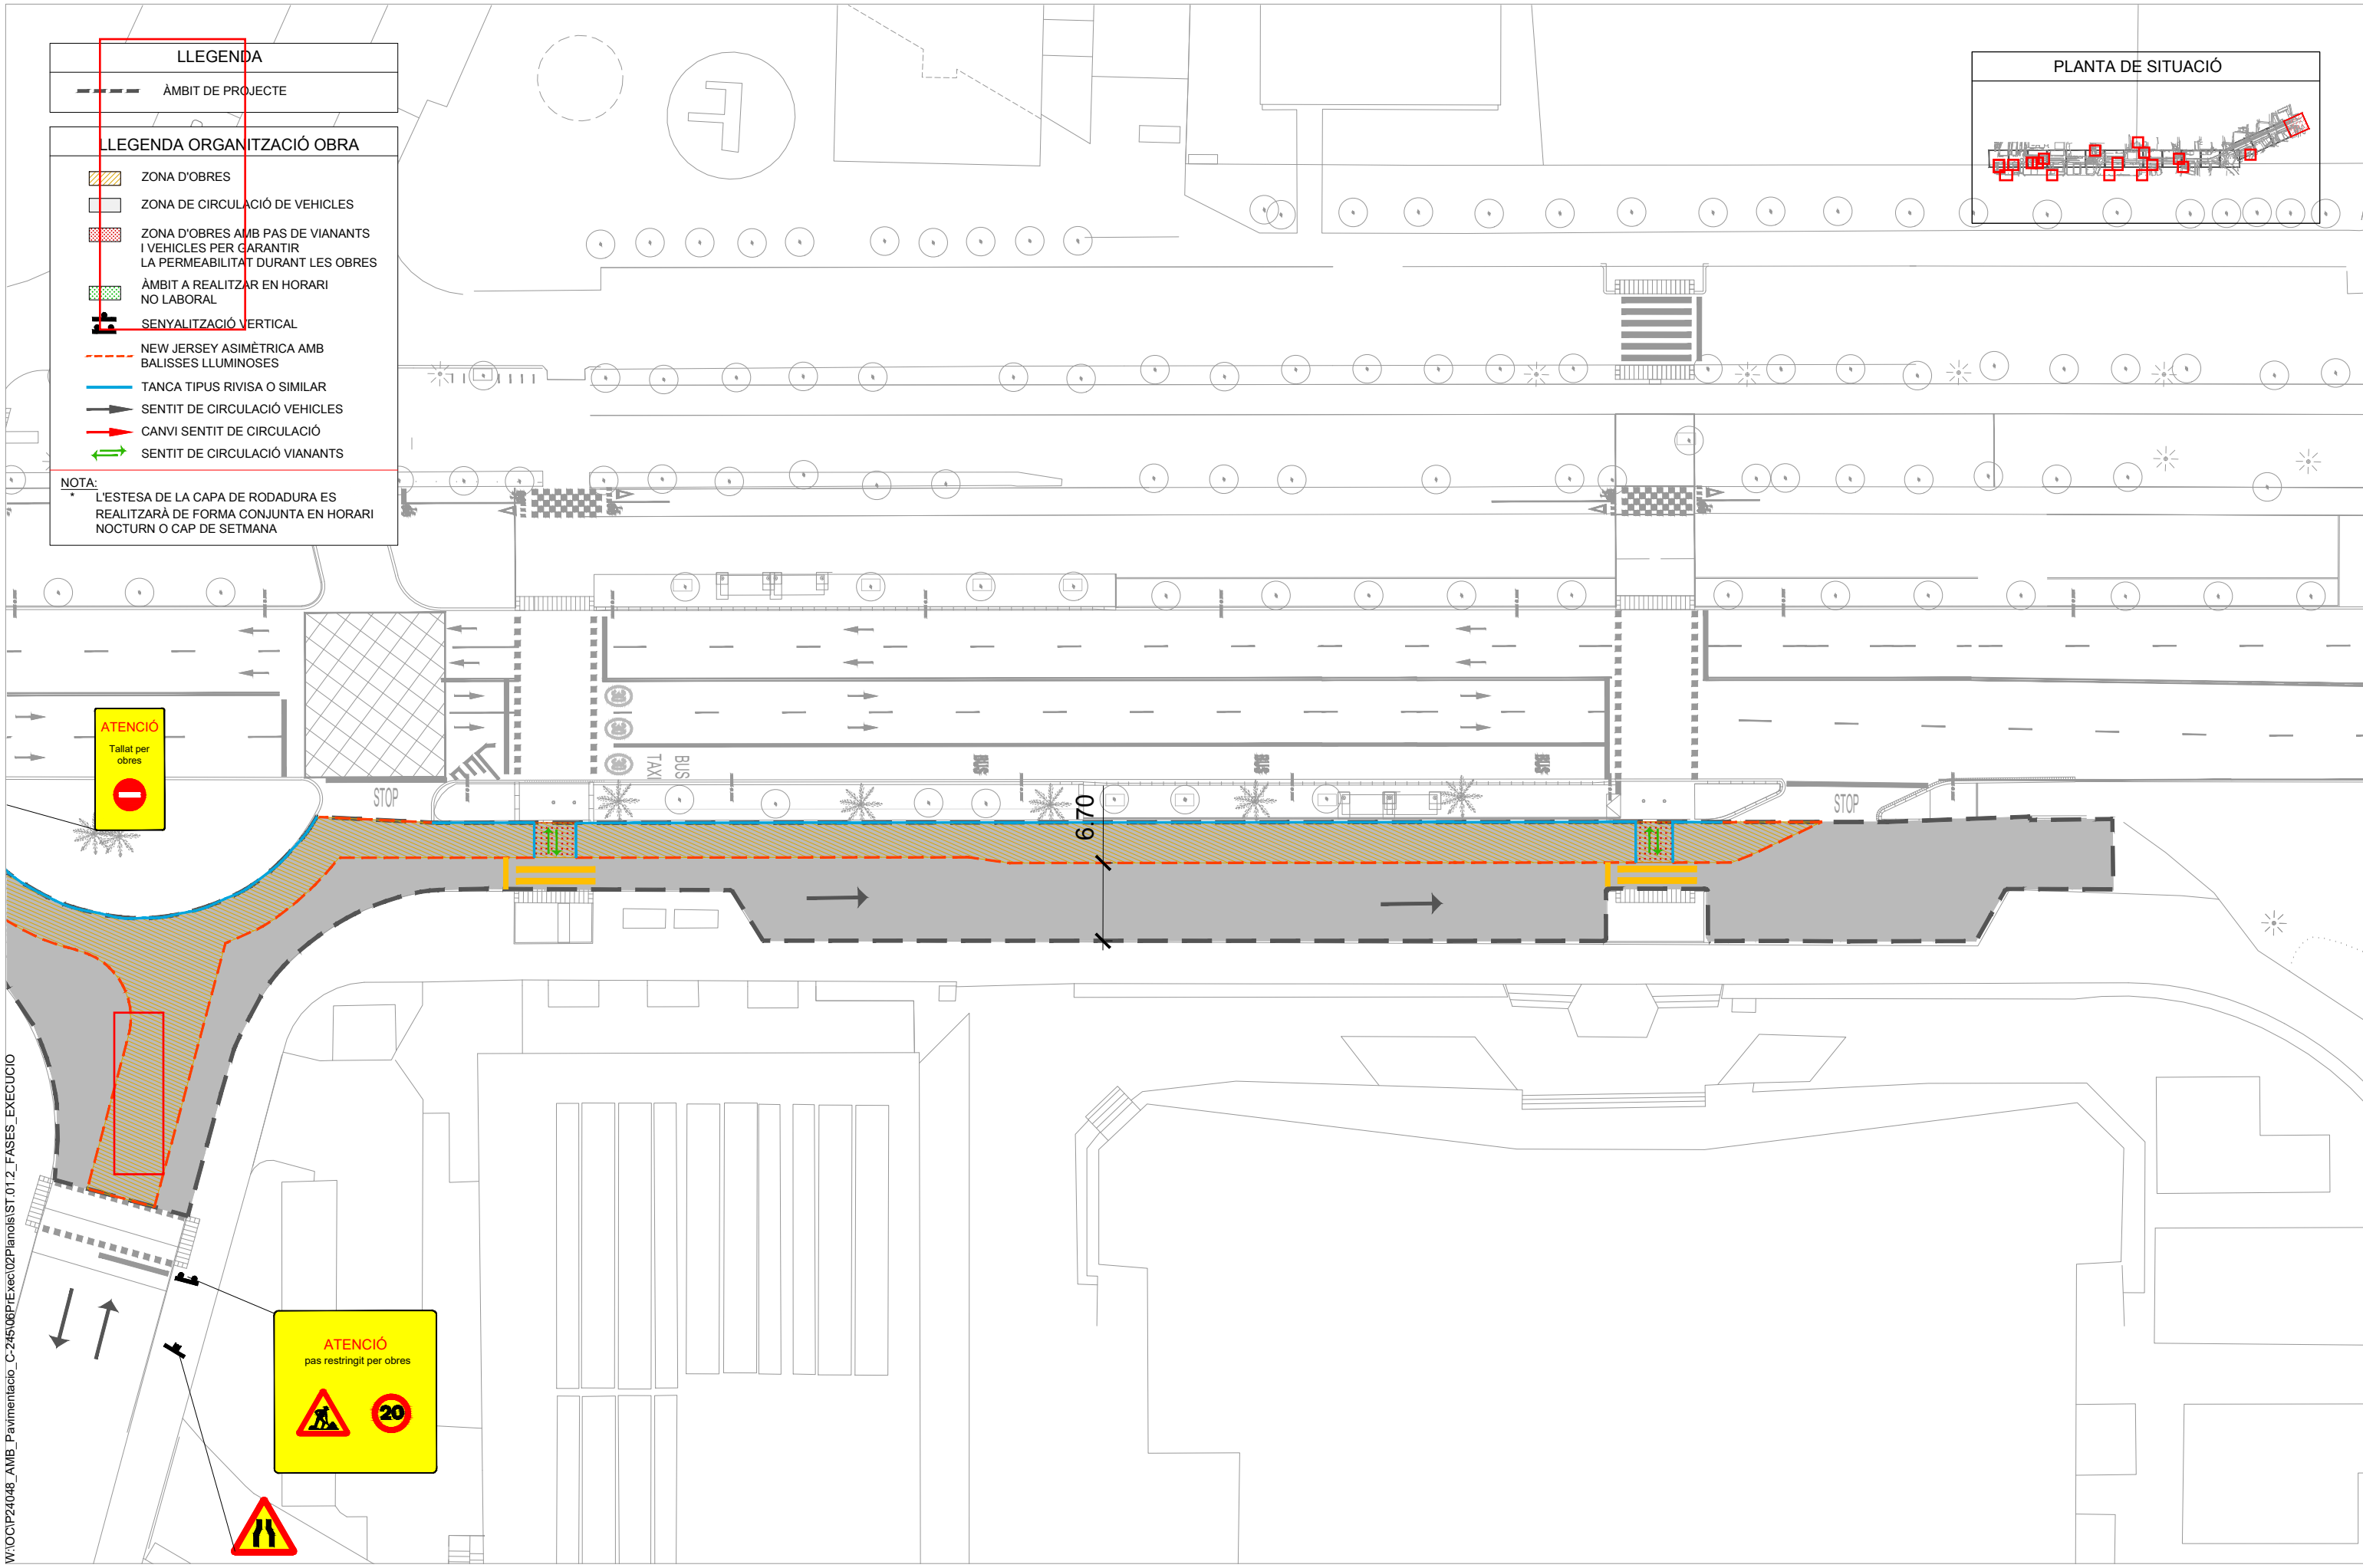

W:\OC\IP24048_AMB_Pavimentacio_C-245\08PIExec\02Planois\ST.01.2_FASES_EXECUCIO



SAMS

Autoria

Equip

Expedient 904523/24

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DEL LATERAL BANDA MAR DE LA C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT

JULIOL 2025

FASE 2

ST FASES EXECUCIÓ I SENYALITZACIÓ



ST.02.13

V.00 DD/MM/AAAA

A3 E: 1/500
