IREC - INSITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA

LABORATORI NANOIÓNICA - fase 1

reforma parcial interior

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**REFORMA PARCIAL INTERIOR**	**62 días**
2		**Obra Civil**	**61 días**
3		acta replanteig - inici	0 días
4		treballs enderrocs	6 días
5		distribució pladur	8 días
6		paviment de resines lab i revisió paviment office	2 días
7		distribució mampara vidre	5 días
8		pintura envans i acabats	4 días
9		instal.lació portes metàl.liques	1 día
10		**DATA FINALITZACIÓ PREPARACIÓ SALA LAB PRINCIPAL (entrada equip propietat)**	0 días
11		treballs de coordinació entrada nou equip propietat	5 días
12		cel ras office i ajust hall entrada	6 días
13		treballs a coberta	8 días
14		remats a coberta	4 días
15		**Instal.lacions generals**	**56 días**
16		instal.lacions generals - treballs distribució (elec/clima/font) previ a arribada equip central	20 días
17		instal.lacions generals - acabats lab	10 días
18		treballs ajustos sobre mobles	5 días
19		instal.lacions generals - acabats office	5 días
20		treballs en coberta	5 sem.
21		postes en marxa, validacions i treballs finals	5 días
22		**Mobiliari**	**57 días**
23		vitrina - fabricació i entrega	10 sem.
24		vitrina - subministre i muntatge	3 días
25		cabina - subministre i muntatge	2 días
26		proves i postes en marxa, ajudes i repasos	4 días
27		**Gasos tècnics i extraccions específiques**	**46 días**
28		extraccions específiques	12 días
29		instal.lació motors extracció	5 días
30		treballs tubbing gasos (sortida wc)	15 días
31		distrubició i punts de servei gasos tècnics	15 días
32		treballs connexions finals - posta en marxa	4 días
33		**CFO entrega final**	0 días

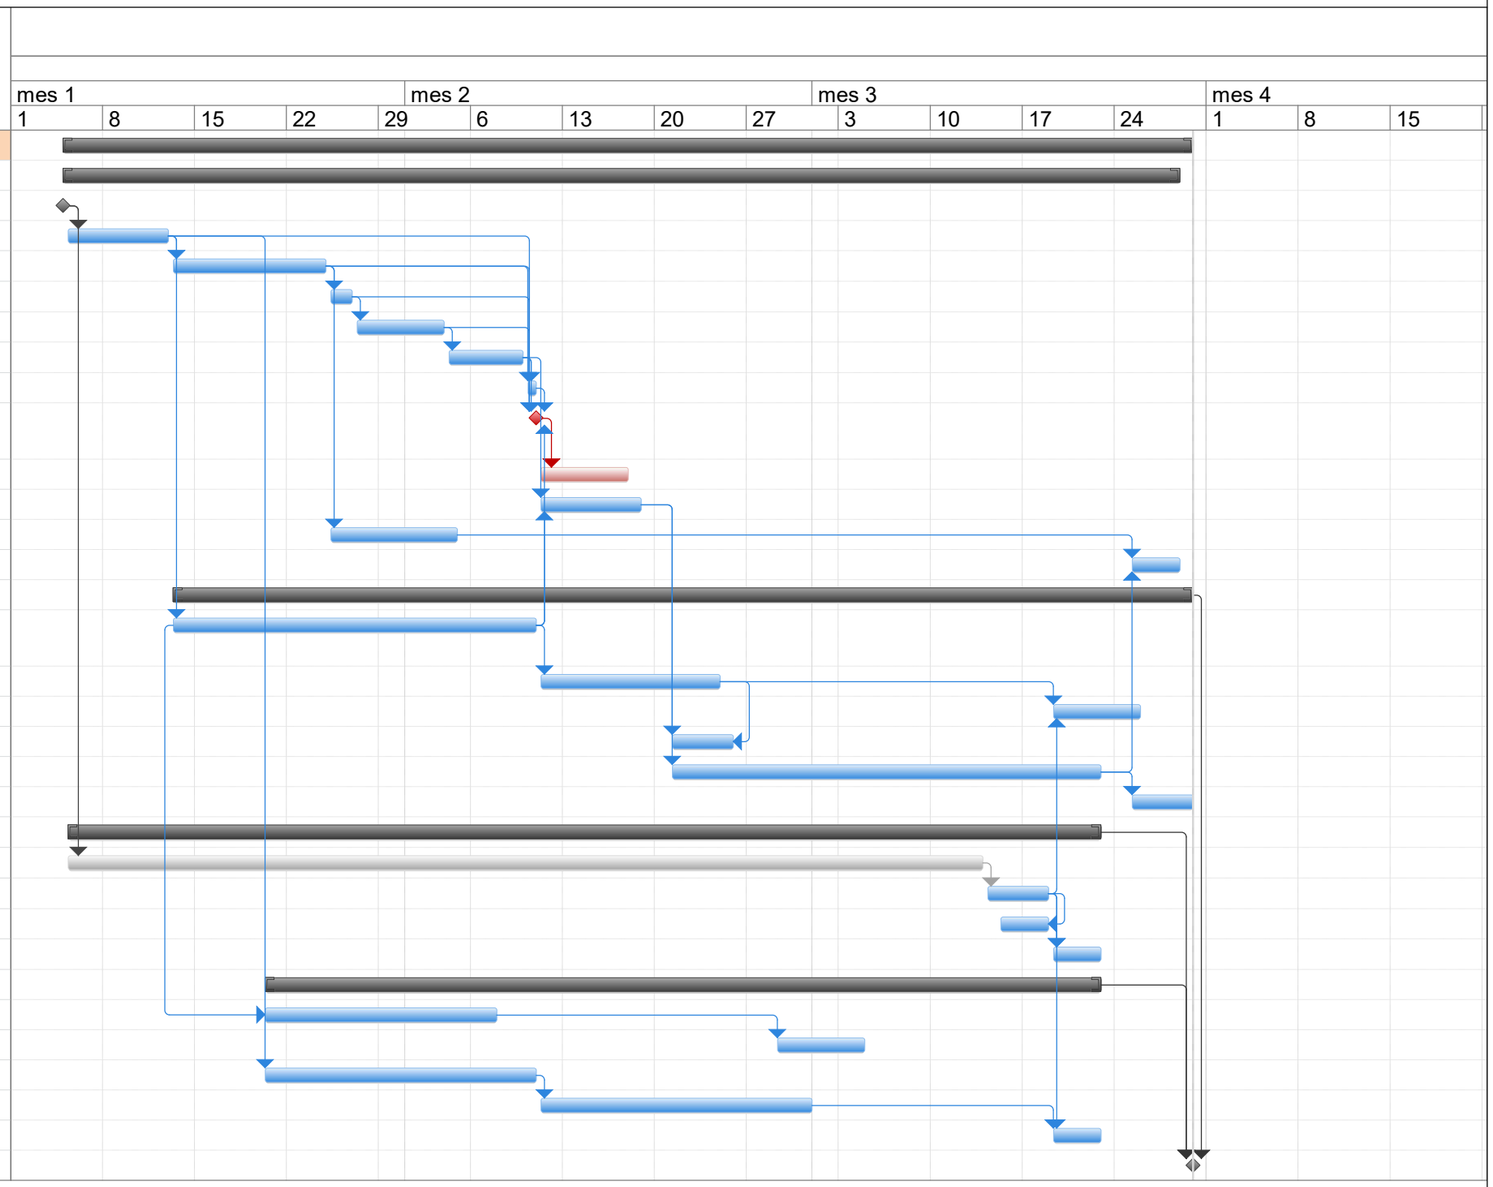

NEXXO Project Management
Planificació MASTER
mié 31/7/24

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso manual
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	
