


PROJECTE EXECUTIU

DE CONSTRUCCIÓ D'UN SETÈ BÚNQUER A L'HOSPITAL DURAN I REYNALS (ICO)

VII. PLANIFICACIÓ

DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT


26X036CP - BUNQUER 7 - HOSPITAL DURAN I REYNALS

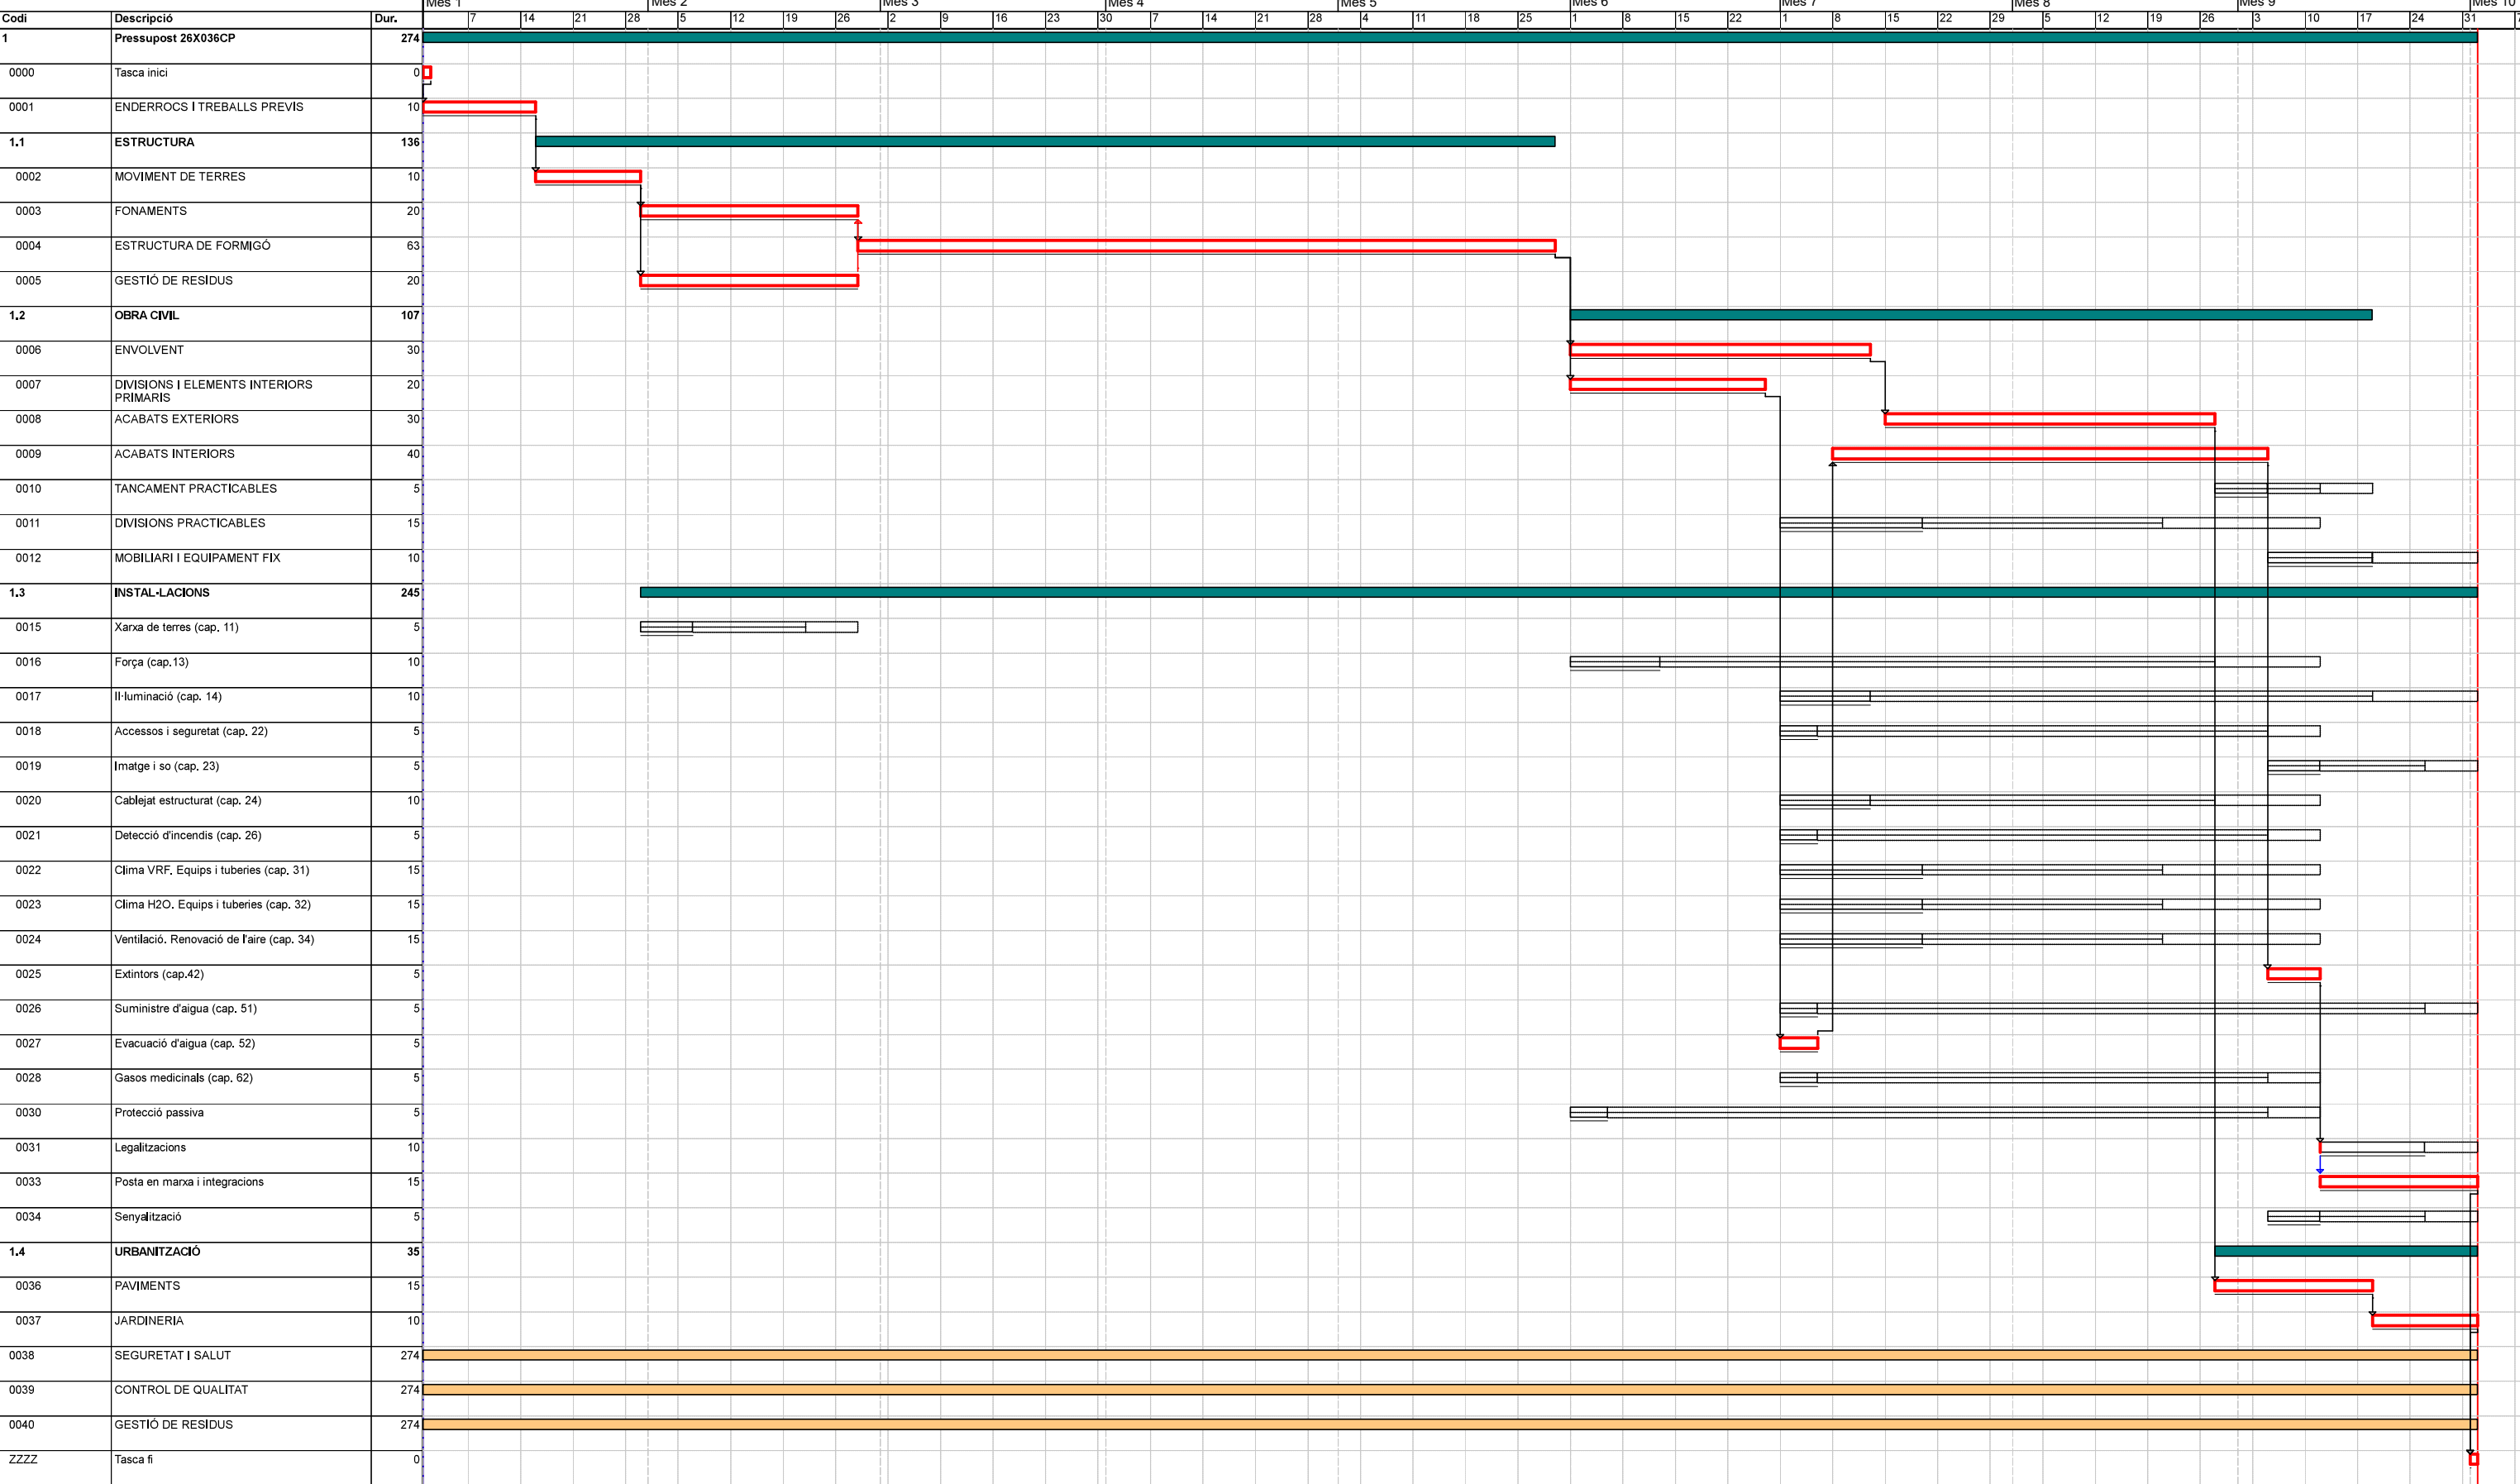

Pag:1


HISTOGRAMA DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS ACUMULAT


Data: 26/06/26

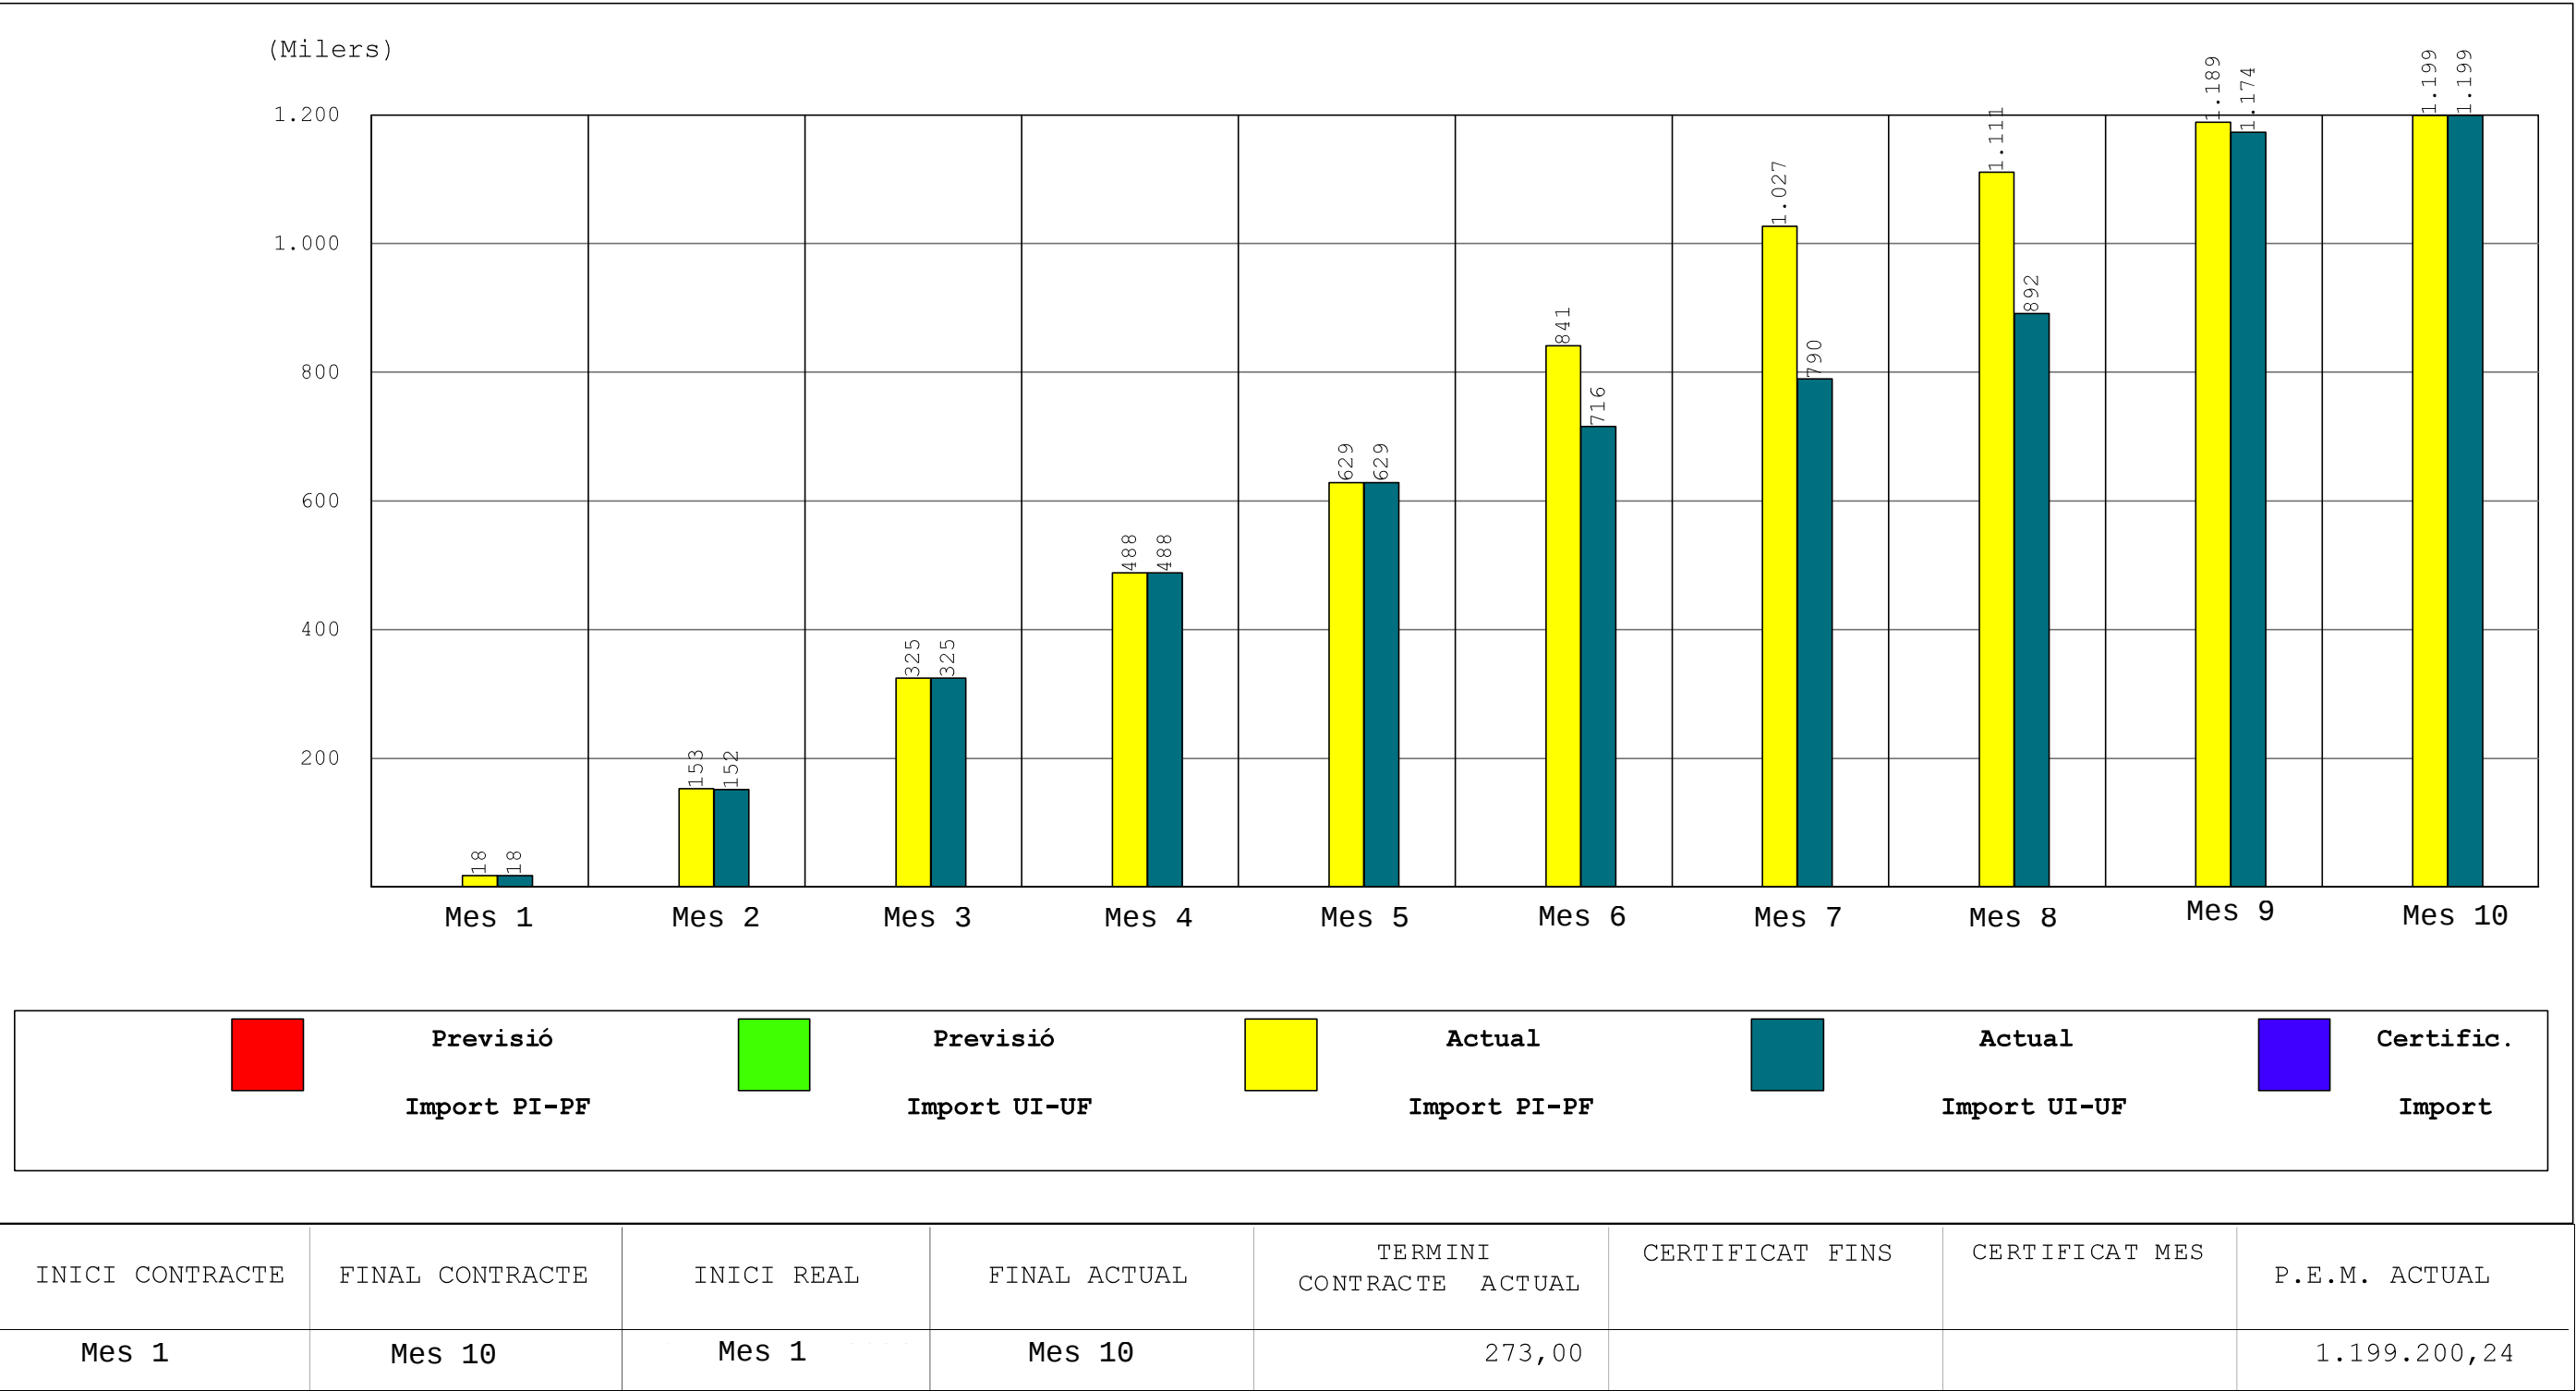

FUS DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data: 26/06/26

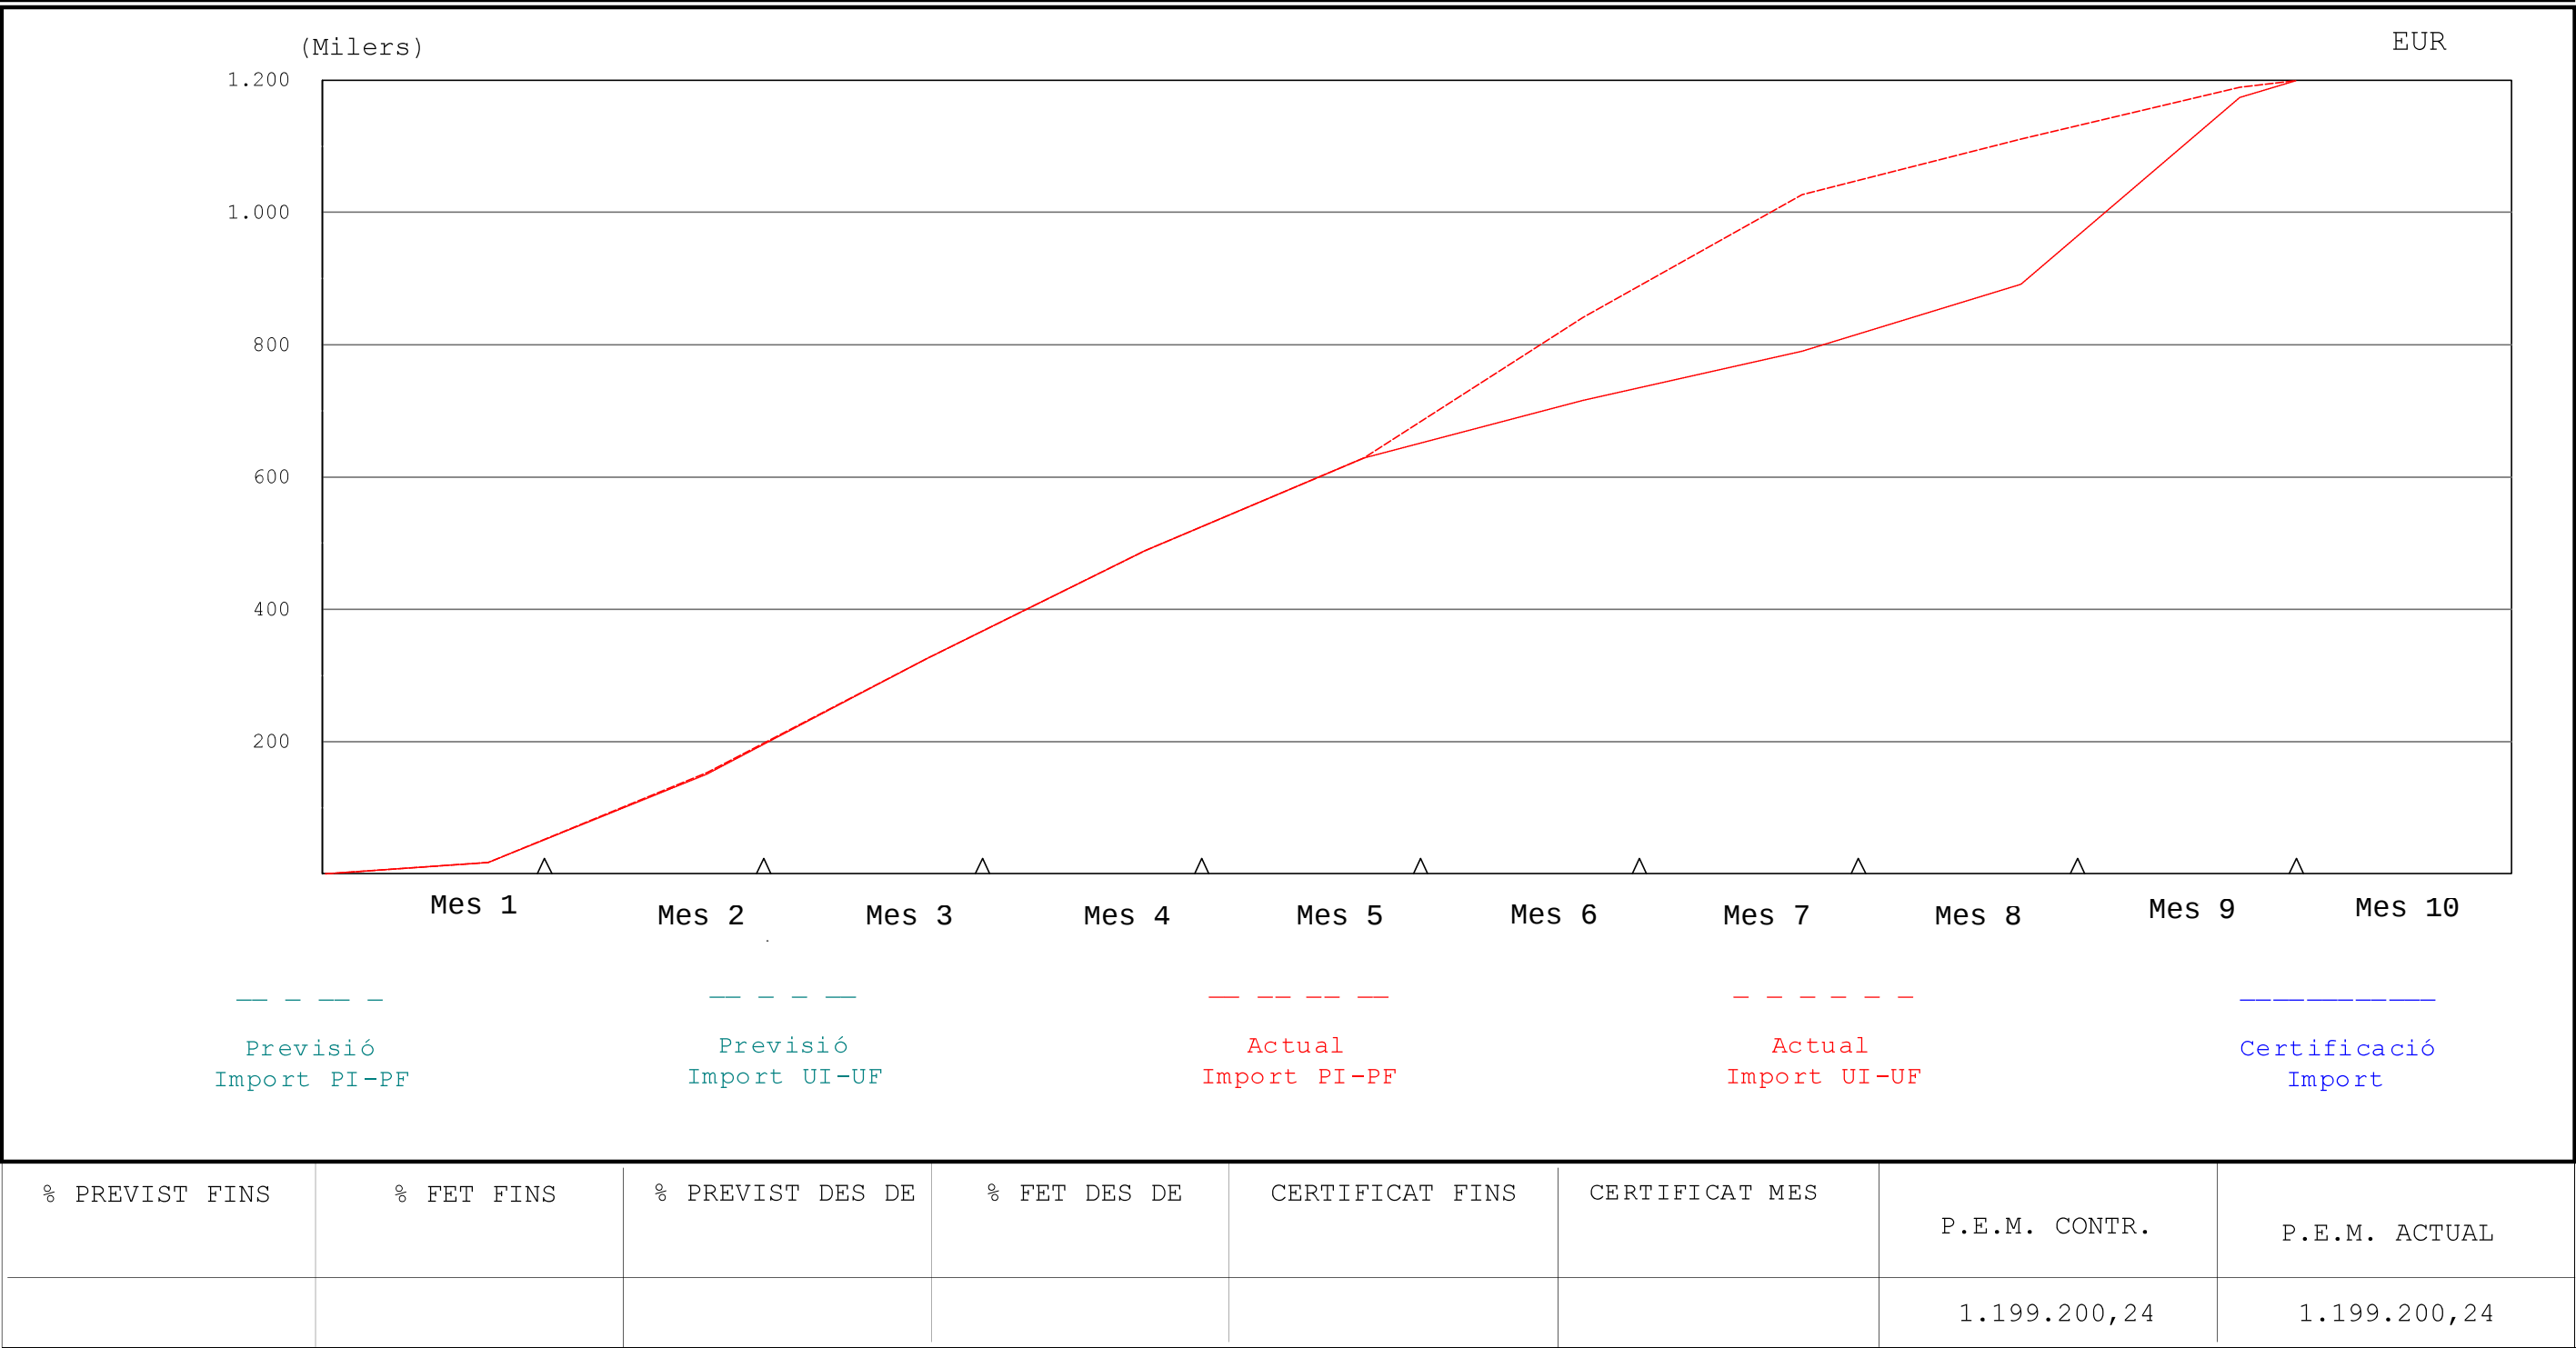

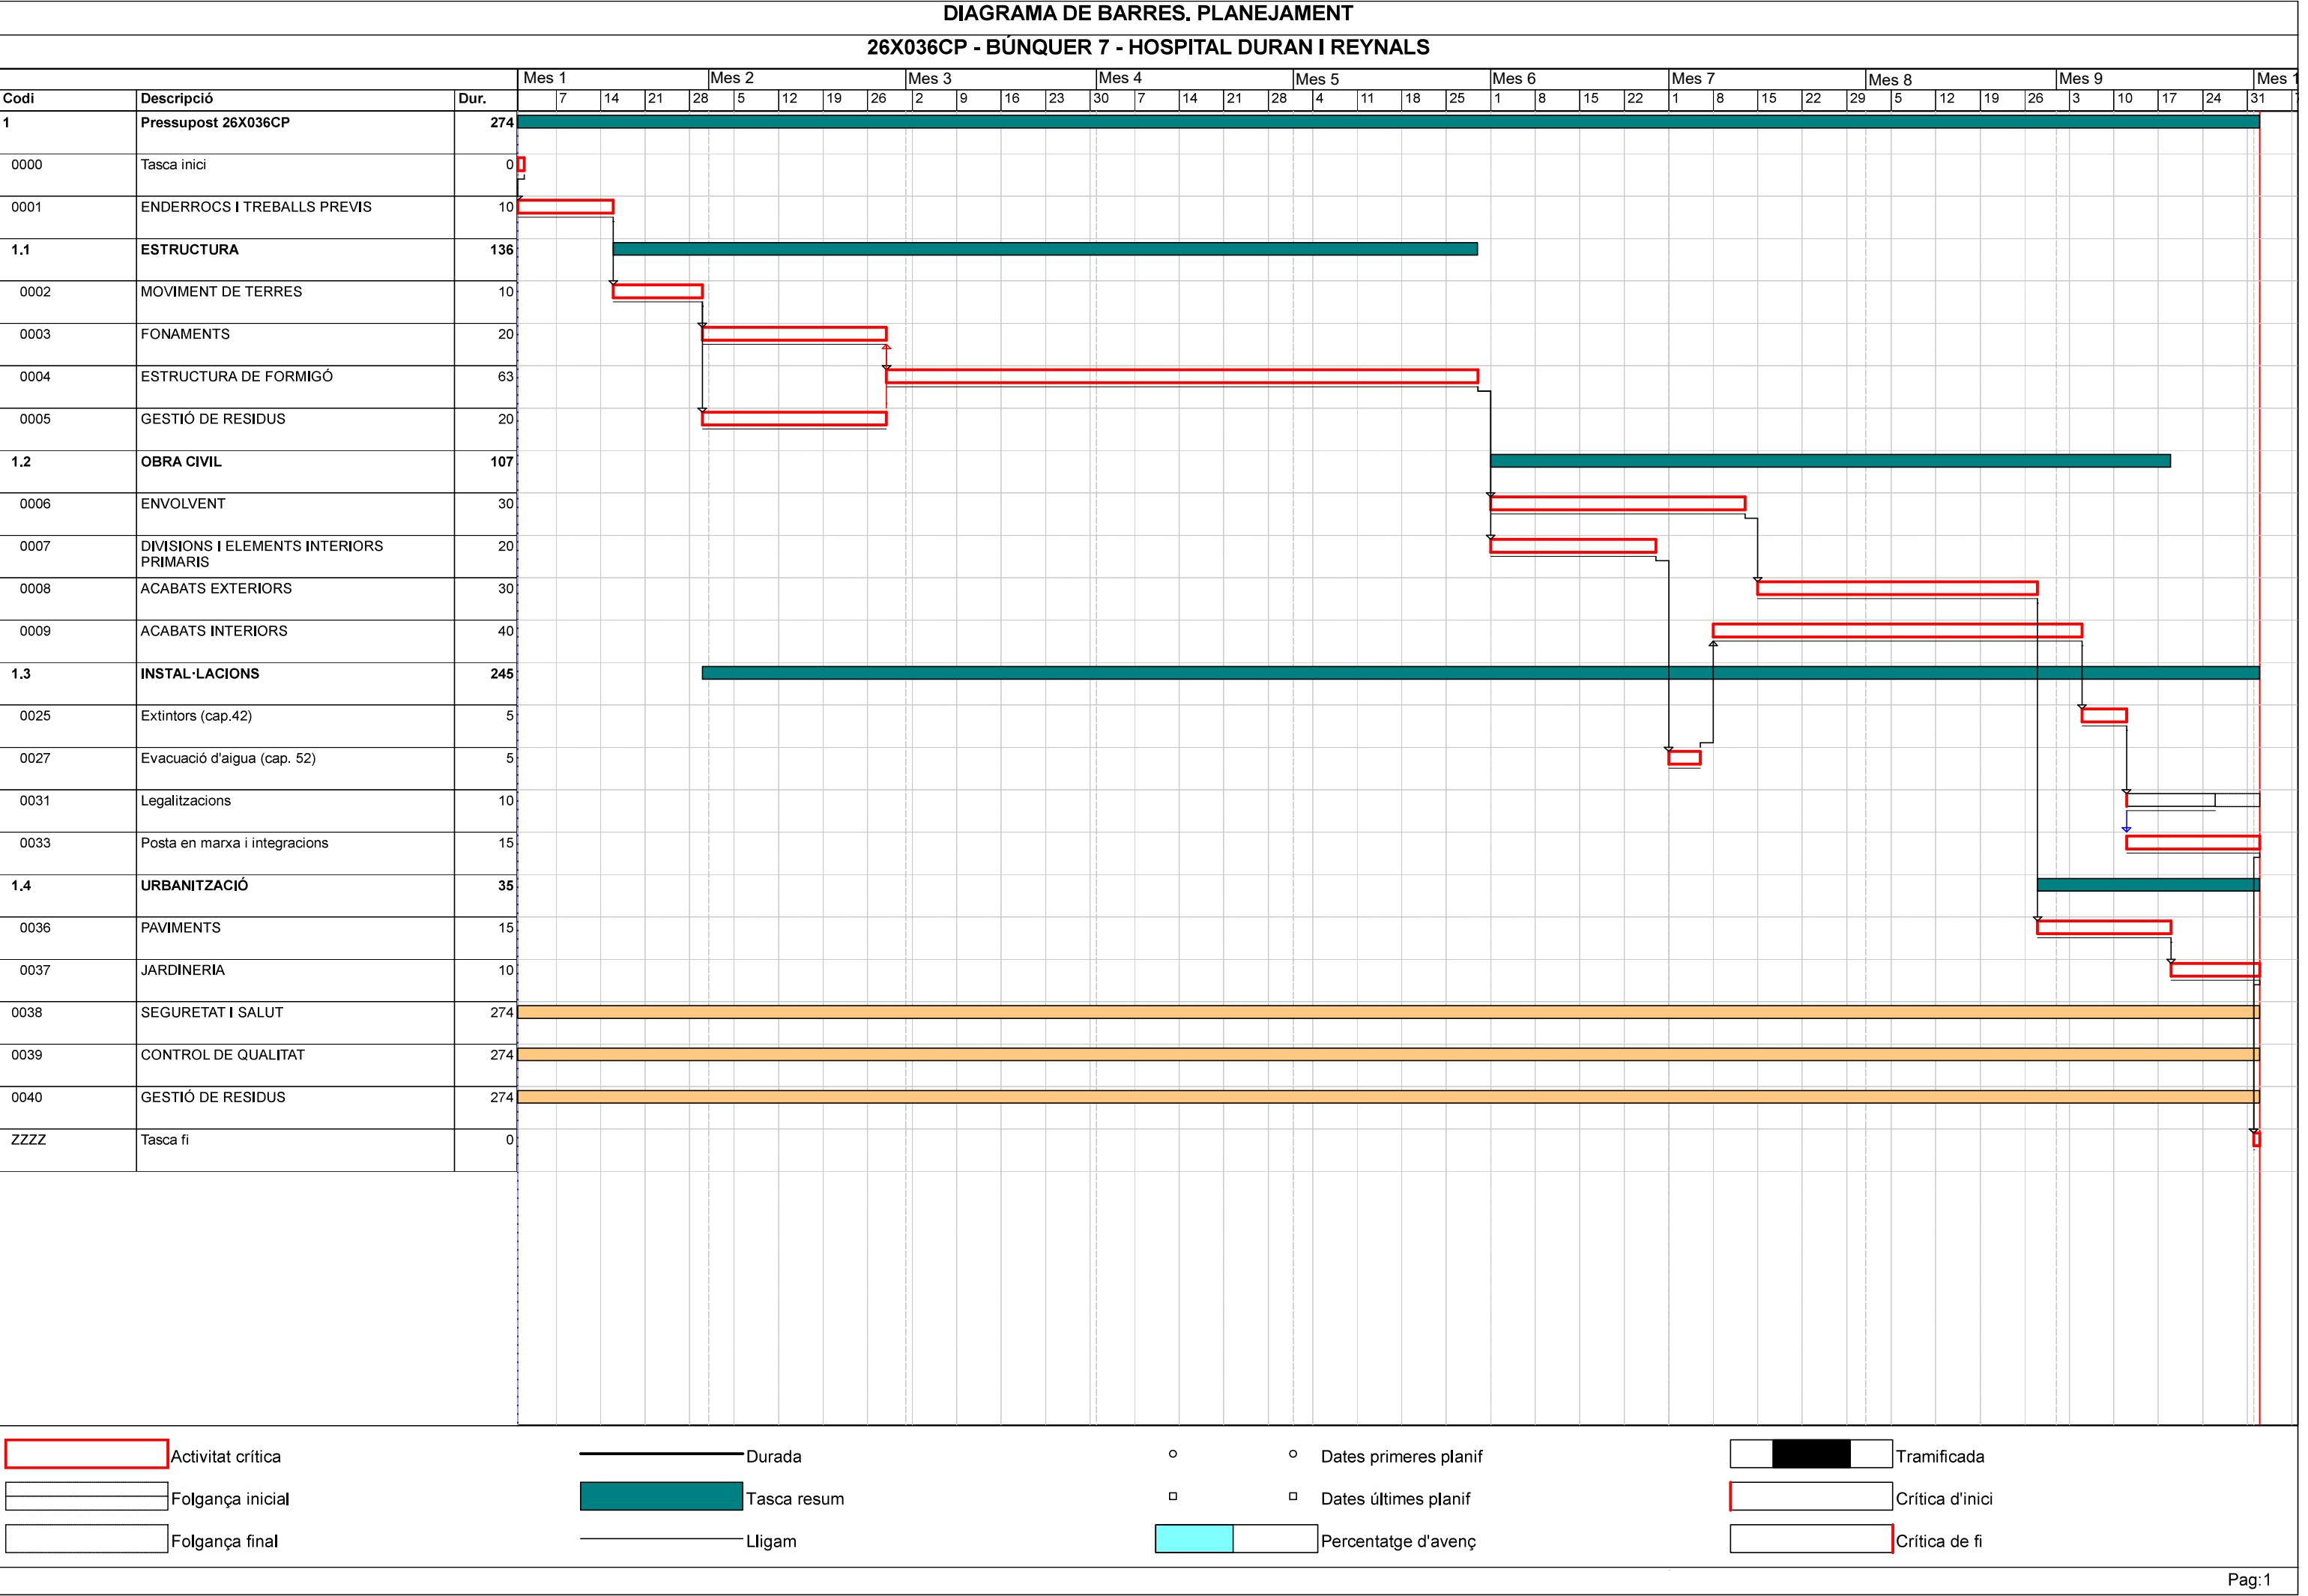

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	PI-PF	11.302,81	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81
	11.302,81	UI-UF	11.302,81	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81
0002	MOVIMENT DE TERRES	PI-PF	750,37	750,37	321,59	1.071,96	0,00	1.071,96
	1.071,96	UI-UF	750,37	750,37	321,59	1.071,96	0,00	1.071,96
0003	FONAMENTS	PI-PF	0,00	0,00	116.557,10	116.557,10	20.568,90	137.126,00
	137.126,00	UI-UF	0,00	0,00	116.557,10	116.557,10	20.568,90	137.126,00
0004	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	141.764,21	141.764,21
	470.060,29	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	141.764,21	141.764,21
0005	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	0,00	0,00	8.961,98	8.961,98	1.581,53	10.543,51
	10.543,51	UI-UF	0,00	0,00	8.961,98	8.961,98	1.581,53	10.543,51
0006	ENVOLVENT	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.052,84	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMARIS 14.805,78	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	ACABATS EXTERIORS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.165,15	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	ACABATS INTERIORS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.152,04	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TANCAMENT PRACTICABLES	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.192,56	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	DIVISIONS PRACTICABLES	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.691,53	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.804,47	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	Xarxa de terres (cap. 11)	PI-PF	0,00	0,00	3.004,84	3.004,84	0,00	3.004,84
	3.004,84	UI-UF	0,00	0,00	1.201,94	1.201,94	1.802,90	3.004,84
0016	Força (cap.13)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.366,82	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	Il·luminació (cap. 14)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.865,72	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Accessos i seguretat (cap. 22)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346,65	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:26/06/26

Pag.: 2

Estat: Planejament

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0019	Imatge i so (cap. 23)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287,70 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Cablejat estructurat (cap. 24)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.527,96 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Detecció d'incendis (cap. 26)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.411,02 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	Clima VRF. Equips i tuberies (cap. 31)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.838,61 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	Clima H2O. Equips i tuberies (cap. 32)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.229,32 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Ventilació. Renovació de l'aire (cap. 34)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,41 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	Extintors (cap.42)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,53 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	Suministre d'aigua (cap. 51)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.909,91 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	Evacuació d'aigua (cap. 52)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.045,46 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	Gasos medicinals (cap. 62)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.576,10 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Protecció passiva	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.835,00 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	Legalitzacions	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.936,34 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	Posta en marxa i integracions	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.385,34 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	Senyalització	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	PAVIMENTS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.427,78 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	JARDINERIA	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.990,05 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	SEGURETAT I SALUT	PI-PF	2.386,39	2.386,39	2.807,52	5.193,92	3.088,28	8.282,19
		26.390,72 UI-UF	2.386,39	2.386,39	2.807,52	5.193,92	3.088,28	8.282,19

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0039	CONTROL DE QUALITAT	PI-PF	1.085,11	1.085,11	1.276,60	2.361,70	1.404,26	3.765,96
	12.000,00	UI-UF	1.085,11	1.085,11	1.276,60	2.361,70	1.404,26	3.765,96
0040	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	2.255,76	2.255,76	2.653,83	4.909,59	2.919,22	7.828,80
	24.946,02	UI-UF	2.255,76	2.255,76	2.653,83	4.909,59	2.919,22	7.828,80
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.199.200,24	PI-PF	17.780,44	17.780,44	135.583,46	153.363,90	171.326,39	324.690,29
		UI-UF	17.780,44	17.780,44	133.780,56	151.561,00	173.129,29	324.690,29

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	PI-PF	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81
	11.302,81	UI-UF	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81
0002	MOVIMENT DE TERRES	PI-PF	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96
	1.071,96	UI-UF	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96
0003	FONAMENTS	PI-PF	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00
	137.126,00	UI-UF	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00
0004	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	PI-PF	156.686,76	298.450,98	134.302,94	432.753,92	37.306,37	470.060,29
	470.060,29	UI-UF	156.686,76	298.450,98	134.302,94	432.753,92	37.306,37	470.060,29
0005	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51
	10.543,51	UI-UF	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51
0006	ENVOLVENT	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	28.831,70	28.831,70
	48.052,84	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	28.831,70	28.831,70
0007	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,20	13.325,20
	14.805,78	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,20	13.325,20
0008	ACABATS EXTERIORS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.165,15	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	ACABATS INTERIORS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.152,04	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	TANCAMENT PRACTICABLES	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.192,56	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	DIVISIONS PRACTICABLES	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.691,53	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.804,47	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	Xarxa de terres (cap. 11)	PI-PF	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84
	3.004,84	UI-UF	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84
0016	Força (cap.13)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	122.366,82	122.366,82
	122.366,82	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	Il·luminació (cap. 14)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.865,72	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	Accessos i seguretat (cap. 22)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346,65	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0019	Imatge i so (cap. 23)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287,70 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Cablejat estructurat (cap. 24)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.527,96 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	Detecció d'incendis (cap. 26)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.411,02 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	Clima VRF. Equips i tuberies (cap. 31)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.838,61 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	Clima H2O. Equips i tuberies (cap. 32)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.229,32 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	Ventilació. Renovació de l'aire (cap. 34)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,41 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	Extintors (cap.42)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,53 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	Suministre d'aigua (cap. 51)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.909,91 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	Evacuació d'aigua (cap. 52)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.045,46 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	Gasos medicinals (cap. 62)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.576,10 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	Protecció passiva	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00
		2.835,00 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	Legalitzacions	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.936,34 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	Posta en marxa i integracions	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.385,34 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	Senyalització	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	PAVIMENTS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.427,78 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	JARDINERIA	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.990,05 UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	SEGURETAT I SALUT	PI-PF	2.947,90	11.230,09	2.526,77	13.756,86	3.228,65	16.985,52
		26.390,72 UI-UF	2.947,90	11.230,09	2.526,77	13.756,86	3.228,65	16.985,52

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0039	CONTROL DE QUALITAT	PI-PF	1.340,43	5.106,38	1.148,94	6.255,32	1.468,09	7.723,40
	12.000,00	UI-UF	1.340,43	5.106,38	1.148,94	6.255,32	1.468,09	7.723,40
0040	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	2.786,52	10.615,33	2.388,45	13.003,78	3.051,91	16.055,68
	24.946,02	UI-UF	2.786,52	10.615,33	2.388,45	13.003,78	3.051,91	16.055,68
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.199.200,24	PI-PF	163.761,61	488.451,90	140.367,10	628.819,00	212.413,74	841.232,74
		UI-UF	163.761,61	488.451,90	140.367,10	628.819,00	87.211,92	716.030,92

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	PI-PF	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81
	11.302,81	UI-UF	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81	0,00	11.302,81
0002	MOVIMENT DE TERRES	PI-PF	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96
	1.071,96	UI-UF	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96	0,00	1.071,96
0003	FONAMENTS	PI-PF	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00
	137.126,00	UI-UF	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00	0,00	137.126,00
0004	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	PI-PF	0,00	470.060,29	0,00	470.060,29	0,00	470.060,29
	470.060,29	UI-UF	0,00	470.060,29	0,00	470.060,29	0,00	470.060,29
0005	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51
	10.543,51	UI-UF	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51	0,00	10.543,51
0006	ENVOLVENT	PI-PF	19.221,14	48.052,84	0,00	48.052,84	0,00	48.052,84
	48.052,84	UI-UF	19.221,14	48.052,84	0,00	48.052,84	0,00	48.052,84
0007	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS	PI-PF	1.480,58	14.805,78	0,00	14.805,78	0,00	14.805,78
	14.805,78	UI-UF	1.480,58	14.805,78	0,00	14.805,78	0,00	14.805,78
0008	ACABATS EXTERIORS	PI-PF	13.644,04	13.644,04	34.110,10	47.754,14	3.411,01	51.165,15
	51.165,15	UI-UF	13.644,04	13.644,04	34.110,10	47.754,14	3.411,01	51.165,15
0009	ACABATS INTERIORS	PI-PF	27.674,41	27.674,41	42.576,02	70.250,43	14.901,61	85.152,04
	85.152,04	UI-UF	27.674,41	27.674,41	42.576,02	70.250,43	14.901,61	85.152,04
0010	TANCAMENT PRACTICABLES	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,56	2.192,56
	2.192,56	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,56	2.192,56
0011	DIVISIONS PRACTICABLES	PI-PF	44.691,53	44.691,53	0,00	44.691,53	0,00	44.691,53
	44.691,53	UI-UF	0,00	0,00	8.938,31	8.938,31	35.753,22	44.691,53
0012	MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,47	11.804,47
	11.804,47	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,79	4.721,79
0015	Xarxa de terres (cap. 11)	PI-PF	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84
	3.004,84	UI-UF	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84	0,00	3.004,84
0016	Força (cap.13)	PI-PF	0,00	122.366,82	0,00	122.366,82	0,00	122.366,82
	122.366,82	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	122.366,82	122.366,82
0017	Il·luminació (cap. 14)	PI-PF	3.865,72	3.865,72	0,00	3.865,72	0,00	3.865,72
	3.865,72	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,29	1.546,29
0018	Accessos i seguretat (cap. 22)	PI-PF	346,65	346,65	0,00	346,65	0,00	346,65
	346,65	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	346,65	346,65

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0019	Imatge i so (cap. 23)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70	287,70
	287,70	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Cablejat estructurat (cap. 24)	PI-PF	6.527,96	6.527,96	0,00	6.527,96	0,00	6.527,96
	6.527,96	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,96	6.527,96
0021	Detecció d'incendis (cap. 26)	PI-PF	3.411,02	3.411,02	0,00	3.411,02	0,00	3.411,02
	3.411,02	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,02	3.411,02
0022	Clima VRF. Equips i tuberies (cap. 31)	PI-PF	10.838,61	10.838,61	0,00	10.838,61	0,00	10.838,61
	10.838,61	UI-UF	0,00	0,00	2.167,72	2.167,72	8.670,89	10.838,61
0023	Clima H2O. Equips i tuberies (cap. 32)	PI-PF	26.229,32	26.229,32	0,00	26.229,32	0,00	26.229,32
	26.229,32	UI-UF	0,00	0,00	5.245,86	5.245,86	20.983,46	26.229,32
0024	Ventilació. Renovació de l'aire (cap. 34)	PI-PF	9.900,41	9.900,41	0,00	9.900,41	0,00	9.900,41
	9.900,41	UI-UF	0,00	0,00	1.980,08	1.980,08	7.920,33	9.900,41
0025	Extintors (cap.42)	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	64,53
	64,53	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	64,53
0026	Suministre d'aigua (cap. 51)	PI-PF	1.909,91	1.909,91	0,00	1.909,91	0,00	1.909,91
	1.909,91	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	Evacuació d'aigua (cap. 52)	PI-PF	5.045,46	5.045,46	0,00	5.045,46	0,00	5.045,46
	5.045,46	UI-UF	5.045,46	5.045,46	0,00	5.045,46	0,00	5.045,46
0028	Gasos medicinals (cap. 62)	PI-PF	4.576,10	4.576,10	0,00	4.576,10	0,00	4.576,10
	4.576,10	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,10	4.576,10
0030	Protecció passiva	PI-PF	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
	2.835,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00
0031	Legalitzacions	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,71	8.942,71
	9.936,34	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,80	5.961,80
0033	Posta en marxa i integracions	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,20	6.231,20
	10.385,34	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,20	6.231,20
0034	Senyalització	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00
	945,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	PAVIMENTS	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,78	20.427,78
	20.427,78	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,78	20.427,78
0037	JARDINERIA	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,02	1.996,02
	4.990,05	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,02	1.996,02
0038	SEGURETAT I SALUT	PI-PF	2.807,52	19.793,04	2.807,52	22.600,56	2.947,90	25.548,46
	26.390,72	UI-UF	2.807,52	19.793,04	2.807,52	22.600,56	2.947,90	25.548,46

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:26/06/26

Pag.: 9

Estat: Planejament

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0039	CONTROL DE QUALITAT	PI-PF	1.276,60	9.000,00	1.276,60	10.276,60	1.340,43	11.617,02
	12.000,00	UI-UF	1.276,60	9.000,00	1.276,60	10.276,60	1.340,43	11.617,02
0040	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	2.653,83	18.709,52	2.653,83	21.363,35	2.786,52	24.149,87
	24.946,02	UI-UF	2.653,83	18.709,52	2.653,83	21.363,35	2.786,52	24.149,87
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	UI-UF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	1.199.200,24	PI-PF	186.100,81	1.027.333,55	83.424,07	1.110.757,62	78.279,44	1.189.037,05
		UI-UF	73.803,58	789.834,50	101.756,05	891.590,54	281.920,89	1.173.511,43

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:26/06/26

Estat: Planejament

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0000	Tasca inici	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
0001	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	PI-PF	0,00	11.302,81				
	11.302,81	UI-UF	0,00	11.302,81				
0002	MOVIMENT DE TERRES	PI-PF	0,00	1.071,96				
	1.071,96	UI-UF	0,00	1.071,96				
0003	FONAMENTS	PI-PF	0,00	137.126,00				
	137.126,00	UI-UF	0,00	137.126,00				
0004	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	PI-PF	0,00	470.060,29				
	470.060,29	UI-UF	0,00	470.060,29				
0005	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	0,00	10.543,51				
	10.543,51	UI-UF	0,00	10.543,51				
0006	ENVOLVENT	PI-PF	0,00	48.052,84				
	48.052,84	UI-UF	0,00	48.052,84				
0007	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS	PI-PF	0,00	14.805,78				
	14.805,78	UI-UF	0,00	14.805,78				
0008	ACABATS EXTERIORS	PI-PF	0,00	51.165,15				
	51.165,15	UI-UF	0,00	51.165,15				
0009	ACABATS INTERIORS	PI-PF	0,00	85.152,04				
	85.152,04	UI-UF	0,00	85.152,04				
0010	TANCAMENT PRACTICABLES	PI-PF	0,00	2.192,56				
	2.192,56	UI-UF	0,00	2.192,56				
0011	DIVISIONS PRACTICABLES	PI-PF	0,00	44.691,53				
	44.691,53	UI-UF	0,00	44.691,53				
0012	MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX	PI-PF	0,00	11.804,47				
	11.804,47	UI-UF	7.082,68	11.804,47				
0015	Xarxa de terres (cap. 11)	PI-PF	0,00	3.004,84				
	3.004,84	UI-UF	0,00	3.004,84				
0016	Força (cap.13)	PI-PF	0,00	122.366,82				
	122.366,82	UI-UF	0,00	122.366,82				
0017	Il·luminació (cap. 14)	PI-PF	0,00	3.865,72				
	3.865,72	UI-UF	2.319,43	3.865,72				
0018	Accessos i seguretat (cap. 22)	PI-PF	0,00	346,65				
	346,65	UI-UF	0,00	346,65				

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:26/06/26

Pag.: 11

Estat: Planejament

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0019	Imatge i so (cap. 23)	PI-PF	0,00	287,70				
	287,70	UI-UF	287,70	287,70				
0020	Cablejat estructurat (cap. 24)	PI-PF	0,00	6.527,96				
	6.527,96	UI-UF	0,00	6.527,96				
0021	Detecció d'incendis (cap. 26)	PI-PF	0,00	3.411,02				
	3.411,02	UI-UF	0,00	3.411,02				
0022	Clima VRF. Equips i tuberies (cap. 31)	PI-PF	0,00	10.838,61				
	10.838,61	UI-UF	0,00	10.838,61				
0023	Clima H2O. Equips i tuberies (cap. 32)	PI-PF	0,00	26.229,32				
	26.229,32	UI-UF	0,00	26.229,32				
0024	Ventilació. Renovació de l'aire (cap. 34)	PI-PF	0,00	9.900,41				
	9.900,41	UI-UF	0,00	9.900,41				
0025	Extintors (cap.42)	PI-PF	0,00	64,53				
	64,53	UI-UF	0,00	64,53				
0026	Suministre d'aigua (cap. 51)	PI-PF	0,00	1.909,91				
	1.909,91	UI-UF	1.909,91	1.909,91				
0027	Evacuació d'aigua (cap. 52)	PI-PF	0,00	5.045,46				
	5.045,46	UI-UF	0,00	5.045,46				
0028	Gasos medicinals (cap. 62)	PI-PF	0,00	4.576,10				
	4.576,10	UI-UF	0,00	4.576,10				
0030	Protecció passiva	PI-PF	0,00	2.835,00				
	2.835,00	UI-UF	0,00	2.835,00				
0031	Legalitzacions	PI-PF	993,63	9.936,34				
	9.936,34	UI-UF	3.974,54	9.936,34				
0033	Posta en marxa i integracions	PI-PF	4.154,14	10.385,34				
	10.385,34	UI-UF	4.154,14	10.385,34				
0034	Senyalització	PI-PF	0,00	945,00				
	945,00	UI-UF	945,00	945,00				
0036	PAVIMENTS	PI-PF	0,00	20.427,78				
	20.427,78	UI-UF	0,00	20.427,78				
0037	JARDINERIA	PI-PF	2.994,03	4.990,05				
	4.990,05	UI-UF	2.994,03	4.990,05				
0038	SEGURETAT I SALUT	PI-PF	842,26	26.390,72				
	26.390,72	UI-UF	842,26	26.390,72				

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS

Data:26/06/26

Pag.: 12

Estat: Planejament

Tasca Codi	Descripció Import total assignat		Període	Acumulat	Període	Acumulat	Període	Acumulat
0039	CONTROL DE QUALITAT	PI-PF	382,98	12.000,00				
	12.000,00	UI-UF	382,98	12.000,00				
0040	GESTIÓ DE RESIDUS	PI-PF	796,15	24.946,02				
	24.946,02	UI-UF	796,15	24.946,02				
ZZZZ	Tasca fi	PI-PF	0,00	0,00				
	0,00	UI-UF	0,00	0,00				
TOTALS	1.199.200,24	PI-PF	10.163,19	1.199.200,24				
		UI-UF	25.688,81	1.199.200,24				

	Previsions inicials mínimes	
	Per període	Acumulada
setmana 1-setmana 4	17.780,44	17.780,44
setmana 4-setmana 8	133.780,56	151.561,00
setmana 8-setmana 12	173.129,29	324.690,29
setmana 12-setmana 16	163.761,61	488.451,90
setmana 16-setmana 20	140.367,10	628.819,00
setmana 20-setmana 24	87.211,92	716.030,92
setmana 24-setmana 28	73.803,58	789.834,50
setmana 28-setmana 32	101.756,05	891.590,54
setmana 32-setmana 36	281.920,89	1.173.511,43
setmana 36-setmana 37	25.688,81	1.199.200,24
