



Ajuntament de Tona

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA

ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE TONA

FEBRER DE 2025

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Ajuntament de Tona

ÍNDEX

Memòria

MD 1. Agents

- 1.1 Objecte del document
- 1.2 Promotor
- 1.3 Redacció de la memòria valorada

MD 2. Informació Prèvia

- 2.1 Antecedents
- 2.2 Estat actual i emplaçament de les diferents actuacions
- 2.3 Normativa urbanística

MD 3. Descripció de la memòria valorada

- 3.1 Descripció general
- 3.2 Normativa aplicable
- 3.3 Descripció de les actuacions contemplades
- 3.4. Pla de treball
- 3.5. Control de qualitat
- 3.6. Seguretat i Salut
- 3.7. Gestió de residus
- 3.8. Pressupost de les obres

Amidaments i Pressupost

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Documentació gràfica

0. DADES GENERALS

IDENTIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ I AGENTS

Memòria tècnica valorada:	Actuacions a coberta edifici Ajuntament per a instal·lació fotovoltaica		
Ús previst característic:	EQ. Equipaments públics EQc. Equipament administratiu: Ajuntament i de servei d'atenció al ciutadà		
Tipus d'intervenció:	Obres de reforma / millora		
Emplaçament: Municipi:	Carrer de la Font, núm. 10 08551 – Tona		
Promotor:	Nom:	Ajuntament de Tona	
	CIF:	P-0828300-D	
	Adreça:	Carrer de la Font, 10 08551 – Tona	
Redacció:	David Pujol Vila Arquitecte tècnic municipal Serveis Tècnics Municipals Ajuntament de Tona		

(Document datat i signat electrònicament)

MD 1. AGENTS

1.1 Objecte del document

A petició del servei d'esports de l'Ajuntament de Tona, es redacta la present memòria tècnica valorada per tal d'estudiar i executar les obres corresponents a la substitució de les teules a part de la coberta i la creació d'una coberta plana per a poder disposar d'espai exterior per a futures màquines d'aerotèrmia, a l'edifici de l'Ajuntament i accés a coberta per a manteniment.

Els objectius a aconseguir amb aquest treballs són:

- Substitució de les teules de coberta a la vessant sud de l'edifici.
- Creació de coberta plana no transitable per a poder disposar d'un espai exterior accessible per a col·locar màquines exteriors d'aerotèrmia i accés a coberta per a manteniment.

1.2 Promotor:

El promotor de l'obra és l'Ajuntament de Tona, amb NIF P-0828300D, i domicili al carrer de la Font 10, del municipi de Tona.

1.3 Redacció de la memòria tècnica valorada:

La present memòria valorada ha estat redactada per l'arquitecte tècnic municipal David Pujol Vila, amb número de col·legiat 11395 CATEB, dins els Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Tona.


MD 2. INFORMACIÓ PRÈVIA

2.1 Antecedents

S'ha constatat que una gran part de les teules de la vessant sud estan trencades, mogudes o directament hi falten.



Estat actual vessant sud coberta

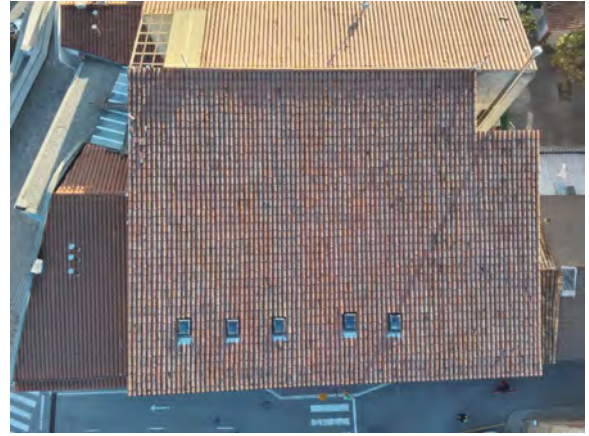

Estat actual vessant nord coberta



Façana Sud



Façana Nord

2.2 Estat actual

Tipologia estructural:

L'estructura de l'edifici respon al model tradicional de parets de càrrega. Les parets son mixtes de bloc de formigó i maó calat.


La coberta està formada per teula ceràmica i encadellat ceràmic recolzat sobre envans conillers o biguetes autoportants prefabricades de formigó.

Les dimensions de la coberta objecte de l'actuació son les següents:

Substitució teules a coberta inclinada	372,00 m2
Nova coberta plana no transitable	24,10 m2

Fotografies estat actual



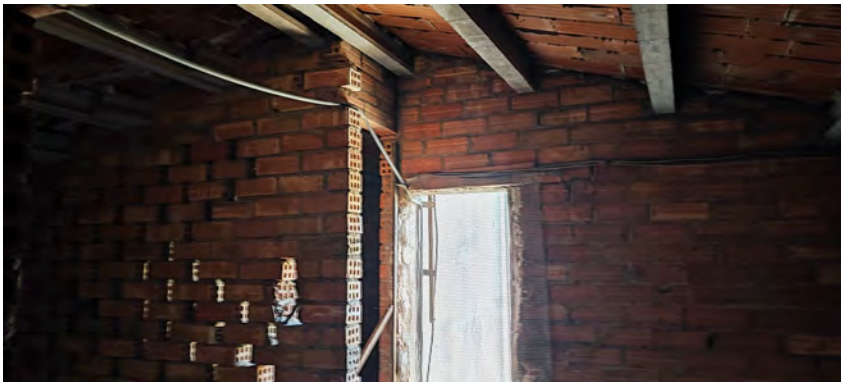

2.3 Normativa urbanística

Segons el planejament vigent, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de data 26 de gener de 2011 i aprovada la publicació de la normativa urbanística del text refós en sessió de data 20 de juliol de 2011.

Sòl urbà

EQ. Equipaments públics

EQc. Equipament administratiu: Ajuntament i de servei d'atenció al ciutadà



Pel que fa a les seves prestacions, l'edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE RD. 314/2006).

MD 3. DESCRIPCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA

3.1 Descripció general

Els treballs contemplats en la present memòria tècnica valorada son els següents:

Substitució teules a coberta inclinada
Creació de nova coberta plana no transitable

TREBALLS PREVIS

- Treballs desmuntatge i tornar a muntar lames de protecció solar existents a la terrassa de la façana sud per a muntatge i desmuntatge de bastida tubular.
- Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària ≤ 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
- Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària ≤ 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m² de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.

COBERTA INCLINADA

La coberta està formada per teula ceràmica i encadellat ceràmic recolzat sobre envans conillers o biguetes autoportants prefabricades de formigó.

Enderrocs i desmuntatges

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a contenidor.

Coberta

- Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color Panache Foncé de Terreal o equivalent, de 25 peces/m², col·locada amb morter mixt 1:2:10 i espuma de poliuretà. Inclòs part proporcional de carener.

COBERTA PLANA

Enderrocs i desmuntatges

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a contenidor.
- Enderroc solera encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a contenidor
- Enderroc de bigues autoportant de formigó a coberta, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa a contenidor.

Reforç estructura existent

- Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m³/m² de formigó per armar HA-30/F10/XC1, amb una quantitat de ciment de 300 kg/m³ i relació aigua ciment $\leq 0,6$, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebogat, càrrega manual de runa a contenidor.

Parets perímetre nova coberta plana

- Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta M5 (5 N/mm²).
- Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària, per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10 per a formació d'obertura.

- Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, acabat remolinat.
- Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat.
- Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.

Coberta plana

- Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m³, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 8 cm de gruix mitjà.
- Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m² d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m², adherida en calent, prèvia imprimació.
- Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m², col·locat sense adherir.
- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 100 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m²·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica.
- Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m², col·locat sense adherir.
- Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 6 cm de gruix, col·locat sense adherir.

Evacuació aigües coberta

- Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa anti-grava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou peça de reforç a desguàs bunera, compost per làmina betum modificat amb elastòmer (LBM-30-FP) de 3,0 kg/m² amb armadura de filtre de polièster anti-punxonament, adherida al suport amb cola, per a tub PVC d-125 mm.
- Sobreeixidor amb tub inoxidable de sortida de diàmetre 90 mm i 6 mm de gruix, longitud de volada 10-15 cm, acabat amb tall a cartabó i col·locat amb pendent, fixada amb adhesiu cimentós flexible i soldada a impermeabilització coberta.
- Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0, incloses mitjans auxiliars per a muntatge, peces especials i fixacions a paret pati.
- Prova de servei per comprovar l'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, superfície d'entre 50 i 100 m², mitjançant inundació de tota la superfície, inclòs desplaçament a obra i informe de resultats de prova realitzada.

Tancaments practicables

- Subministra i col·locació de balconera d'alumini anoditzat color RAL standard, amb interrupció del pont tèrmic, sistema Cor-3500 amb RPT de Cortizo® o similar, col·locades sobre premarc (inclòs), per un buit d'obra de 950x1800mm, 1 fulla practicable, U<1,92W/m²K, R_{tr}<32dB(A), permeabilitat a l'aire: classe 3, vidre Climallit aïllant de dues llunes de seguretat i càmera, vidre baix emissiu gas argó 4+4/16/6 mm. Reomplert d'escuma de poliuretà entre el junt del marc amb el bastiment de base i segellats de silicona neutra. Ferratges, mecanismes necessaris, manetes del mateix color, tapetes interiors. Sense persiana.

GESTIO DE RESIDUS

- Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m³ de capacitat.
- Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus.

Abans de començar els treballs, caldrà assegurar, apuntalar o retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat cap als treballadors i/o usuaris de l'edifici.

3.2 Normativa aplicable

Per el bon compliment d'aquesta memòria valorada, en l'execució de les obres es tindran en compte les següents normatives:

Segons el RD 314/2006 **Codi Tècnic de l'Edificació**, en el seu art.2: Àmbit d'aplicació, exposa que en qualsevol reforma que es realitzi en un edifici existent caldrà comprovar el compliment de les exigències bàsiques de CTE.

RD 1627/1997, Seguretat i Salut en les obres de construcció.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

Com a memòria valorada d'obra local ordinària, s'ajusta a les determinacions de:

- DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

3.3 Pla de treball

El termini previst per a l'execució de la totalitat de les obres definides en la present memòria, ateses la seva tipologia i característiques, s'estima en **6 SETMANES** comptat a partir de la signatura de l'Acta de comprovació de replanteig o d'inici d'obres, i segons el programa de desenvolupament dels treballs – pla d'obra-, de caràcter indicatiu, següent.

PLA DE TREBALL																												
	SETMANA 1				SETMANA 2				SETMANA 3				SETMANA 4				SETMANA 5				SETMANA 6							
TREBALLS PREVIS																												
COBERTA INCLINADA																												
Retirada de teules																												
Colocació noves teules																												
COBERTA PLANA																												
Enderrocs																												
Capa de compressió																												
Noves parets																												
Coberta plana																												
Tancament practicable																												
Evacuacio aigues																												
GESTIO DE RESIDUS																												
SEGURETAT I SALUT																												

Un cop finalitzades les obres es formalitzarà la preceptiva Acta de recepció final, fixant-se com a període de garantia de les mateixes el de DOTZE MESOS, atès que s'entén aquest període com a suficient per a poder observar el comportament de l'obra executada i poder, si s'escau, corregir i/o reparar qualsevol defecte que s'hagi detectat.

El termini d'execució dels treballs previstos en aquesta memòria és de **6 SETMANES**, aquest termini haurà de ser justificat i/o millorat pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant una planificació de l'obra.

REVISIÓ DE PREUS

La revisió de preus es regirà pel que especifiqui el Plec de Condicions Administratives que regeixi la contractació de les obres.

D'acord amb les disposicions vigents, el contractista no pot reclamar, amb el pretext d'error o d'omissió, cap modificació en els preus senyalats amb lletra al Quadre de preus núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent segons la millora que s'hagués obtingut a l'adjudicació.

Els preus del Quadre de preus núm. 2, s'han d'aplicar únicament i exclusivament en els casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió del contracte o per altra causa no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establerta a l'esmentat quadre.

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

L'apartat 1.a) de l'article 77 –Exigència i efectes de la classificació– de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix que per als contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 EUROS, serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat. Per als contractes d'obres, el valor dels quals sigui inferior a 500.000 EUROS, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència econòmica, financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 86 a 88 de la LCSP en els termes que recullen els plecs de clàusules administratives particulars corresponents que regiran les licitacions per a les adjudicacions dels contractes d'obres.

D'acord amb aquestes previsions i atès que el valor estimat del contracte per a l'execució de les obres definides en la present memòria valorada és inferior a 500.000 euros, no serà exigible la classificació del contractista.

El plec de clàusules administratives particulars que regirà el procediment de licitació per l'adjudicació del contracte d'obres definirà els criteris de solvència exigits necessaris per a establir la tipologia d'empresa capacitada per a executar les obres, els quals s'hauran d'indicar a l'anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment.

DECLARACIÓ D'OBRA COMPETA

En compliment de l'article 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP), i de l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit definit en els articles 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre i 13.3 de la LCAP, susceptible de ser destinada a l'ús general o al servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions de què pugui ser objecte posteriorment, i compren tots i cadascun dels elements que siguin necessaris per utilitzar l'obra.

Així mateix, es fa constar que la present memòria valorada d'obra ordinària conté tota la documentació exigida, segons la seva naturalesa i característiques, per l'article 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com per l'article 18 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'Obra Pública.

3.4 Control de qualitat

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.- Prescripcions sobre els materials. (**CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA**)

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s'hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l'execució per unitats d'obra. (**CONTROL D'EXECUCIÓ**)

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execució, normes d'aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d'acabat, conservació i manteniment, control d'execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat. (**CONTROL DE L'OBRA ACABADA**)

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de l'edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d'obra ha de generar diversos tipus de controls, que són els següents:

A). Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que s'exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:

- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. S'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execució d'unitats d'obra. Es comprovarà l'adequació i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complets d'obra, un cop finalitzada aquesta.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.

Per compte del Contractista, i fins a l'1 per cent (1%) de l'import del pressupost d'execució material (PEM), d'acord amb la Direcció Facultativa.

3.5 Seguretat i Salut

D'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció s'ha redactat i incorporat a la present memòria el corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut en el treball.

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, el contractista haurà d'elaborar un Pla de seguretat i salut en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'Estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.

En tant que es tracta d'una obra per a una Administració Pública, aquest Pla, amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució de l'obra, s'eleva a la seva aprovació a l'òrgan de l'Ajuntament de Tona adjudicador de l'obra.

Durant el termini de les obres es complirà amb la normativa de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems.

El contractista tindrà la obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa. També es realitzaran totes les instal·lacions higièniques necessàries per a l'equip de treball. En tot cas es seguiran les ordres i indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'obra.

3.6. Gestió de residus

En el següent apartat es justifica que les operacions de gestió dels residus produïts durant l'obra, que complirà les determinacions establertes en el **Reial Decret 105/2008** Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc, **Decret 89/2010** Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i enderroc i **Reial Decret 210/2018** Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

Al inici de l'obra l'empresa constructora haurà de presentar davant la direcció facultativa, el document d'acceptació d'un dipòsit signat per un gestió autoritzat, en el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import del dipòsit.

En un principi, les runes i terres seran tractats per:

A determinar per l'empresa contractista adjudicatària de l'obra, aquesta haurà d'aportar la documentació al inici de l'obra.

Tipus de Residu	M3
Residus d'enderroc ceràmics, teules, maons CODI LER 170107	58,39

Al final de l'obra s'haurà de justificar el volum de residus tractats.

3.7. Pressupost de les obres

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	42.264,27
Subtotal	42.264,27
13 % Despeses generals SOBRE 42.264,27.....	5.494,36
6 % Benefici Industrial SOBRE 42.264,27.....	2.535,86
21 % IVA SOBRE 50.294,49.....	10.561,84
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	60.856,33

El pressupost d'execució material en que es valora aquesta obra, és de **42.264,27 €** (QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE euros amb VINT-I-SET cèntims).

El pressupost total de contracte i per coneixement de l'administració de les obres descrites en la memòria tècnica valorada ascendeix a la quantitat de **60.856,33 €** (SEIXANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS euros amb TRENTA-TRES cèntims) amb el 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 21% d'IVA inclòs.

Aquest preu no contempla la realització de la Direcció d'obra, que es podrà portar a terme dins els serveis tècnics municipals.

Aquest preu no contempla la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució, que caldrà contractar de forma independent.

(Document datat i signat electrònicament)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	42.264,27
Subtotal	42.264,27
13 % Despeses generals SOBRE 42.264,27	5.494,36
6 % Benefici Industrial SOBRE 42.264,27	2.535,86
21 % IVA SOBRE 50.294,49	10.561,84
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	60.856,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TREBALLS PREVIS	2.602,45
Capítol	01.02	COBERTA INCLINADA	26.456,64
Capítol	01.03	COBERTA NO TRANSITABLE	8.941,83
Capítol	01.04	GESTIO RESIDUS	2.263,35
Capítol	01.05	SEGURETAT I SALUT	1.000,00
Capítol	01.06	IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.000,00
Obra	01	COBERTA AJUNTAMENT	42.264,27
			42.264,27
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	COBERTA AJUNTAMENT	42.264,27
			42.264,27

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 8)	10,30	180,000	1.854,00
2	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 7)	0,09	5.400,000	486,00
3	DESMUN	pa	Treballs desmuntatge i tornar amuntar lames de proteccio solar existents a la terrassa de la façana sud per a muntatge i desmuntatge de bastida tubular. (P - 2)	262,45	1,000	262,45

TOTAL Capítol 01.01 2.602,45

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
 Capítol 02 COBERTA INCLINADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214Q-4RPT	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	12,60	372,000	4.687,20
2	P52D-4V3B	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color Panache Foncé de Terreal o equivalent, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclòs part proporcional de carener. (P - 17)	58,52	372,000	21.769,44

TOTAL Capítol 01.02 26.456,64

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
 Capítol 03 COBERTA NO TRANSITABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214Q-4RPT	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	12,60	38,063	479,59
2	P214Q-4RPP	m2	Enderroc solera encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	9,70	38,063	369,21
3	P214Q-4RNV	m2	Enderroc bigues autoportant formigo coberta, entrebigat de 60 cm d'intereix, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 9)	11,29	38,063	429,73
4	P4SA-MGVb	m2	Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 15)	11,83	33,600	397,49
5	P6125-7BK9	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD,	43,29	33,818	1.463,98

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

			segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. (P - 20)			
6	P4FC-545G	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 14)	34,65	1,000	34,65
7	P811-3FFR	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat (P - 24)	24,34	33,818	823,13
8	P89H-4V6W	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 25)	9,68	40,046	387,65
9	P8J9-H9BO	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 26)	54,14	19,650	1.063,85
10	P5Z15-4Z2W	m2	Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 8 cm de gruix mitjà (P - 19)	12,79	24,095	308,18
11	P712-DXD5	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 21)	26,35	28,914	761,88
12	P7B1-6Q35	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir (P - 22)	3,03	53,010	160,62
13	P7C25-DBJB	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2.857 i 2.581 m2-K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica. (P - 23)	16,19	24,095	390,10
14	P510-38DR	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 6 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 16)	7,72	24,095	186,01
15	E5ZH4DQ4	u	Bonera de PVC rígida de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou peça de reforç a desguàs bunera, compost per làmina bitum modificat amb elastómer (LBM-30-FP) de 3,0 kg/m2 amb armadura de filtre de polièster antipunxament, adherida al suport amb cola, per a tub PVC d-125 mm. (P - 3)	99,00	1,000	99,00
16	GDZ24121	ut	Sobreixidor amb tub inoxidable de sortida de diàmetre 90 mm i 6 mm de gruix, longitud de volada 10-15 cm, acabat amb tall a cartabó i col·locat amb pendent, fixada amb adhesiu cimentós flexible i soldada a impermeabilització coberta. (P - 4)	125,00	1,000	125,00
17	PD18-8D4W	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0, incloses mitjans auxiliars per a muntatge, peces especials i fixacions a paret pati. (P - 27)	27,23	12,000	326,76
18	P5V0-02AG	u	Prova de servei per comprovar l'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, superfície d'entre 50 i 100 m2, mitjançant inundació de tota la superfície, inclòs desplaçament a obra i informe de resultats de prova realitzada. (P - 18)	185,00	1,000	185,00
19	B__6	u	Subministra i col·locació de balconera d'alumini anoditzat color RAL standanrd, amb interrupció del pont tèrmic, sistema Cor-3500 amb RPT de Cortizo® o similar, col·locades sobre premarc (inclòs), per un buit d'obra de 950x1800mm, 1 fulla practicable, U<1,92W/m2K, Ratr<32dBA, permeabilitat a l'aire: classe 3, vidre Climalit aïllant de dues llunes de seguretat i càmera, vidre baix emissiu gas argó 4+4/16/6 mm. Reomplert d'escuma de poliuretà entre el junt del marc amb el bastiment de base i segellats de silicona neutra. Ferratges, mecanismes necessaris, manetes del mateix color, tapetes interiors. Sense persiana. (P - 1)	950,00	1,000	950,00

TOTAL	Capítol	01.03	8.941,83
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	COBERTA AJUNTAMENT
------	----	--------------------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Capítol		04	GESTIO RESIDUS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R6-4I5O	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 12)	30,76	58,395	1.796,23
2	P2RA-EU2I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 13)	8,00	58,390	467,12
TOTAL		Capítol	01.04		2.263,35	
Obra		01	COBERTA AJUNTAMENT			
Capítol		05	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H00000SS	PA	Mesures i despeses de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra, redacció Pla de Seguretat i Salut, equips de protecció individual i proteccions col·lectives com proteccions de caigua en alçada tant verticals com horitzontals, proteccions, senyalitzacio, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució. Inclou la revisió i reposició dels elements en cada fase d'obra. (P - 5)	1.000,00	1,000	1.000,00
TOTAL		Capítol	01.05		1.000,00	
Obra		01	COBERTA AJUNTAMENT			
Capítol		06	IMPREVISTOS A JUSTIFICAR			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	IMP	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos que puguin apareixer durant l'execució de l'obra. (P - 6)	1.000,00	1,000	1.000,00
TOTAL		Capítol	01.06		1.000,00	

AMIDAMENTS

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bastida façana Sud		1,000	20,000		9,000	180,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

2	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bastida façana Sud (previsió 30 dies)		30,000	20,000		9,000	5.400,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.400,000	

3	DESMUN	pa	Treballs desmuntatge i tornar amuntar lames de proteccio solar existents a la terrassa de la façana sud per a muntatge i desmuntatge de bastida tubular.					
---	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lames proteccio solar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
Capítol 02 COBERTA INCLINADA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P214Q-4RPT	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vessant Sud		1,000	21,000	18,400		386,400	C#*D#*E#*F#
2	Claraboia		-1,000	3,600	4,000		-14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							372,000	

2	P52D-4V3B	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color Panache Foncé de Terreal o equivalent, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclòs part proporcional de carener.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vessant Sud		1,000	21,000	18,400		386,400	C#*D#*E#*F#
2	Claraboia		-1,000	3,600	4,000		-14,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							372,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Capítol 03 COBERTA NO TRANSITABLE

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO																																													
1	P214Q-4RPT	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Coberta existent (50 cm sobreample)</td><td></td><td>1,000</td><td>7,250</td><td>5,250</td><td></td><td>38,063</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>38,063</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Coberta existent (50 cm sobreample)		1,000	7,250	5,250		38,063	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							38,063																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Coberta existent (50 cm sobreample)		1,000	7,250	5,250		38,063	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							38,063																																									
2	P214Q-4RPP	m2	Enderroc solera encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Coberta existent (50 cm sobreample)</td><td></td><td>1,000</td><td>7,250</td><td>5,250</td><td></td><td>38,063</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>38,063</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Coberta existent (50 cm sobreample)		1,000	7,250	5,250		38,063	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							38,063																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Coberta existent (50 cm sobreample)		1,000	7,250	5,250		38,063	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							38,063																																									
3	P214O-4RNV	m2	Enderroc bigues autoportant formigo coberta, entrebigat de 60 cm d'intereix, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Coberta existent (50 cm sobreample)</td><td></td><td>1,000</td><td>7,250</td><td>5,250</td><td></td><td>38,063</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>38,063</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Coberta existent (50 cm sobreample)		1,000	7,250	5,250		38,063	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							38,063																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Coberta existent (50 cm sobreample)		1,000	7,250	5,250		38,063	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							38,063																																									
4	P4SA-MGVB	m2	Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Coberta existent fins paret mitgera</td><td></td><td>1,000</td><td>6,400</td><td>5,250</td><td></td><td>33,600</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>33,600</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Coberta existent fins paret mitgera		1,000	6,400	5,250		33,600	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							33,600																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Coberta existent fins paret mitgera		1,000	6,400	5,250		33,600	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							33,600																																									
5	P6125-7BK9	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Coberta plana</td><td></td><td>1,000</td><td>4,250</td><td></td><td>1,350</td><td>5,738</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>1,600</td><td></td><td>2,350</td><td>3,760</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>6,400</td><td></td><td>1,900</td><td>24,320</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>33,818</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Coberta plana		1,000	4,250		1,350	5,738	C#*D#*E#*F#	2			1,000	1,600		2,350	3,760	C#*D#*E#*F#	3			2,000	6,400		1,900	24,320	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							33,818	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Coberta plana		1,000	4,250		1,350	5,738	C#*D#*E#*F#																																								
2			1,000	1,600		2,350	3,760	C#*D#*E#*F#																																								
3			2,000	6,400		1,900	24,320	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							33,818																																									
6	P4FC-545G	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Obertura balconera</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Obertura balconera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1	Obertura balconera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																									
7	P811-3FFR	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat																																													

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana		1,000	4,250		1,350	5,738	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,600		2,350	3,760	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,400		1,900	24,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,818

- 8 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana		1,000	4,250		1,350	5,738	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,250		2,350	9,988	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,400		1,900	24,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,046

- 9 P8J9-H9BO m Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coronament parets perimetre coberta plana		1,000	4,250			4,250	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,600			1,600	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,400			12,800	C#*D#*E#*F#
4	Ampit balconera		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,650

- 10 P5Z15-4Z2W m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 8 cm de gruix mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable		1,000	6,100		3,950	24,095	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,095

- 11 P712-DXD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable		1,200	6,100		3,950	28,914	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,914

- 12 P7B1-6Q35 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable							
2	Sota aïllament		1,100	6,100		3,950	26,505	C#*D#*E#*F#
3	Sobre aïllament		1,100	6,100		3,950	26,505	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,010

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

- 13 P7C25-DBJB m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió ≥ 100 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m²·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable		1,000	6,100		3,950	24,095	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,095	

- 14 P510-38DR m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 6 cm de gruix, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable		1,000	6,100		3,950	24,095	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,095	

- 15 E5ZH4DQ4 u Bonera de PVC rígida de diàmetre 125 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou peça de reforç a desguàs bunera, compost per làmina betum modificat amb elastomer (LBM-30-FP) de 3,0 kg/m² amb armadura de filtre de polièster antipunxament, adherida al suport amb cola, per a tub PVC d-125 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 16 GDZ24121 ut Sobreixidor amb tub inoxidable de sortida de diàmetre 90 mm i 6 mm de gruix, longitud de volada 10-15 cm, acabat amb tall a cartabó i col·locat amb pendent, fixada amb adhesiu cimentós flexible i soldada a impermeabilització coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 17 PD18-8D4W m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0, incloses mitjans auxiliars per a muntatge, peces especials i fixacions a paret pati.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Baixant fins pati		1,000	12,000			12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

- 18 P5V0-02AG u Prova de servei per comprovar l'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, superfície d'entre 50 i 100 m², mitjançant inundació de tota la superfície, inclòs desplaçament a obra i informe de resultats de prova realitzada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana no transitable		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

- 19 B_6 u Subministra i col·locació de balconera d'alumini anoditzat color RAL standanrd, amb interrupció del pont tèrmic, sistema Cor-3500 amb RPT de Cortizo® o similar, col·locades sobre premarc (inclòs), per un buit d'obra de 950x1800mm, 1 fulla practicable, U<1,92W/m²K, Ratr<32dBA, permeabilitat a l'aire: classe 3, vidre Climait aïllant de dues llunes de seguretat i càmera, vidre baix emissiu gas argó 4+4/16/6 mm. Reomplert d'escuma de poliuretà entre el junt del marc amb el bastiment de base i segellats de silicona neutra. Ferratges, mecanismes necessaris, manetes del mateix color, tapetes interiors. Sense persiana.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Balconera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
Capítol 04 GESTIO RESIDUS

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P2R6-4I5O	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teules coberta inclinada		1,250	372,000		0,100	46,500	C#*D#*E#*F#
2	Teules zona nova coberta plana		1,250	38,060		0,100	4,758	C#*D#*E#*F#
3	Solera zona nova coberta plana		1,250	38,060		0,050	2,379	C#*D#*E#*F#
4	Biguetes zona nova cobert plana		1,250	38,060		0,100	4,758	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,395

2 P2RA-EU2I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Igual amidament transport		58,390				58,390	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,390

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	H00000SS	PA	Mesures i despeses de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra, redacció Pla de Seguretat i Salut, equips de protecció individual i proteccions col·lectives com proteccions de caiguda en alçada tant verticals com horitzontals, proteccions, senyalització, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució. Inclou la revisió i reposició dels elements en cada fase d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 COBERTA AJUNTAMENT
Capítol 06 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	IMP	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Imprevistos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	25,40000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	25,40000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	25,40000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,40000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,88000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	24,69000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	28,61000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	28,61000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	28,61000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	29,57000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	28,61000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	28,61000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	14,32000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	42,85000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	168,25000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,10000	€
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	1,70000	€
C1R1-00CX	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	18,70000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	2,04000	€
B038-05NU	t	Palet de riera 16 a 32 mm	21,95000	€
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	19,16000	€
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	19,58000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	21,01000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,32000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	145,42000	€
B056-06J5	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,16000	€
B06F2-I5H1	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	109,00000	€
B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	44,30000	€
B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	6,01000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	2,09000	€
B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,94000	€
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	15,55000	€
B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,22000	€
B0F1A-077V	u	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,15000	€
B0G2-H4Q1	m	Peça per a coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire	42,95000	€
B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,09000	€
B2RA-28UP	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	10,00000	€
B4F0-0L2K	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir	5,31000	€
B526-0XSM	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color Panache Foncé de Terreal, de 25 peces/m2, com a màxim	0,75000	€
B526-0XST	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color palla, de 20 peces/m2, com a màxim	1,18000	€
B712-FGNG	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2	7,71000	€
B7B1-0KPY	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2	1,23000	€
B7C25-183D	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2.857 i 2,581 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	9,50000	€
B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	19,97000	€
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	24,75000	€
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	1,09000	€
B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	4,91000	€
BAJ0-1WP1	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	175,00000	€
BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm	2,02000	€
BD1A-1NDI	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	7,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	7,99000 €
BDW3-FFAO	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,12000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25

Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		93,30000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,69000 =	27,15900	
			Subtotal:		27,15900	27,15900
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,10000 =	1,26000	
			Subtotal:		1,26000	1,26000
Materials						
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	19,58000 =	12,72700	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150 x	145,42000 =	21,81300	
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	2,04000 =	0,36720	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	19,16000 =	29,69800	
			Subtotal:		64,60520	64,60520
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27159
			COST DIRECTE			93,29579
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,29579
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		97,42000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	24,69000 =	24,69000	
			Subtotal:		24,69000	24,69000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,04000 =	0,40800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630 x	21,01000 =	34,24630	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	145,42000 =	36,35500	
			Subtotal:		71,00930	71,00930

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,24690
COST DIRECTE						97,41620
COST EXECUCIÓ MATERIAL						97,41620
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		217,34000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x 24,69000 =	25,92450	
			Subtotal:		25,92450	25,92450
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x 2,10000 =	1,52250	
			Subtotal:		1,52250	1,52250
Materials						
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x 0,32000 =	128,00000	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x 145,42000 =	29,08400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x 21,01000 =	32,14530	
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 2,04000 =	0,40800	
			Subtotal:		189,63730	189,63730
DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,25925
COST DIRECTE						217,34355
COST EXECUCIÓ MATERIAL						217,34355
WT23-FMEL	m3	Runa d'obra de fàbrica ceràmica de maó calat	Rend.: 1,000		0,00000	€
COST DIRECTE						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-1	B_6	u	Subministra i col·locació de balconera d'alumini anoditzat color RAL standanrd, amb interrupció del pont tèrmic, sistema Cor-3500 amb RPT de Cortizo® o similar, col·locades sobre premarc (inclòs), per un buit d'obra de 950x1800mm, 1 fulla practicable, U<1,92W/m2K, Ratr<32dBA, permeabilitat a l'aire: classe 3, vidre Climait aïllant de dues llunes de seguretat i càmera, vidre baix emissiu gas argó 4+4/16/6 mm. Reomplert d'escuma de poliuretà entre el junt del marc amb el bastiment de base i segellats de silicona neutra. Ferratges, mecanismes necessaris, manetes del mateix color, tapetes interiors. Sense persiana.	Rend.: 1,000		950,00 €
			COST DIRECTE			950,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			950,0000
	BUNERAIMPER	u	Subministra i col·locació de peça de reforç a desguàs bunera, compost per làmina betum modificat amb elastomer (LBM-30-FP) de 3,0 kg/m2 amb armadura de filtre de poliester antipunxonament, adherida al suport amb cola, per a tub PVC d-125 mm.	Rend.: 1,000		75,00 €
			COST DIRECTE			75,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,0000
P-2	DESMUN	pa	Treballs desmuntatge i tornar amuntar lames de proteccio solar existents a la terrassa de la façana sud per a muntatge i desmuntage de bastida tubular.	Rend.: 1,000		262,45 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000B	h	Oficial 1a	5,000 /R x	28,61000 =	143,05000
	A0D-0007	h	Manobre	5,000 /R x	23,88000 =	119,40000
			Subtotal:			262,45000
			COST DIRECTE			262,45000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			262,45000
P-3	E5ZH4DQ4	u	Bonera de PVC rigid de diàmetre 125 mm amb tapa antigraua metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou peça de reforç a desguàs bunera, compost per làmina betum modificat amb elastomer (LBM-30-FP) de 3,0 kg/m2 amb armadura de filtre de poliester antipunxonament, adherida al suport amb cola, per a tub PVC d-125 mm.	Rend.: 1,000		99,00 €
			COST DIRECTE			99,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	E8989140	m2	Pintat de parament vertical de ciment, interior o exterior, amb pintura plàstica sobre remolinat, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.	Rend.: 1,000		9,50	€
				COST DIRECTE		9,50000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,5000	
P-4	GDZ24121	ut	Sobreixidor amb tub inoxidable de sortida de diàmetre 90 mm i 6 mm de gruix, longitud de volada 10-15 cm, acabat amb tall a cartabó i col·locat amb pendent, fixada amb adhesiu cimentós flexible i soldada a impermeabilització coberta.	Rend.: 1,000		125,00	€
				COST DIRECTE		125,00000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		125,0000	
P-5	H00000SS	PA	Mesures i despeses de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra, redacció Pla de Seguretat i Salut, equips de protecció individual i proteccions col·lectives com proteccions de caiguda en alçada tant verticals com horitzontals, proteccions, senyalització, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut i les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució. Inclou la revisió i reposició dels elements en cada fase d'obra.	Rend.: 1,000		1.000,00	€
				COST DIRECTE		1.000,00000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.000,0000	
P-6	IMP	pa	Partida alçada a justificar per imprevistos que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra.	Rend.: 1,000		1.000,00	€
				COST DIRECTE		1.000,00000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.000,0000	
P-7	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	Rend.: 1,000		0,09	€
				Unitats		Preu	Parcial
Materials						Import	
	B0Y1-12V6	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçada <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes	1,000	x	0,09000 =	0,09000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	
			Subtotal:	0,0900000,09000
			COST DIRECTE	0,09000
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,09000
P-8	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	Rend.: 1,00010,30€
			UnitatsPreuParcialImport	
			Ma d'obra	
			A0F-000R h Oficial 1a muntador0,100 /R x 29,57000 = 2,95700	
			A01-FEPH h Ajudant muntador0,200 /R x 25,40000 = 5,08000	
			Subtotal:	8,037008,03700
			Maquinària	
			C154-003N h Camió per a transport de 7 t0,050 /R x 42,85000 = 2,14250	
			Subtotal:	2,142502,14250
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,12056
			COST DIRECTE	10,30006
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	10,30006
			P214K-CRMZ m2 Enderroc complet de coberta inclinada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,00013,33€
			UnitatsPreuParcialImport	
			Ma d'obra	
			A0D-0007 h Manobre0,550 /R x 23,88000 = 13,13400	
			Subtotal:	13,1340013,13400
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,19701
			COST DIRECTE	13,33101
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,33101

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	P214O-4RNV	m2	Enderroc bigues autoportant formigo coberta, entrebigat de 60 cm d'intereix, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000		11,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200 /R x	24,69000 =	4,93800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x	23,88000 =	4,77600	
				Subtotal:		9,71400	9,71400
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 /R x	14,32000 =	1,43200	
				Subtotal:		1,43200	1,43200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14571
				COST DIRECTE			11,29171
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,29171
	P214O-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		154,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	6,375 /R x	23,88000 =	152,23500	
				Subtotal:		152,23500	152,23500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,28353
				COST DIRECTE			154,51853
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,51853
P-10	P214Q-4RPP	m2	Enderroc solera encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		9,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	23,88000 =	9,55200	
				Subtotal:		9,55200	9,55200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14328
				COST DIRECTE			9,69528
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,69528

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-11	P214Q-4RPT	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		12,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 /R x	28,61000 =	2,86100	
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	23,88000 =	9,55200	
				Subtotal:		12,41300	12,41300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18620
				COST DIRECTE			12,59920
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,59920
P-12	P2R6-4I5O	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	Rend.: 1,000		30,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x	23,88000 =	11,94000	
				Subtotal:		11,94000	11,94000
Maquinària							
	C1R1-00CX	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000 /R x	18,70000 =	18,70000	
				Subtotal:		18,70000	18,70000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,11940
				COST DIRECTE			30,75940
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,75940
P-13	P2RA-EU2I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		8,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28UP	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800 x	10,00000 =	8,00000	
				Subtotal:		8,00000	8,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			8,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,00000	
P45C1-10CIS	m3		Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000		136,16	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0D-0007	h		Manobre	0,248 /R x	23,88000 =	5,92224	
A0F-000T	h		Oficial 1a paleta	0,05391 /R x	28,61000 =	1,54237	
			Subtotal:			7,46461	7,46461
Maquinària							
C172-003J	h		Camió amb bomba de formigonar	0,103 /R x	168,25000 =	17,32975	
			Subtotal:			17,32975	17,32975
Materials							
B06F2-I5H1	m3		Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020 x	109,00000 =	111,18000	
			Subtotal:			111,18000	111,18000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,18662	
			COST DIRECTE			136,16098	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,16098	
P4BJ-D9Q2	m2		Armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		3,34	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0F-000I	h		Oficial 1a ferrallista	0,018 /R x	28,61000 =	0,51498	
A01-FEP0	h		Ajudant ferrallista	0,018 /R x	25,40000 =	0,45720	
			Subtotal:			0,97218	0,97218
Materials							
B0B8-107X	m2		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200 x	1,94000 =	2,32800	
B0AM-078F	kg		Filferro recuit 1,3 mm	0,012 x	2,09000 =	0,02508	
			Subtotal:			2,35308	2,35308

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,01458
			COST DIRECTE	3,33984
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,33984

P-14	P4FC-545G	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000	34,65	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	23,88000	=	11,94000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	28,61000	=	14,30500	
						Subtotal:		26,24500	26,24500
Materials									
	B4F0-0L2K	u	Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir	1,000	x	5,31000	=	5,31000	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01007	x	15,55000	=	0,15659	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0105	x	217,34355	=	2,28211	
						Subtotal:		7,74870	7,74870
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %			0,65613
			COST DIRECTE						34,64983
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						34,64983

P-15	P4SA-MGVB	m2	Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000	11,83	€
-------------	------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
	P214O-4RO	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,001	x	154,51853	=	0,15452	
	P45C1-10CI	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	0,060	x	136,16098	=	8,16966	
	P4BJ-D9Q2	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,050	x	3,33984	=	3,50683	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		11,83101	11,83101
				COST DIRECTE			11,83101
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,83101
P-16	P510-38DR	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm, de 6 cm de gruix, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000		7,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,050 /R x	28,61000 =	1,43050	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	23,88000 =	3,58200	
				Subtotal:		5,01250	5,01250
Materials							
	B038-05NU	t	Palet de riera 16 a 32 mm	0,120 x	21,95000 =	2,63400	
				Subtotal:		2,63400	2,63400
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07519
				COST DIRECTE			7,72169
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,72169
P-17	P52D-4V3B	m2	Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color Panache Foncé de Terreal o equivalent, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10. Inclòs part proporcional de carener.	Rend.: 1,000		58,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,800 /R x	28,61000 =	22,88800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x	23,88000 =	9,55200	
				Subtotal:		32,44000	32,44000
Materials							
	B526-0XSM	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color Panache Foncé de Terreal, de 25 peces/m2, com a màxim	25,000 x	0,75000 =	18,75000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030 x	217,34355 =	6,52031	
				Subtotal:		25,27031	25,27031

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,81100
				COST DIRECTE			58,52131
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,52131
P52D-4V5K	m2		Teulada de teula àrab manual de ceràmica color palla, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10	Rend.: 1,000		62,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,780 /R x	28,61000 =	22,31580	
	A0D-0007	h	Manobre	0,390 /R x	23,88000 =	9,31320	
				Subtotal:		31,62900	31,62900
Materials							
	B526-0XST	u	Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color palla, de 20 peces/m2, com a màxim	22,000 x	1,18000 =	25,96000	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01995 x	217,34355 =	4,33600	
				Subtotal:		30,29600	30,29600
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,79073
				COST DIRECTE			62,71573
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,71573
P-18	P5V0-02AG	u	Prova de servei per comprovar l'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, superfície d'entre 50 i 100 m2, mitjançant inundació de tota la superfície, inclòs desplaçament a obra i informe de resultats de prova realitzada.	Rend.: 1,000		185,00	€
				COST DIRECTE			185,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			185,00000
P5Z10-55YP	m2		Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid	Rend.: 1,000		29,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,240 /R x	23,88000 =	5,73120	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,480 /R x	28,61000 =	13,73280	
				Subtotal:		19,46400	19,46400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0F13-0LM8	u	Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	18,720	x	0,22000	=	4,11840
	B056-06J5	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	1,575	x	0,16000	=	0,25200
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,02625	x	217,34355	=	5,70527
				Subtotal:				10,07567
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,29196
				COST DIRECTE				29,83163
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,83163
P-19	P5Z15-4Z2W	m2	Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 8 cm de gruix mitjà	Rend.: 1,000				12,79 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	28,61000	=	2,86100
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x	23,88000	=	2,38800
				Subtotal:				5,24900
Materials								
	B06D-0L90	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,080	x	93,29579	=	7,46366
				Subtotal:				7,46366
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,07874
				COST DIRECTE				12,79140
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,79140
P-20	P6125-7BK9	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.	Rend.: 1,000				43,29 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,700	/R x	28,61000	=	20,02700
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250	/R x	24,69000	=	6,17250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	23,88000	=	8,35800
						Subtotal:		34,55750
								34,55750
Maquinària								
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,200	/R x	1,70000	=	0,34000
						Subtotal:		0,34000
								0,34000
Materials								
	B07L-1PYA	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,05751	x	44,30000	=	2,54769
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0136	x	2,04000	=	0,02774
	B0F1A-077V	u	Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	33,0303	x	0,15000	=	4,95455
						Subtotal:		7,52998
								7,52998
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,86394
			COST DIRECTE					43,29142
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					43,29142
P-21	P712-DXD5	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació	Rend.: 1,000				26,35 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	28,61000	=	11,44400
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	25,40000	=	5,08000
						Subtotal:		16,52400
								16,52400
Materials								
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,300	x	1,09000	=	0,32700
	B712-FGNG	m2	Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2	1,200	x	7,71000	=	9,25200
						Subtotal:		9,57900
								9,57900
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,24786
			COST DIRECTE					26,35086
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					26,35086

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-22	P7B1-6Q35	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000		3,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040 /R x	28,61000 =	1,14440	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020 /R x	25,40000 =	0,50800	
				Subtotal:		1,65240	1,65240
Materials							
	B7B1-0KPY	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2	1,100 x	1,23000 =	1,35300	
				Subtotal:		1,35300	1,35300
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02479
				COST DIRECTE			3,03019
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,03019
P-23	P7C25-DBJB	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2.857 i 2,581 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica.	Rend.: 1,000		16,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x	28,61000 =	2,86100	
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	23,88000 =	1,19400	
				Subtotal:		4,05500	4,05500
Materials							
	B7C25-183D	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 2.857 i 2,581 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat	1,050 x	9,50000 =	9,97500	
	B090-06VV	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	0,350 x	6,01000 =	2,10350	
				Subtotal:		12,07850	12,07850
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06083
				COST DIRECTE			16,19433
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,19433

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-24	P811-3FFR	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat	Rend.: 1,000		24,34	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x	28,61000 =	14,30500	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	23,88000 =	7,16400	
				Subtotal:		21,46900	21,46900
Materials							
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,024 x	97,41620 =	2,33799	
				Subtotal:		2,33799	2,33799
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,53673
				COST DIRECTE			24,34372
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,34372
P-25	P89H-4V6W	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	Rend.: 1,000		9,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,120 /R x	28,61000 =	3,43320	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050 /R x	25,40000 =	1,27000	
				Subtotal:		4,70320	4,70320
Materials							
	B896-HYBR	kg	Pintura plàstica, per a exteriors	1,000 x	4,91000 =	4,91000	
				Subtotal:		4,91000	4,91000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07055
				COST DIRECTE			9,68375
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,68375
P-26	P8J9-H9BO	m	Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		54,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250 /R x	28,61000 =	7,15250	
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	23,88000 =	2,38800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/02/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		9,54050		9,54050
Materials								
	B0G2-H4Q1	m	Peça per a coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire	1,020	x	42,95000	=	43,80900
	B07F-OLT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003	x	217,34355	=	0,65203
				Subtotal:		44,46103		44,46103
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,14311
				COST DIRECTE				54,14464
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,14464
	PAJ0-80KW	u	Balconera de PVC color imitacio fusta, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 95x200 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.	Rend.: 1,000		469,79		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	29,57000	=	59,14000
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	25,40000	=	50,80000
				Subtotal:		109,94000		109,94000
Materials								
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x	24,75000	=	3,21750
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370	x	19,97000	=	7,38890
	BAJ0-1WPI	m2	Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,980	x	175,00000	=	346,50000
				Subtotal:		357,10640		357,10640
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	2,74850
				COST DIRECTE				469,79490
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				469,79490

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-27	PD18-8D4W	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0, incloses mitjans auxiliars per a muntatge, peces especials i fixacions a paret pati.	Rend.: 1,000		27,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150 /R x	25,40000 =	3,81000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,350 /R x	28,61000 =	10,01350	
				Subtotal:		13,82350	13,82350
Materials							
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	1,000 x	0,12000 =	0,12000	
	BDW3-FFAJ	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	0,300 x	7,99000 =	2,39700	
	BD1A-1NDI	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250 x	7,74000 =	9,67500	
	BD11-0MDG	u	Brida per a tub de PVC entre 125 i 160 mm	0,500 x	2,02000 =	1,01000	
				Subtotal:		13,20200	13,20200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,20735
				COST DIRECTE			27,23285
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,23285

1. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Les obres comprenen els treballs necessaris per tal d'aconseguir portar a terme les actuacions a coberta a l'edifici de l'Ajuntament per a instal·lació fotovoltaica, situada al Carrer de la Font, nº10 al municipi de Tona.

1.2. OBJECTE

El present **Estudi Bàsic de Seguretat i Salut** té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest contracte, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra pública en el seu article 18.3.h).

D'aquesta manera, s'integra en el Contracte, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se en fase d'Execució, amb antelació al inici de les obres, per a la seva.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR :

Promotor: Ajuntament de Tona
CIF: P-0828300-D
Carrer de la Font, nº10
08551 - Tona

3. AUTOR DE L'ESTUDI BASICDE SEGURETAT I SALUT:

Tècnic : Serveis Tècnics Ajuntament de Tona

4. DADES DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA

4.1. Redacció:

Serveis Tècnics Ajuntament de Tona

4.2. Tipologia de l'obra:

Actuacions a coberta edifici Ajuntament per a instal·lació fotovoltaica

4.3. Situació:

Carrer de la Font, nº 10

4.4. Comunicacions:

Terme municipal de Tona, espais oberts i ben comunicats per vies rodades.

4.5. Subministrament i Serveis :

No calen

4.6. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d'Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut, és de **42.264,27 €**

4.7. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és **6 setmanes**.

4.8. Mà d'obra prevista

L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 4 persones.

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Oficial 1a
Manobre
Manobre especialista
Maquinista

4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

Enderrocs i desmuntatges
Coberta inclinada teules Coberta
plana no transitable graves

4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra

Manipulador telescòpic auto propulsat
Camió de transport 7 tones
Camió grua

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- | | | |
|------|---|-----------------------|
| 5.1. | Instal·lació elèctrica provisional d'obra : | Existent a l'edifici. |
| 5.2. | Instal·lació d'aigua provisional d'obra: | Existent a l'edifici. |
| 5.3. | Instal·lació de sanejament: | Existent a l'edifici. |

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents:

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats.

S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir d'aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està transvasant.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplec, emmagatzematges o concentració d'embalatges o devessalls, s'han de completar els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Es disposarà d'extintors manuals que es col·locaran de forma accessible.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Al ser equips itinerants, no hi ha cap local per al personal.

- | | | |
|------|------------------------------------|----------------------|
| 6.1. | Serveis higiènics : | No estan contemplats |
| 6.2. | Vestuaris: | No estan contemplats |
| 6.3. | Menjador: | No esta contemplat |
| 6.4. | Local de descans: | No esta contemplat |
| 6.5. | Local d'assistència a accidentats: | No esta contemplat |

7. ÀREES AUXILIARS

- | | | |
|------|------------------------|---------------------------------|
| 7.1. | Centrals i plantes : | No estan contemplats |
| 7.2. | Tallers: | No estan contemplats |
| 7.3. | Apilament de material: | No hi ha apilament de material. |

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material de l'obra i/o l'enderroc.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

9. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l'obra: Es senyalitzarà i protegirà l'àmbit dels treballs segons els tipus d'actuació.

Situació de casetes i contenidors: No estan contemplades.

- 10.1. Serveis afectats: No estan contemplats per tractar-se de treballs en superfície.
- 10.2. Servituds: No estan contemplades per tractar-se de treballs a l'espai públic.
- 10.3. Característiques meteorològiques: No hi ha menció especial de cap dada.
- 10.4. Característiques del terreny: No es creu necessari.
- 10.5. Característiques de l'entorn : Treballs a la via pública amb influència sobre trànsit i vianants.

10. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS I DESMUNTATGES

Desmuntatge i retirada de coberta inclinada de teules

COBERTA

Coberta plana no transitable graves

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient al inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de cada una d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre).

11.1. Procediments d'execució

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execució, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

11.2. Ordre d'execució dels treballs

Els treballs es realitzaran segons s'indiqui al Plec de Prescripcions Tècniques.

El Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents talls de l'obra, s'han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D'ACTIVITATS :

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA :

Relació d'unitats d'obra.

Prelació temporal de realització material d'unes unitats respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS :

Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de cadascuna de les unitats d'obra.

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Constructiu i en el present Estudi bàsic de Seguretat i Salut.

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) "Reglas generales de seguridad para máquinas" (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL

13.1. Agents atmosfèrics: En cas de pluja o fred extrem els treballs no es poden executar.

13.2. Il·luminació: No es contempla llum artificial.

13.3. Soroll: Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reproduceix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor		82-94 dB
Martell pneumàtic (a l'aire lliure)		94 dB
Esmeriladora de peu		60-75 dB
Camions i dúmpers		80 dB
Martell perforador		110 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.

2on.- Aïllament de la part sonora.

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelles.

13.4. Pols: La d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

- Rinitis
- Asma bronquial
- Bronquitis destructiva
- Bronquitis crònica
- Efisemes pulmonars

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d'exposició.

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O₂) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi bàsic de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituitària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

- Escombrat i neteja de locals
- Manutenció de runes
- Demolicions
- Treballs de perforació
- Manipulació de ciment
- Esmerilat de materials
- Circulació de vehicles
- Polit de paraments

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT	MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals	Ús d'aspiradora i regat previ
Manutenció de runes	Regat previ
Demolicions	Regat previ
Treballs de perforació	Captació localitzada en carros perforadors o injecció d'aigua
Manipulació de ciment	Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Circulació de vehicles	Regat de pistes

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

13.5. Ordre i neteja: El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

- 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
- 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament.
- 3er.- Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d'obra.
- 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització.
- 5è.- Neteja de claus i restes de material d'encofrat.
- 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
- 7è.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
- 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
- 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja.
- 10è.- Manteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja.
- 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents a l'operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

13.6. Radiacions no ionitzants: No estan contemplades.

13.7. Radiacions ionitzants: No estan contemplats.

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza".

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d'apilats estratificats, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
- En el maneigament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla.
- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

- Automatització i mecanització dels processos.
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. Adoptar mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
- Utilització d'ajudes mecàniques.
- Reducció o disseny de la càrrega.
- Actuació sobre l'organització del treball.
- Millora de l'entorn de treball.
- Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
- Ús correcte de les ajudes mecàniques.
- Ús correcte dels equips de protecció individual.
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
- Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

- 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc d'accident derivat de dita activitat.
- 2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells.
- 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
- 4art.- Ecurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
- 5è.- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant contenidors o palets, en lloc de portar-los d'un en un.
- 6è.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traguin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avanç de la producció.
- 7è.- Mantenir esclerits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Maneigament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l'elevació manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comproment-se a seguir els següents passos:

- 1er.- Apropiar-se el més possible a la càrrega.
- 2on.- Assentar els peus fermament.
- 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
- 4art.- Mantenir l'esquena dreta.
- 5è.- Subjectar l'objecte fermament.

- 6è.- L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames.
- 7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
- 8è.- Per al maneigament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius:
- a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla.
 - b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
 - c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla.
 - d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat.
- 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
- 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manteniment. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
- 11è.- És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip.

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d'ús.

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propí o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució.

Al magatzem del Contractista hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.

g) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterrànies.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut.

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic.

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que:

11. Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista.
15. Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència.
La implantació de la senyalització i abalisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi bàsic de Seguretat i Salut i s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc..., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà els cartells que indiqui l'informe d'OVP, la Guàrdia Urbana i/o els Serveis Tècnics, amb antelació a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a qui correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

20.1. Normes de Policia

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés en general que garanteixi l'accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a l'àmbit, i haurà d'assegurar que les entrades estiguin senyalitzades.

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal·lacions d'ús comú o particular.

20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el R.D. 1627/97.

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

Es realitzaran els tancaments dels espais, de forma que els vehicles i vianants tinguin recorreguts alternatius viables i senzills, totalment senyalitzats.

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

El personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions, avisant als vianants i vehicles dels desviaments a fi d'evitar accidents.

20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

El personal responsable de l'obra s'encarregarà de mantenir net l'àmbit dels treballs i de la recollida i retirada dels residus produïts a conseqüència dels treballs.

L'horari habitual dels treballs serà en dies feiners entre les 8,00 i les 20,00 hores, excepte actuacions especials que requereixen treballs nocturns.

En els treballs en horari nocturn, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l'Ajuntament.

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. Es respectaran les següents dimensions mínimes:

- En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent.
- L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats si es necessari.

S'utilitzarà material reflectant per a la senyalització vertical, horitzontal i elements d'abalisament.

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d'ubicació d'elements d'abalisament i defensa:

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra.
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
- Per impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l'obstacle de les obres.
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc..., la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents.

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD – 2. Els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

- Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m.
- En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,5 m

de diàmetre.

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
- La senyalització, l'abalisament, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Acabada l'obra es retiraran immediatament tots els senyals, dispositius i abalisament implantats.

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements existents a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llinar.

Mentre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

21.1. Riscos de danys a tercers

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

- Caiguda al mateix nivell.
- Atropellaments.
- Caiguda d'objectes.

21.2. Mesures de protecció a tercers

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran les mesures de protecció adients per a cobrir el risc de les persones i vehicles que transiten pels voltants de l'obra:

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

- Incendi, explosió i/o deflagració.
- Inundació.
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d'Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

- 1.- Ordre i neteja general.
- 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
- 3.- Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors.
- 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
- 5.- Punts de trobada.
- 6.- Assistència Primers Auxilis.

23. UNITATS CONSTRUCTIVES

DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ
RELACIÓ DE RISCOS
NORMES DE SEGURETAT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ
RELACIÓ D'QUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

ENDERROCS I DESMUNTAGES

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Caiguda d'objectes per desplom.
Caiguda d'objectes per manipulació.
Caiguda d'objectes.
Cops contra objectes immòbils.
Cops amb elements mòbils de les màquines.
Cops amb objectes o eines.

COBERTES

Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d'objectes per desplom.
Caiguda d'objectes per manipulació.
Caiguda contra objectes per manipulació.
Cops per objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.
Atrapament per o entre objectes.
Sobreesforços.
Contactes elèctrics.
Inhalació o ingestió de substàncies càustiques
Manipulació de materials abrasius.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL.

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Línia de vida

Fitxa tècnica:

Com a mitja de seguretat per evitar caigudes durant l'execució dels treballs, es preveu la utilització de una línia de vida.

Una vegada instal·lada a l'obra, abans de la seva utilització, serà examinada i provada amb vista a la verificació de les seves característiques i a la seguretat del treball.

Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquesta sigui objecte de trasllat, modificacions o reparacions de importància.

a) Instal·lació línia de vida.

Es important que les persones que vagin a utilitzar la línia de vida, comprenguin els conceptes tècnics necessaris per a l'instal·lació. Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, la majoria de fabricants treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la instal·lació del sistema.

L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació:

1- Dades de l'instal·lador:

- Document acreditatiu on s'acrediti que és instal·lador homologat.
- Assegurança de responsabilitat civil.

2- Certificació del sistema:

- Declaració de conformitat dels components del sistema

3- Utilització:

- Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada.
- Guardar sota clau els dispositius de desplaçament
- Portar un sistema de registre d'accessos

4- Manteniment del sistema:

La línia de vida s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que segueixi complint amb els requisits tècnics i de seguretat que exigeix la normativa.

Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui el mateix instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge.

S'haurà de documentar els resultats de les comprovacions.

Equips de protecció individual


Relació de EPI's necessaris:

- Casc de seguretat
- Arnés de seguretat i altres dispositius del sistema (connectors, absorbidors d'energia, ...)
- Guants de cuir
- Roba de treball

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l'obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal de perill indefinit.
- Senyal de perill d'obres.
- Senyal de limitació de velocitat.
- Senyal de prohibit avançar.
- Senyal de final de prohibició.
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
- Abalisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna.



Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d'advertència de risc elèctric.
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
- Senyal de protecció obligatòria del cap.
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda.
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.
- Senyal de protecció obligatòria de les mans.
- Senyal de protecció obligatòria de la cara.
- Senyal de protecció obligatòria del cos.



Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l'obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

ÍNDEX

PROCEDIMENTS DE SEGURETAT I AVALUACIÓ DE RISCOS

1. INTRODUCCIÓ	6
1.1. Definició	
1.2. Objectiu	
2. CLASSIFICACIÓ I UTILITZACIÓ	7
3. ELEMENTS PRINCIPALS	8
4. COMPLIMENT DE NORMATIVA I CERTIFICAT DE PRODUCTE	9
4.1. Llei de Prevenció de riscos Laborals	
4.2. Reials decrets	
4.3. Normes Específiques per a Bastides de Façana	
5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ	11
5.1. Normes de seguretat en el muntatge	
5.2. Normes de seguretat durant l'ús de les bastides	
5.3. Normes de seguretat durant el desmuntatge de les bastides	
6. PROTECCIONS INDIVIDUALS	
6.1. Introducció	
6.2. Equips de protecció individual	
7. SENYALITZACIÓ	
7.1. Seguretat laboral	
7.2. Seguretat viària	
7.3. Seguretat per als vianants	
8. RISCOS I FACTORS DE RISCOS	
8.1. Introducció	
8.2. Riscos i causes	

MANUAL D'INSTRUCCIONS I MANTENIMENT	24
--	-----------

1. DESTÍ I ÚS DE LA BASTIDA	25
2. MUNTATGE DE LA BASTIDA	26
2.1. Procediment previ	
a) Presa de dades	
b) Seguretat, protecció col·lectiva	
2.2. Equip de muntatge	
a) Personal	
b) Mecanització	
c) Seguretat	
2.3. Instruccions generals per al muntatge	
a) Descripció del sistema	
b) Procés de muntatge de la bastida	
2.4. Consideracions finals	
3. MANTENIMENT DE LA BASTIDA I ELS SEUS ELEMENTS	40

Procediments de seguretat i avaluació de riscos

1. Introducció

La caiguda de persones des d'una altura, així com també de materials i objectes, representa el perill més greu en la indústria de la construcció. Les caigudes causen una gran proporció de morts. Moltes es produeixen des de llocs de treball insegurs, o des de mitjans d'accés insegurs als llocs de treball. Aquest apartat té per objecte encarar el problema.

1.1. Definició:

La bastida pot definir-se com una estructura provisoria que sosté una o més plataformes i s'utilitza com a lloc de treball o per emmagatzemar materials en qualsevol tipus d'obra de construcció, inclusivament en treballs de manteniment i demolició. Quan el treball no pot realitzar-se en condicions de seguretat des del sòl o des de l'edifici o estructura, ha de disposar-se sempre d'una bastida adequada. S'ha de muntar correctament amb materials sòlids que tinguin la resistència necessària per oferir simultàniament als obrers mitjans d'accés i llocs de treball igualment segurs. Només persones competents hauran d'encarregar-se de muntar, modificar o desmantellar bastides, sota supervisió.

Les bastides utilitzades tindran que ser capaces de suportar el pes i les tensions que treballadors i processos que hauran d'exercir sobre ella; que tingui un ancoratge segur i estable, i que estigui dissenyada per prevenir la caiguda d'obres i materials.



1.2. Objectiu:

Aquest apartat contempla els diferents aspectes de seguretat relacionats amb el seu muntatge, utilització i desmuntatge.

A més, es contemplen les mesures necessàries per protegir dels riscos a terceres persones o béns aliens a l'obra; no s'ha d'oblidar que aquest tipus de bastides es troba majoritàriament en la via pública ocupant voreres o fins i tot la calçada destinada a la circulació de vehicles.

L'objectiu és la prevenció dels diferents riscos laborals associats al muntatge, ús i desmuntatge de les bastides fixes perimetrals així com els que puguin afectar a tercers; per a això, s'indiquen els factors de risc i les causes que els generen i les mesures de prevenció i protecció més idònies.

2. Classificació i utilització

Aquestes bastides es classifiquen en sis classes tenint en compte les càrregues que hagin de suportar les plataformes de treball, ja siguin uniformement repartides o concentrades en una superfície determinada.

Classificació de bastides en funció de la càrrega a suportar

Classe	Càrrega uniformement repartida		Càrrega concentrada en una $S = 500 \text{ mm}^2$	
	kN/m^2	kg/m^2	kN	kg
1	0,75	75	1,50	150
2	1,50	150	1,50	150
3	2,00	200	1,50	150
4	3,00	300	3,00	300
5	4,50	450	3,00	300
6	6,00	600	3,00	300

Tant les plataformes com els seus corresponents suports han de ser capaços de resistir les càrregues especificades en la taula.


En funció de la classificació donada les bastides de classe 1, 2 i 3 s'utilitzen per a treballs de neteja, pintura, fusteria, revestiments de façanes, sanejaments i en la indústria en general per a treballs diversos en altura.

Les bastides de classe 4, 5 i 6 són bastides de protecció, encara que també s'utilitzen per a treballs en formigó o en murs, rehabilitació de façanes, construccions industrials i en altres casos que exigeixin una bastida ampla de gran capacitat de càrrega.



3. Elements principaux

Elements bàsics del sistema

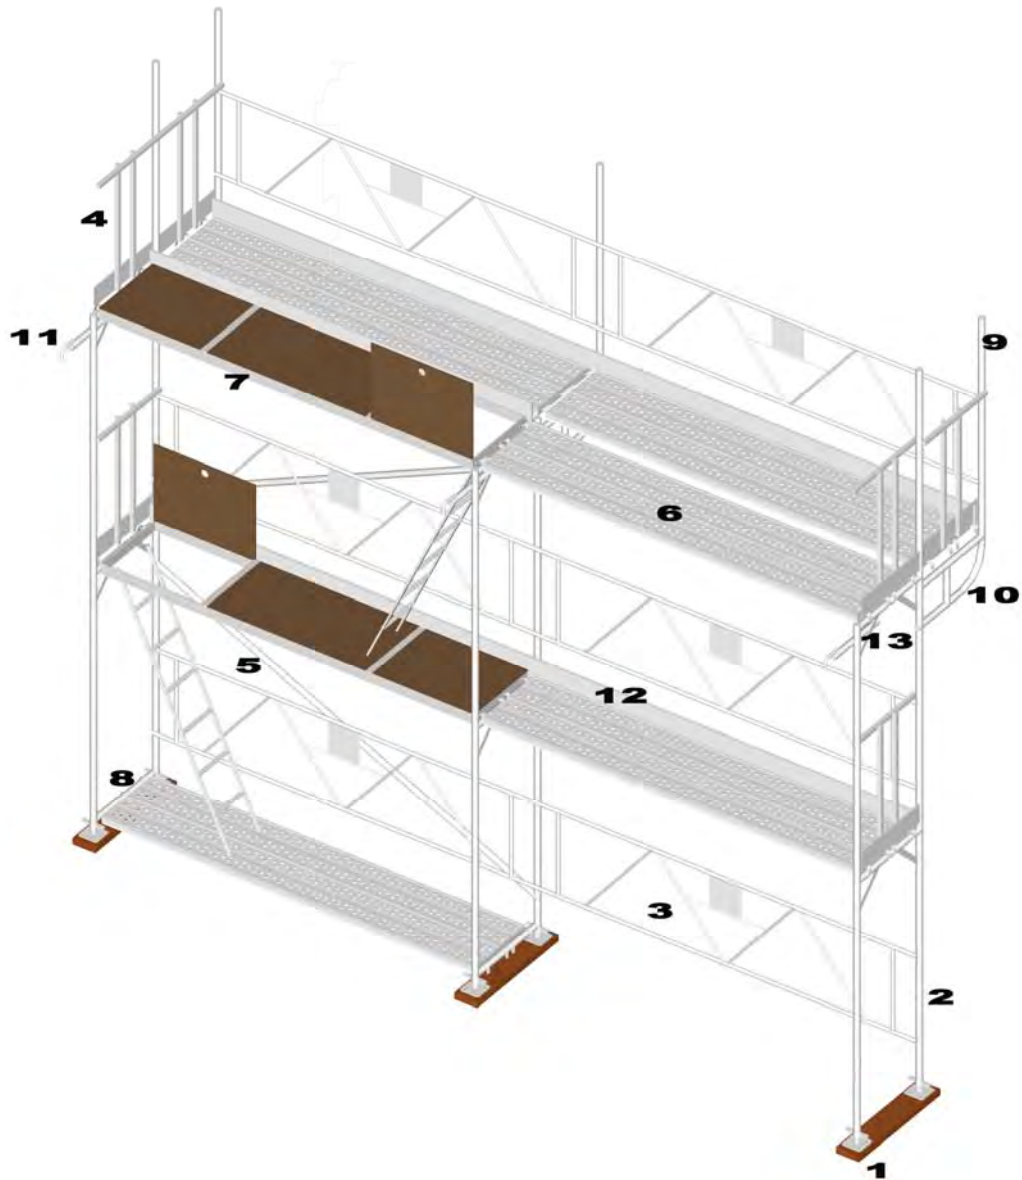

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Husillo regulable | 8. Barrot regulable doble abraçadora |
| 2. Pòrtic | 9. Peu tancament superior |
| 3. Barana doble | 10. Volada |
| 4. Barana lateral amb roda peu | 11. Tub d'amarratge |
| 5. Diagonal | 12. Roda peu |
| 6. Plataforma metàl·lica 30 cm | 13. Abraçadora fixa de cargol |

4. Compliment de normativa i certificat de producte

4.1. Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Dins de l'àmbit del muntatge, desmuntatge i ús de bastides és d'obligat compliment la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. S'ha de realitzar el pertinent pla d'avaluació i prevenció de riscos amb les corresponents mesures preventives a adoptar per a cada lloc de treball.

4.2. Reials decrets

Dins de l'àmbit del muntatge, desmuntatge i ús de bastides són aplicables i d'obligat compliment els següents Reials decrets:

Reial decret 1627/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Reial decret 485/1997, Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Reial decret 1215/1997, S'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Reial decret 2177/2004, S'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.

Reial decret 1627/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Normes contingudes en els reglaments del règim interior de les empreses i normes dictades pels comitès de seguretat i salut per convenis col·lectius.

4.3. Normes Específiques per a Bastides de Façana

Tota bastida ha de complir amb les següents Normes Específiques per a Bastides de Façana de components prefabricats.

UNE-EN 12810-1:2005, Bastides de façana de components prefabricats. Parteix 1: Especificacions dels productes.

UNE-EN 12810-2:2005, Bastides de façana de components prefabricats. Parteix 2: Mètodes particulars de disseny estructural.

UNE-EN 12811-1:2005, Equipament per a treballs temporals d'obra. Parteix 1: Bastides. Requisits de comportament i disseny general.

UNE-EN 12811-2:2005, Equipament per a treballs temporals d'obra. Parteix 2: Informació sobre els materials.

UNE-EN 12811-3:2005, Equipament per a treballs temporals d'obra. Parteix 3: Assaig de càrrega.

5. Mesures de prevenció i protecció

Els riscos de caiguda d'altura i/o ensorrament de la pròpia estructura s'han de prevenir mitjançant un conjunt de mesures que van des d'un muntatge correcte de la bastida, utilització de materials adequat, instal·lació de proteccions laterals, ús segur del mateix, etc.

Les bastides hauran de projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment.

Mai efectuarà treballs sobre bastides un sol operari, sempre hi haurà un altre fora de la bastida que controli els treballs per poder ajudar en cas d'accident.

5.1. Normes de seguretat en el muntatge

Normes prèvies al muntatge

S'ha d'adequar el tipus de bastida al treball que es va a realitzar havent de tenir les dimensions apropiades per accedir a tots els punts de treball. En cap cas s'utilitzaran elements de models o fabricants diferents.

Els materials utilitzats han de ser de bona qualitat i en bon estat.

Els tubs metàl·lics no han d'haver estat utilitzats per a altres comeses o estar deteriorats per l'oxidació o corrosió.

El muntatge i desmuntatge segur de les bastides els han de fer persones especialitzades sota una adreça tècnica; s'ha de seguir una seqüència d'operacions de les quals descrivim les més importants corresponents al muntatge. Les referents al desmuntatge són bàsicament les inverses.

Els operaris de muntatge o desmuntatge així com els que vagin a treballar en la bastida muntada hauran d'utilitzar els elements de protecció individual que s'indiquen en l'apartat corresponent.

Es penjaran cables de seguretat ancorats en "punts forts" de l'estructura en els quals s'amarra el fixador del cinturó de seguretat, necessari per a la permanència o pas per les bastides.

No s'ha d'iniciar el muntatge d'un nivell sense haver acabat l'anterior i en cap cas s'admetrà un muntatge incomplet o que se suprimeixi algun component del mateix. S'han d'utilitzar mecanismes d'elevació o descens convenientment fixats a l'estructura i verificats. En el cas d'utilitzar cordes, el seu diàmetre estarà comprès entre els 18 i 20 mm.


Està totalment prohibit llançar des de qualsevol altura els diferents elements que componen la bastida.

Peus rosca

Les bastides han de muntar-se sobre una superfície plana i compactada o en defecte d'això sobre taulons de repartiment o dorments i ha d'estar clavat a la base de suport de la bastida.


No s'ha de permetre el suport sobre maons, revoltons, etc.;

En terrenys amb pendent s'ha d'encunyar el suport amb prismes de fusta resistent entre la placa de suport i el dorments.



Marc

Descripció i dimensions dels marcs verticals Els marcs són els elements bàsics per a la sustentació dels diferents pisos de la bastida ja que transmeten les càrregues verticals; estan composts per travessers i muntants reforçats en les seves respectives cantonades per cartel·les o tirants.

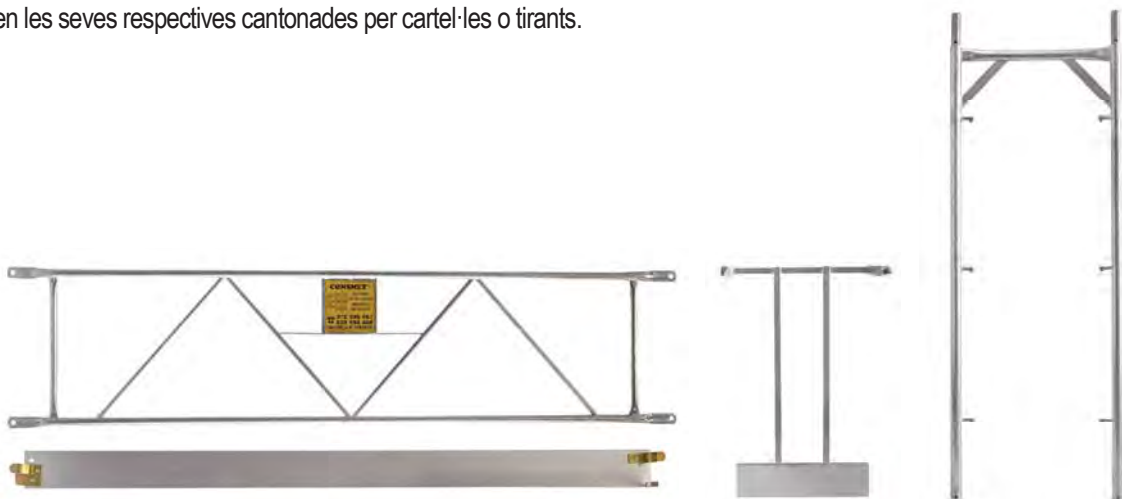

Proteccions perimetrals mitjançant baranes de seguretat i roda peus

Les plataformes de treball, situades a 2 o més metres d'altura, tindran baranes perimetrals completes d'1 m d'altura.

Les baranes s'han d'instal·lar en els costats de la plataforma amb el risc de caiguda al buit, excepte en els costats del parament sempre que la bastida estigui situat com a màxim a 300 mm del mateix; en cas contrari s'han d'instal·lar les proteccions descrites.

La protecció perimetral està composta per un passamans tubular, una barra intermèdia i un roda peu.

Els diferents elements no han de ser estresses, únicament en el cas per una acció directa intencionada. Els roda peus han d'instal·lar-se també, en tot el perímetre de cada nivell, inclosos els laterals.



Barana addicional de muntatge




És una barana amb funcions de 'quitamiedos' per a la seguretat en el muntatge de la bastida. Esta formada per suports verticals que van ancorats al pòrtic i dues baranes telescòpiques. Quan es finalitza un pis, s'instal·len des del mateix pis les baranes addicionals de muntatge al pis superior. D'aquesta manera, quan l'operari accedeix al pis superior ja existeix un 'quitamiedos'. L'operari ha d'utilitzar l'arnés de seguretat.

Plataformes

Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides hauran de construir-se, protegir-se i utilitzar-se de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. A tal efecte, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.

Les plataformes de treball tindran 60 cm d'amplària com a mínim.

Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal forma que puguin apreciar-se els defectes per ús i no rellisquin.



Escales i passarel·les d'accés

L'accés a les plataformes de treball s'ha de realitzar mitjançant escales en progressió vertical, inclinades o des de les plantes de l'edifici mitjançant passarel·les.

Les passarel·les han de tenir el pis unit i estaran instal·lades de manera que no puguin bascular o lliscar.

La resistència de la passarel·la serà l'adequada per suportar el pes de les persones que la utilitzin a més de tenir la superfície antilliscant.

En qualsevol cas s'evitarà la utilització simultània per part de dues o més treballadors de les passarel·les o escales.



Amarratges

Els amarratges de la bastida a la façana han de realitzar-se quan l'estructura aconsegueixi el nivell d'amarratge previst en el projecte. La disposició i el nombre d'amarratges han d'estar definits en el plànol de muntatge. Han de ser capaços de suportar les càrregues horitzontals, tant perpendiculars com paral·leles a la façana, és a dir, l'amarratge trasllada a l'ancoratge situat en la façana totes les accions horitzontals que l'estructura suporta, inclosos les del vent. Com a pautes a seguir s'aconsella instal·lar amarratges cada 4 metres d'altura en tots els verticals. En cap cas s'utilitzaran com a punts d'amarratge canonades o desguassos, tubs de gas, xemeneies o altres materials similars.

Existeixen diferents tipus d'amarratges segons els casos; es poden observar dos tipus.

Amarratges per estampació a finestres o balconades

Els amarratges per estampació a finestres o balconades consten de dues bases regulables com a clavegueres per donar pressió al tub que al seu torn s'uneix a la bastida mitjançant un altre tub. És aconsellable posar en ambdós extrems de dorments de fusta per al repartiment de càrregues. Abans d'instal·lar les bases s'ha de

comprovar que l'element constructiu on s'instal·li l'estampació (finestres, balconades) ha de tenir una resistència suficient per no cedir a la pressió de les bases regulables. A més, periòdicament s'ha de tornar a ajustar la pressió de les bases.

Amarratges mitjançant tacs expansibles

Els amarratges mitjançant tacs expansibles utilitzen tacs de niló d'alta resistència. Els tacs s'introdueixen en les parts sòlides del parament (cants del forjat, pilars, etc.) i reben una vareta roscada o cargol, que en el seu extrem lliure porta acoblada una anella que és la que enllaça amb la peça específica de la bastida denominada tub d'amarratge.



Com a precaució important és recomanable que els tacs s'introdueixin en paraments de formigó armat. En aquests paraments la resistència de l'ancoratge pot arribar a ser de 500 kg. D'altra banda la resistència del tac fixat s'ha de comprovar.

El tub d'amarratge es col·locarà en tot el possible el més alt del marc, per evitar possibles cops al pas per la bastida.



És recomanable utilitzar, sempre que sigui possible aquest tipus d'ancoratge.

En la instal·lació dels amarratges s'han de seguir els següents criteris generals de col·locació i distribució:

Muntar els ancoratges uniformement distribuïts al llarg de tota la superfície de la bastida.

Col·locar en tot el possible el tipus d'amarratge mitjançant tacs expansibles a les zones de major resistència de la façana, en paraments de formigó armat.

Col·locar els amarratges cada 4 m d'altura en totes les fileres. En el cas en que la bastida estigui recoberta els amarratges s'instal·laran en funció de l'estudi tècnic corresponent.

En la terminació superior de la bastida és important col·locar amarratges en tots els marcs o verticals de coronació.


Per a bastides d'altura inferior a 24 m els ancoratges com a mínim han de col·locar-se cada 20 m² de superfície sense recobriment i cada 12 m² si la bastida està recoberta de malla permeable al pas del vent.

Amarrar sempre tots els verticals del primer i últim nivell.

Per determinar el nombre d'ancoratges per a altures majors de 24 m i/o en recobriments més densos, és necessari realitzar càlculs d'embranchida del vent juntament amb la màxima càrrega que en cada cas permeti l'ancoratge.

Protecció via pública

És convenient la instal·lació de xarxes en tota la zona de l'estructura que doni al carrer des de les bases d'anivellació fins a la cota més alta i des d'un extrem a un altre de la bastida inclosos els laterals; les xarxes poden ser d'alt grau de permeabilitat a l'aire (60 gr/m²), de menor permeabilitat però major qualitat (100 gr/m²). La utilització de xarxes és molt aconsellable però s'ha de tenir en compte que la seva utilització modifica la quantitat i/o tipus d'amarratge que portarà la bastida. Les lones estan totalment prohibides, en produir un efecte vela a la bastida, i en cas de vent fort podria tombar-la.

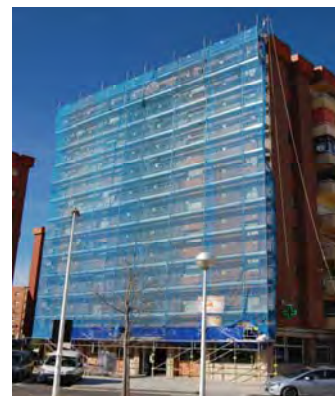

D'altra banda, és recomanable instal·lar marquesines protectores en volada a l'altura de la primera planta per a la recollida d'objectes o materials caiguts de forma incontrolada cap a l'exterior de la bastida. En el cas d'instal·lació de lones de protecció s'ha de tenir en compte la sortida del vent per evitar desploms totals o parcials de l'estructura.

Quan per problemes d'espai hagin de passar persones pròpies o alienes a l'obra per sota de la bastida, s'haurà d'instal·lar en pas per als vianants d'una amplària lliure mínima d'1 m totalment protegit de qualsevol desprendiment de pols, runa etc. Es pot protegir a través de fusta i lones impermeables proveïdes de desguàs per evacuar l'aigua, o qualsevol sistema de recollida d'objectes o materials de suficient resistència.



Els verticals i elements amb formes perilloses a l'abast dels vianants s'han de protegir amb elements i sistemes adequats.



Risc d'electrocució

Per prevenir el risc d'electrocució considerem dos casos segons es tracti de línies d'AT o BT

Línies d'AT

Aquest risc es manifesta quan s'han de realitzar treballs en les proximitats de línies elèctriques aèries, siguin d'alta o de baixa tensió. Segons el Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968), s'entén com a tals les de corrent altern trifàsic de 50 Hz de freqüència, la tensió nominal de la qual eficaç entre fases sigui igual o superior a 1 kV. Per prevenir el risc d'electrocució s'hauran d'aplicar els criteris establerts en RD 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric; en concret segons indica l'Art. 4.2, tot treball en una instal·lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti risc elèctric s'ha d'efectuar sense tensió.

Quan no es pugui deixar sense tensió la instal·lació s'han de seguir les mesures preventives indicades en l'Annex V.A Treballs en proximitat. Disposicions generals i l'indicat en l'Annex V.B Treballs en proximitat. Disposicions particulars del citat RD 614/2001. Es recomana, a fi de facilitar la correcta interpretació i aplicació del citat Reial decret consultar la corresponent Guia Tècnica elaborada per l'INSHT.

Sol·licitar per escrit a la companyia elèctrica la descàrrega de la línia, el seu desviament o la seva elevació.

Si no es poden realitzar alguna de les mesures anteriors, s'han d'establir unes distàncies mínimes de seguretat des del punt més proper de la bastida a la línia d'AT que segons indica el Reglament de Línies Elèctriques d'Alta Tensió són:

Tensió < 66.000 V 3 m

Tensió > 66.000 V 5 m

Línies de BT

Sol·licitar per escrit a la companyia elèctrica el desviament de la línia elèctrica.

Si no es pot desviar la línia s'han de col·locar beines aïllants sobre els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

5.2. Normes de seguretat durant l'ús de les bastides

Es revisarà la bastida abans de cada inici de treball.

Es limitarà l'accés a les bastides al personal que hagi de treballar en ells.

En cap concepte es manipularan els elements de l'estructura de seguretat de la bastida, no s'efectuarà cap modificació sense l'autorització del tècnic autor del projecte de muntatge.

Es mantindrà una perfecta neteja de les plataformes de treball, és convenient disposar d'un calaix per posar les eines necessàries durant la jornada per evitar que aquestes es deixin en la plataforma amb el risc que això comporta.

No es dipositaran pesos violents ni es realitzaran moviments violents sobre les bastides.

Es prohibeix córrer o saltar sobre bastides i saltar de la plataforma de la bastida a l'interior de l'edifici o viceversa; el pas es realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte.

No se sobrecarregarà la bastida amb materials.

No hi haurà en la bastida més personal de l'estrictament necessari.

Es prohibeix abandonar en les plataformes de treball materials o eines.

Es prohibeix llançar enderroc directament des de les bastides. L'enderroc es recollirà i es descarregarà de planta en planta, o bé es descarregarà a través de trompes.

Es prohibeix fabricar morters directament sobre les plataformes de les bastides.

No es realitzaran treballs simultanis a diferent nivell i en la mateixa vertical.

Els treballs s'han de suspendre en cas de pluja o neu o vent superior als 50 km/h, procedint a retirar els materials o eines que poguessin caure des de la superfície de la bastida.

Es limitarà l'accés a qualsevol bastida a personal aliè a l'obra.

S'ha d'evitar l'acumulació de brutícia, objectes diversos i materials innecessaris sobre les plataformes de treball.

L'accés a la zona de treball per part dels operaris s'ha de fer sempre per les escales o passarel·les instal·lades a aquest efecte.

Inspeccions

Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent delegada de l'Adreça Tècnica de l'obra:

Abans de la seva posada en servei.

A intervals regulars en endavant.

Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsejades sísmiques, període de mal temps, especialment al vent fort o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar a la seva resistència o a la seva estabilitat. Sempre que com a resultat d'aquells es temi per la seguretat de la bastida.

En la taula s'indica una llista de comprovació que facilita aquesta inspecció.

Llista de comprovació	
El terreny no ha cedit	☐
Les bases regulables estan en bon estat i la càrrega vertical està degudament repartida entre totes la bases	☐
Els muntants estan alineats	☐
Els muntants estan verticals	☐
Els llarguers estan horitzontals	☐
Els travessers estan horitzontals	☐
Els elements per enriostar horitzontals i verticals estan en bon estat	☐
Els ancoratges de la façana estan en bon estat	☐
Els marcs amb els seus passadors estan correctament ancorats	☐
Les plataformes de treball estan correctament disposades i adequades a l'estructura de la bastida	☐
Les baranes, barres intermèdies i roda peus estan correctament disposats i en condicions	☐
Els accessos estan en condicions correctes	☐

En cas de detectar qualsevol anomalia s'ha d'esmenar immediatament o segons la seva importància clausurar la zona on es trobi podent seguir treballant a les zones segures.

5.3. Normes de seguretat durant el desmuntatge de les bastides

El desmuntatge s'efectuarà en l'ordre invers al muntatge i amb la presència d'un tècnic competent.

Està totalment prohibit llançar des d'a dalt els elements d'una bastida, es tindran que baixar mitjançant els mecanismes de l'elevació o descens convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o estaran convenientment lligades.

Els elements que formen la bastida es recolliran i retiraran al més aviat possible.

6. Proteccions individuals

6.1. Introducció

En les situacions en què no estigui garantida la protecció contra caigudes d'altura per no utilitzar baranes auto trepants o baranes provisionals i s'hagi de treballar de forma puntual en zones no protegides dins el perímetre s'utilitzarà un equip de protecció antiàcides descrit en l'apartat corresponent d'aquest document.

6.2. Equips de protecció individual

La protecció de varis dels riscos relacionats es pot aconseguir utilitzant els següents elements de protecció individual:

Els EPI recomanables en el muntatge, desmuntatge i utilització d'aquest tipus de bastides són:

Casc de seguretat del Tipus CE-II conforme a les normes UNE-EN-397 i UNE-EN-397/A1




Guants de cuir reforçat del Tipus CE-II conformes a les normes UNE-EN-420 i UNE-EN-388.



Calçat de seguretat del Tipus CI-II conforme a les normes UNE-EN-344/A1, UNE-EN-344-2, UNE-EN345/A1, UNE-EN-345-2, UNE-EN-346/A1, UNE-EN346-2, UNE-EN-347/A1 i UNE-EN-347-2.



Equip de protecció antiàcides del tipus CE-II, format per un amés antiàcides (UNE-EN-361), un element d'ancoratge utilitzant cordes (UNE-EN-354) amb absorbidor d'energia (UNE-EN-355) o dispositiu antiàcides retràtil (UNE-EN-360).



Qualsevol altre EPI a utilitzar dependrà de les condicions de treball de la zona on estigui instal·lada la bastida.

7. Senyalització

En la senyalització de seguretat s'han de distingir tres casos segons es tracti de seguretat laboral, seguretat viària o seguretat per als vianants.

7.1. Seguretat laboral

Les bastides han de tenir senyalitzacions de seguretat que indiquin la càrrega màxima admissible que pot suportar la bastida.

S'han d'utilitzar els següents senyals segons els casos: obligació, protecció obligatòria del cap, protecció obligatòria de les mans, protecció obligatòria dels peus, protecció individual obligatòria contra caigudes, advertiment, caigudes a diferent nivell, risc d'ensopegar, risc elèctric, perill en general, prohibició, prohibit passar als vianants, entrada prohibida a persones no autoritzades.



7.2. Seguretat viària

S'han d'utilitzar els següents senyals segons els diferents casos en que la bastida envaeixi més o menys la calçada: viàries (perillo obres, limitació de velocitat i estrenyiment de calçada); abalisament mitjançant garlandes lluminoses fixes i intermitents.



7.3. Seguretat per als vianants

La seguretat dels vianants que puguin circular per sota o en les proximitats de les bastides s'assegurarà senyalitzant els diferents elements estructurals situats a nivell de carrer mitjançant pintura reflectant a barres blanques i vermelles impedit sempre que sigui possible el pas per sota de zones on es puguin colpejar amb alguna part de l'estructura. Per a això, es posarà el senyal complementari de prohibit passar als vianants.

En el cas que per motius de seguretat els vianants no puguin passar per sota de la bastida, es facilitarà un pas alternatiu degudament protegit mitjançant tanques, senyalitzat i abalisat sobretot si s'envaeix la calçada de circulació de vehicles.

D'altra banda els accessos a locals públics o portals s'han de protegir especialment mitjançant pòrtics amb proteccions horitzontals i verticals.



8. Riscos i factors de riscos

8.1.Introducció

En les bastides poden presentar-se una gran varietat de riscos, que descriurem a continuació, destacant que els principals, per les seves possibles conseqüències són les caigudes a diferent nivell i el desplom de l'estructura


8.2.Riscos i causes

Caigudes sobre el mateix i diferent nivell	Muntatge o desmuntatge incorrecte de l'estructura o de les plataformes de treball sense les corresponents proteccions individuals. Amplària insuficient de la plataforma de treball. Absència de baranes de seguretat en totes o alguna de les plataformes de treball. Accedir a la zona de treball grimpant per l'estructura. Separació excessiva entre la bastida i la façana. Deficient subjecció de la plataforma de treball a l'estructura que permet el seu moviment incontrolat. Bolcada de la bastida per estar incorrectament recolzada en el sòl o per ancoratge deficient o inexistent del mateix a l'edifici. Desplom de la bastida per diferents causes. Trencament de la plataforma de treball per sobrecàrrega, deterioració o mal ús de la mateixa. Mala utilització de les escales d'accés a les diferents plantes de l'estructura de la bastida. Els derivats del patiment de malalties no detectades (epilèpsia, vertigen, etc.) Deixar obertes les trapes d'accés a un o varis dels nivells de treball. Falta d'ordre i neteja en la superfície de les plataformes de treball. Salt excessiu (>0,25 cm) en el pas entre bastides en el mateix nivell de treball.
Desplom de l'estructura	Enfonsament o desplom de tota o part de la superfície de suport. Suport de la bastida sobre materials poc resistents. Deformació o trencament d'un o varis dels elements constituents de la bastida. Subjeccions a la façana inexistent, incompletes o insuficients. Muntatge incorrecte. Sobrecàrrega de les plataformes de treball respecte a la seva resistència màxima permesa. Ancoratges i amarratges incorrectes. Elements d'enriestar incomplets de la pròpia estructura. Acció de les inclemències atmosfèriques, especialment el vent.
Caiguda de materials sobre persones i/o béns	Bolcada o enfonsament de la bastida Plataforma de treball desprotegida Trencament o falta d'una plataforma de treball

	Trencament o falta de roda peus Elevació o descens d'elements utilitzant cordes o corrioles deficients
Contactes elèctrics directes o indirectes	Són també un risc greu per les seves possibles conseqüències i habitualment es produeix per proximitat a línies elèctriques d'AT i/o Btya siguin aèries o en façana.
Arrapaments i lesions diverses en extremitats	Poden ser deguts la manipulació dels elements de la bastida sense protecció de les extremitats inferiors i superiors
Sobreesforços en els treballs de muntatge i desmuntatge	No utilització de mitjans mecànics per a la manipulació dels elements No organització del treball.
Cops contra objectes fixos	Donades les característiques d'aquest tipus de treball, són freqüents els cops contra objectes fixos, especialment en el cap


Manual d'instruccions i manteniment

Elements bàsics del sistema

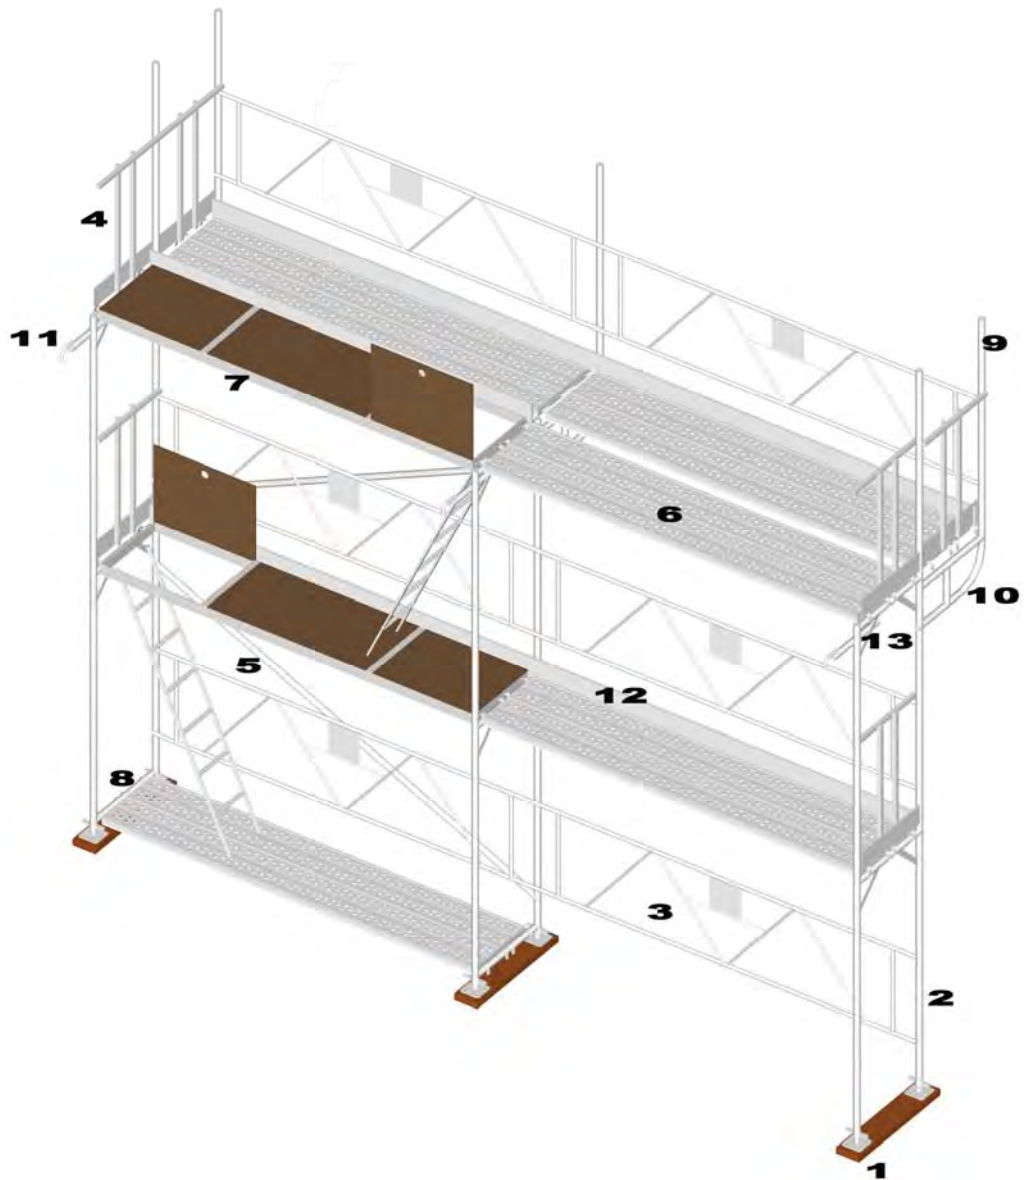

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | Peu rosca | 8. | Barrot regulable doble abraçadora |
| 2. | Pòrtic | 9. | Peu tancament superior |
| 3. | Barana doble | 10. | Volada |
| 4. | Barana lateral amb roda peu | 11. | Tub d'amarratge |
| 5. | Diagonal | 12. | Roda peu |
| 6. | Plataforma metàl·lica 30 cm | 13. | Abraçadora fixa de cargol |
| 7. | Plataforma amb escala i trapa | | |

b) Procés de muntatge de la bastida




Replantejament dels peus rosca: Col·locar els peus rosca amb la placa en el terreny degudament condicionat. Si calgués sobre taulons per repartir càrregues, a una distància adequada del parament de façana mai superior a 30 cm. El suport de les plaques base mai ha d'efectuar-se sobre maons, blocs de formigó, taulons amb maons, etc.



2


Començar a instal·lar en el punt més alt del terreny, regulant la rosca en la posició mínima. Col·locar els dos primers pòtics sobre les bases i unir-los amb la barana. Amb el nivell de bombolla recolzat en el vertical del pòtic s'anivella el pòtic. Per anivellar longitudinalment es recolza en la barana. Recordi que la unió dels plançons s'aconsegueix introduint la barana fins a fer topall quedant la xaveta en la seva posició de bloqueig.

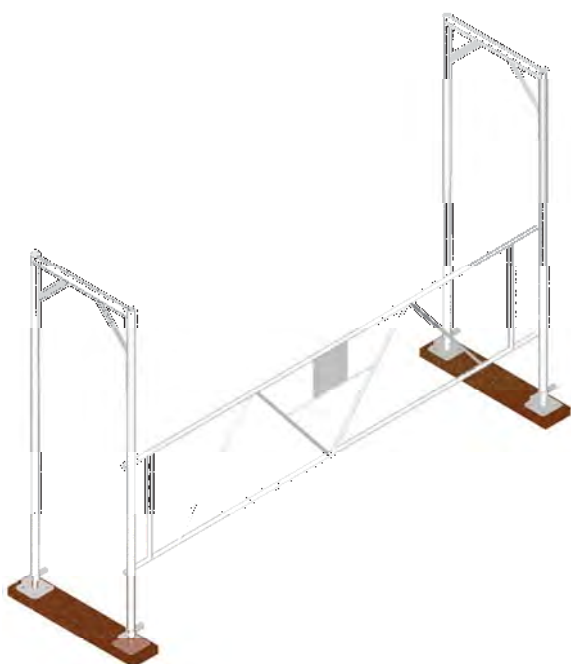

3


Col·locar el pòrtic contigu i la barana. Abans de seguir encadenant la bastida cal anivellar cada mòdul. Col·locar les baranes i diagonals per enriostar els pòrtics consecutius en sentit longitudinal.

Col·locar la diagonal en el plançó superior per l'interior del pòrtic i clavar el tascó per l'exterior del pòrtic. S'ha de diagonalitzar almenys 1 de cada 4 mòduls. En el mòdul on va instal·lada la plataforma d'accés s'instal·len plataformes metàl·liques en la part inferior a través de dos barrots amb abraçadora. Els mòduls adjacents es muntaran a continuació seguint el mateix procediment. Comprovar la separació de la bastida a la façana amb les cotes indicades en el projecte.

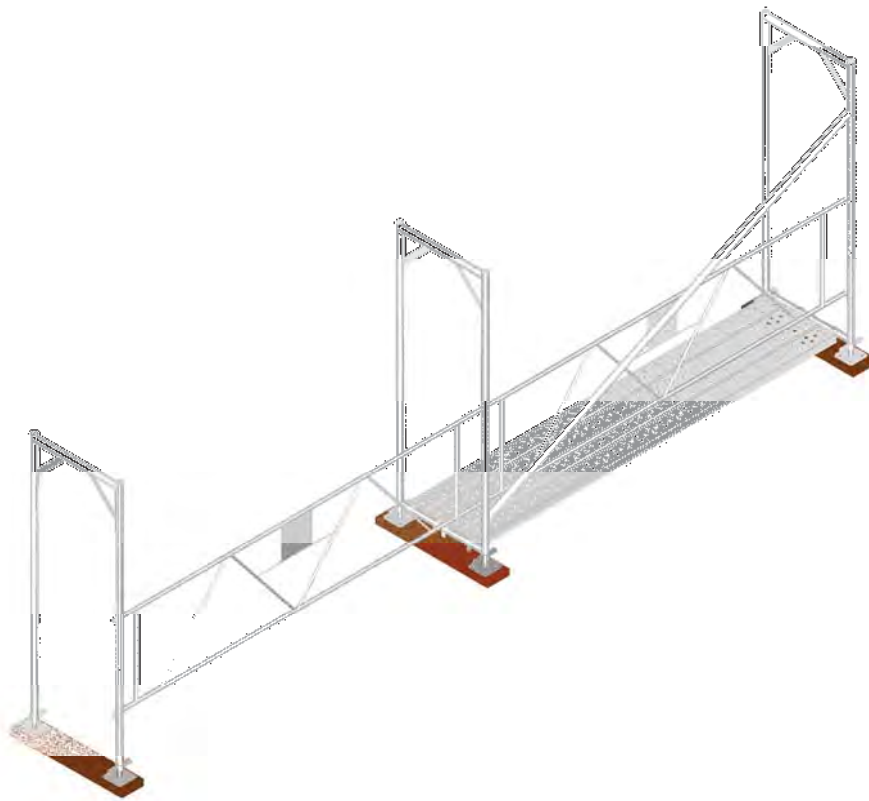


4

Col·locar les plataformes en el nivell superior, no oblidar de col·locar els passadors que porten incorporats les plataformes per evitar la seva sortida accidental a causa de la força del vent. Per a una major protecció es recomana col·locar l'escala de la plataforma amb trapa en el costat on esta col·locada la diagonal en la part superior del mòdul. Conforme a la reglamentació vigent pot ser precisa una protecció auxiliar durant la fase de muntatge i desmuntatge. Per a això s'emprà la barana de muntatge que es fixa des del mòdul inferior prèviament assegurat. Igualment, abans d'iniciar l'accés al nivell superior s'utilitzarà un arnés de seguretat.

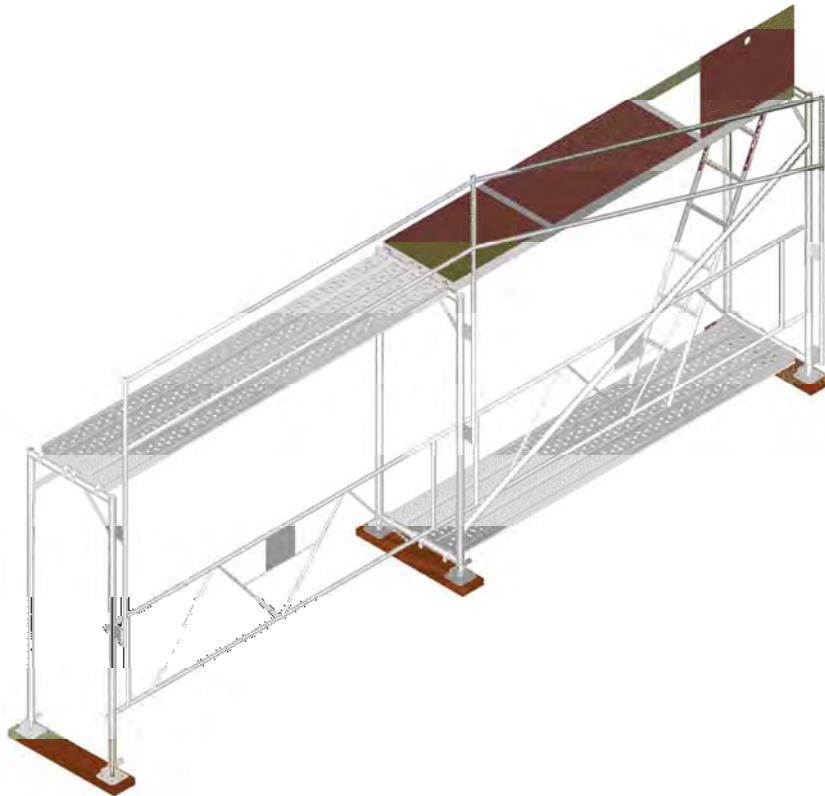


5

El muntatge dels nivells superiors comença des del mòdul inicial continuant el procés d'igual forma que es va realitzar anteriorment, afegint baranes laterals i roda peus. S'ha de protegir amb baranes i roda peus tot el perímetre de la bastida. Les plataformes d'accés es col·locaran contrapesades.

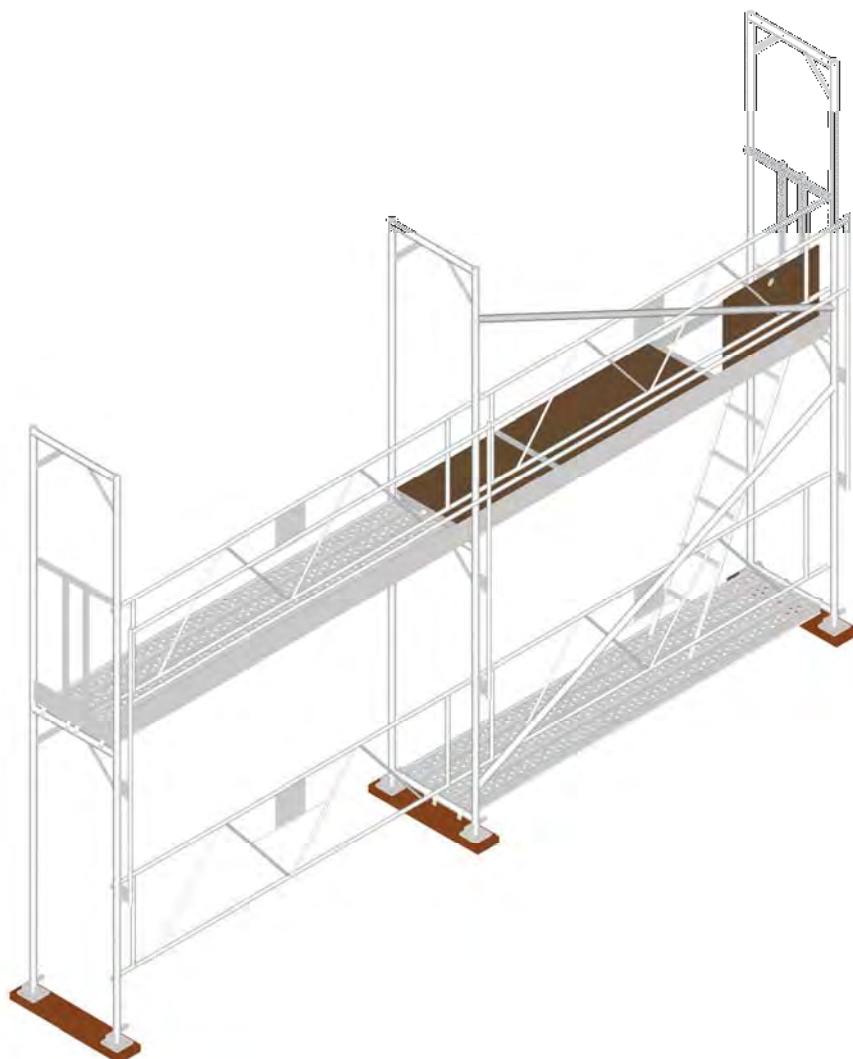

6


Per realitzar el muntatge amb total seguretat hauran de completar-se nivells de treball i ancorar-se a la façana immediatament. La tècnica d'ancoratge de la bastida consisteix a introduir mitjançant trepant els tacs en les parts sòlides del parament. El tac al seu torn rep una armella roscada fins que quedi fix a l'interior del mur. En l'anella de l'armella s'acobla el tub d'amarratge, en l'altre extrem s'engrapa al pòrtic amb abraçadora fixa de cargol. És recomanable col·locar els tacs en les parts més resistents del parament com són els forjats, en cap cas sobre baranes, petos, reixes, etc. Com a norma general s'instal·len ancoratges cada 4 metres d'altura en tots els pòrtics.

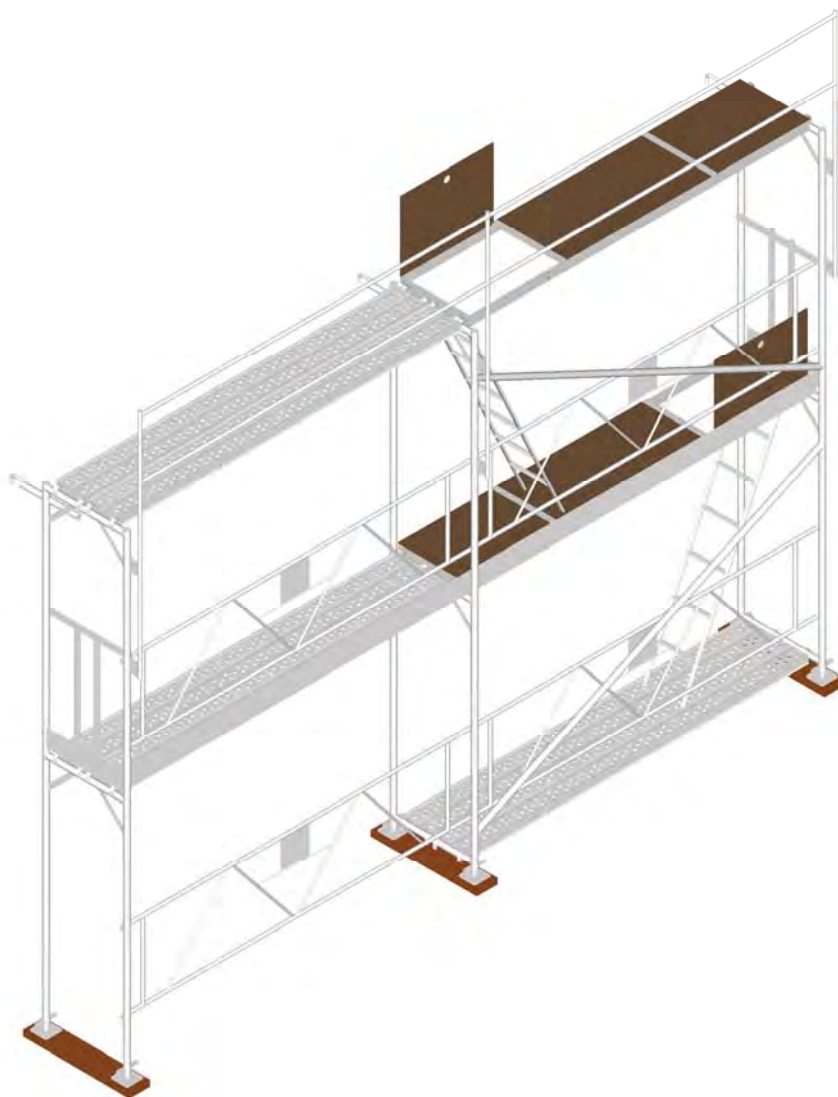


7

Una vegada aconseguit el nivell sol·licitat en el projecte és necessari col·locar una protecció perimetral d'1 metre d'altura.







Existeix un ampli nombre d'elements auxiliars per col·locar-los en la bastida com poden ser: Volades, suport de xapa, peu d'arrencada, bigues, rodes, escala interior, abraçadores amb endoll, etc.. En aquests casos, si tinguéssiu algun dubte sobre el seu muntatge, consulti amb el nostre departament tècnic.


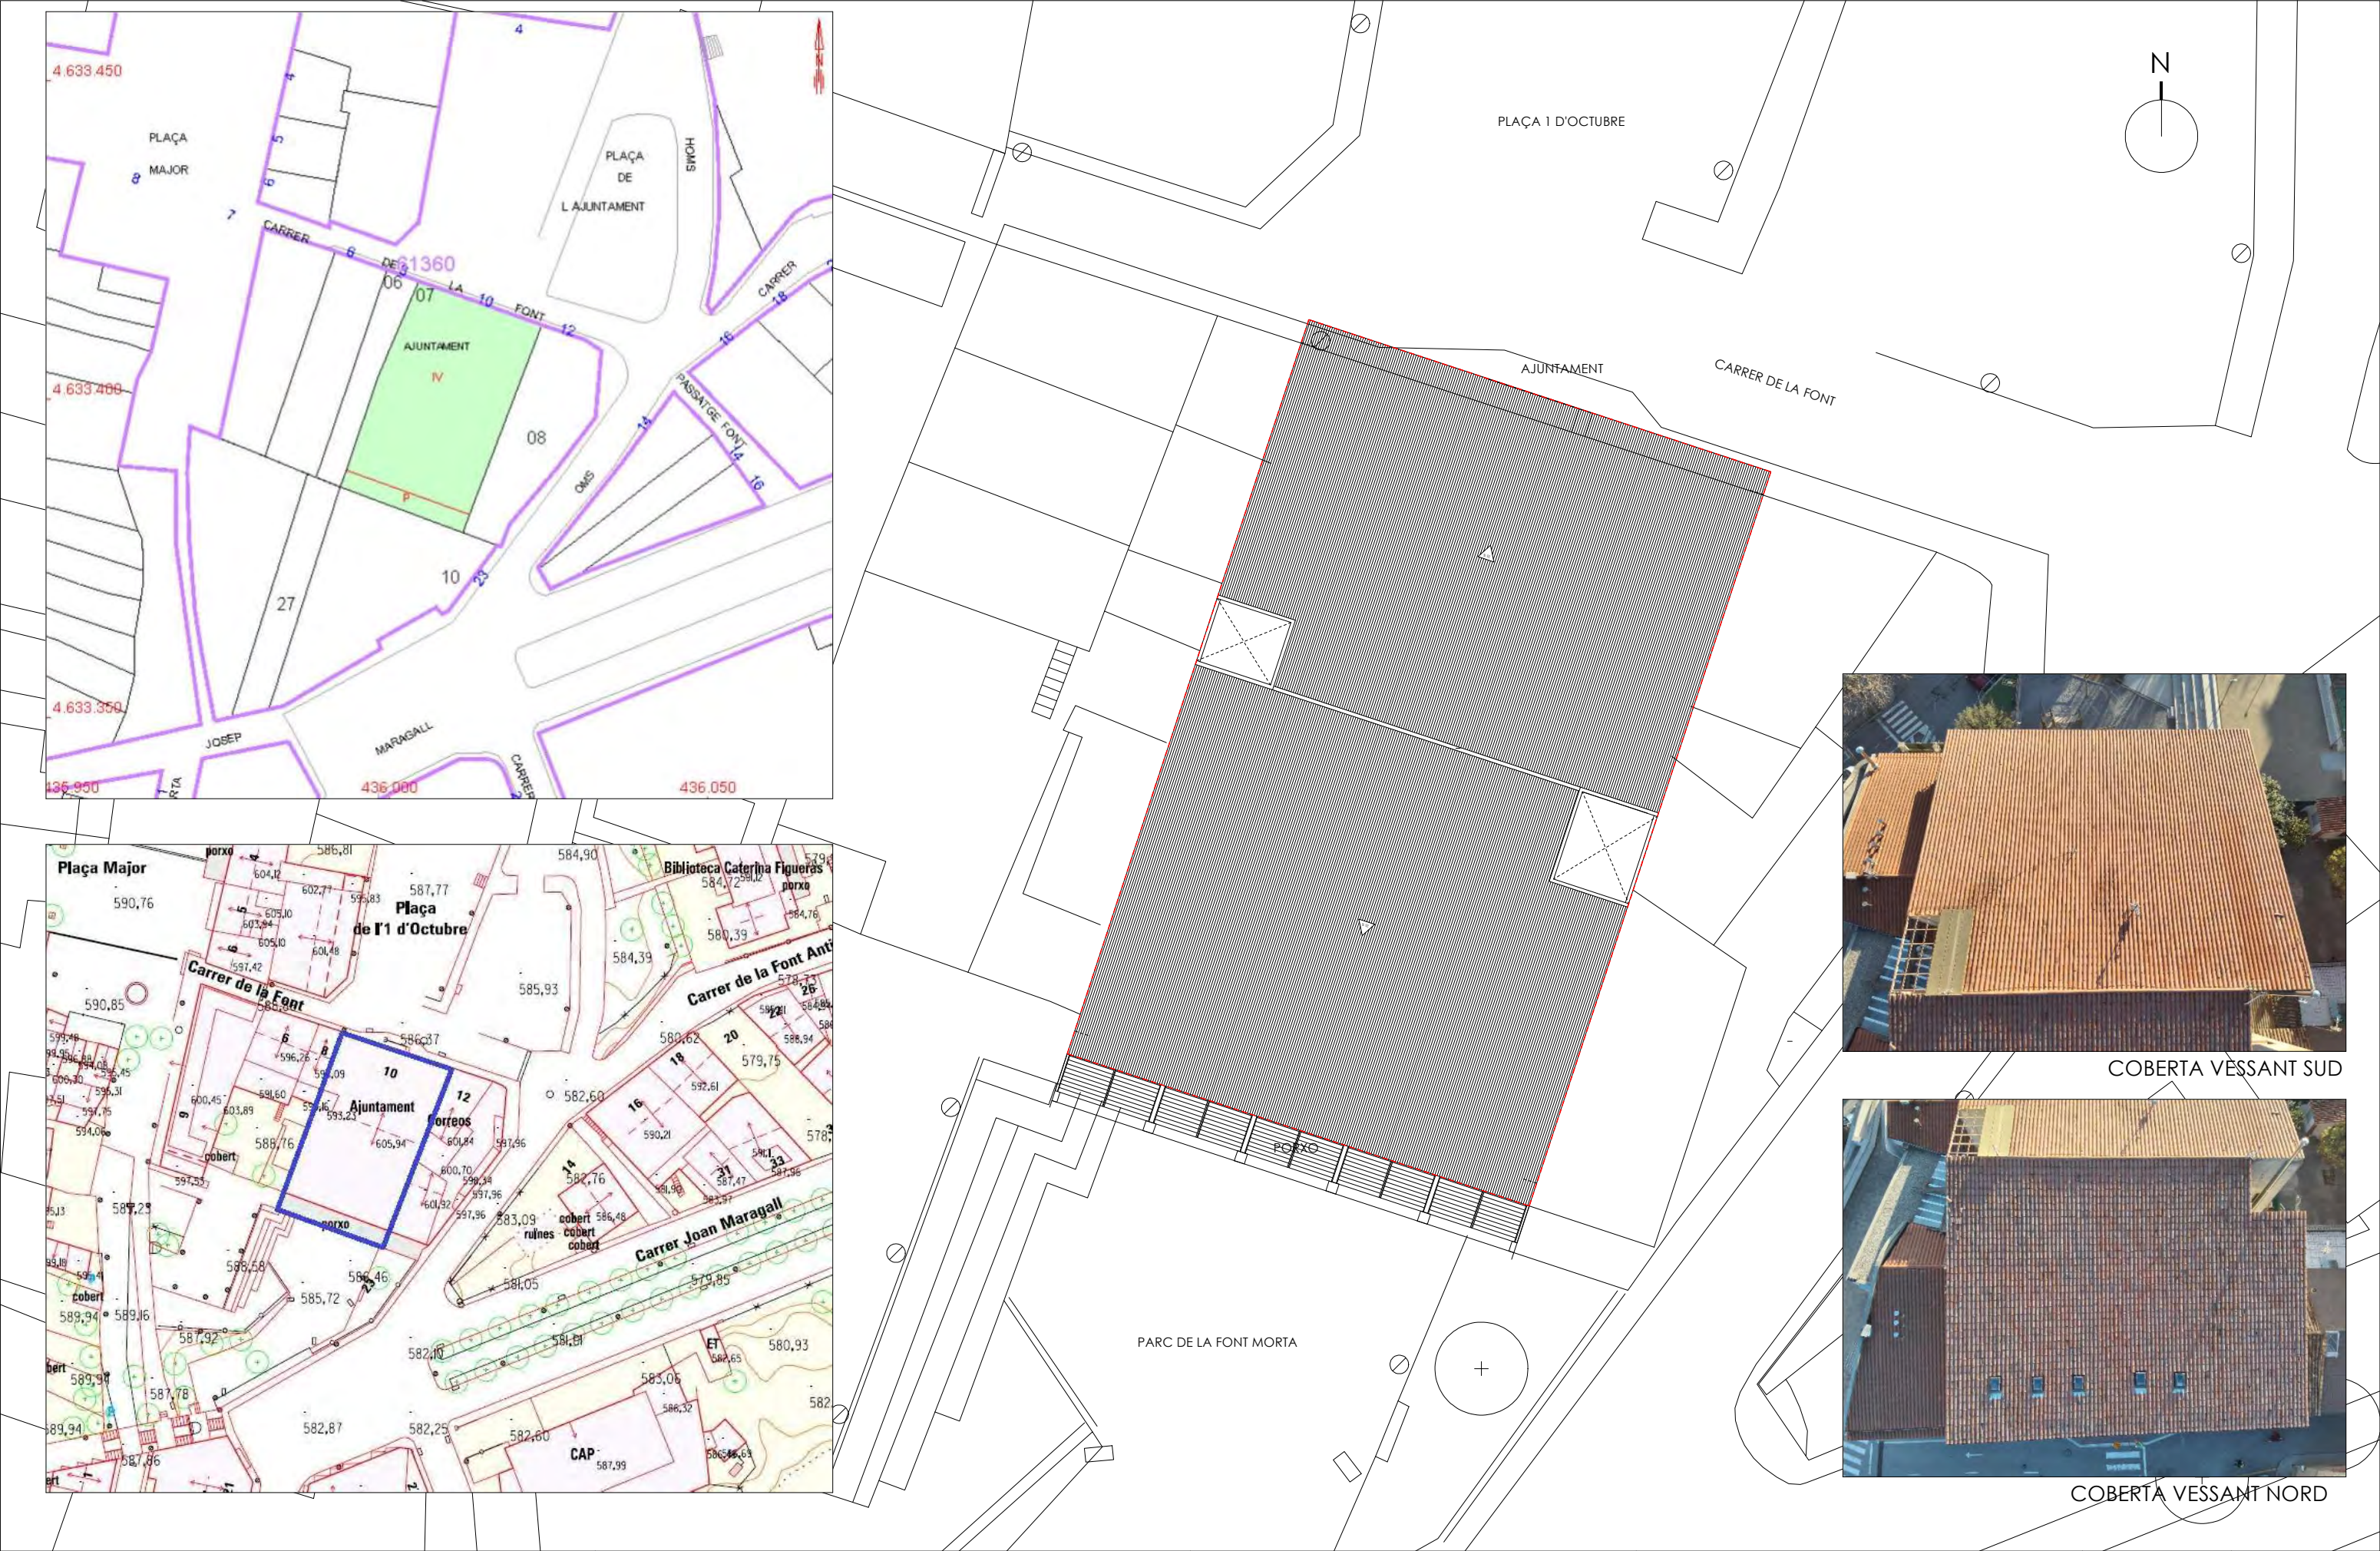


TÍTOL ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA	DESCRIPCIÓ PLÀNOL SITUACIO I EMPLAÇAMENT	PROMOTOR AJUNTAMENT DE TONA CARRER DE LA FONT, 10 08551 - TONA	REDACCIÓ: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	DATA FEBRER 2025 ESCALA ---	Nº PLÀNOL 1
---	--	---	--	---	-----------------------------------

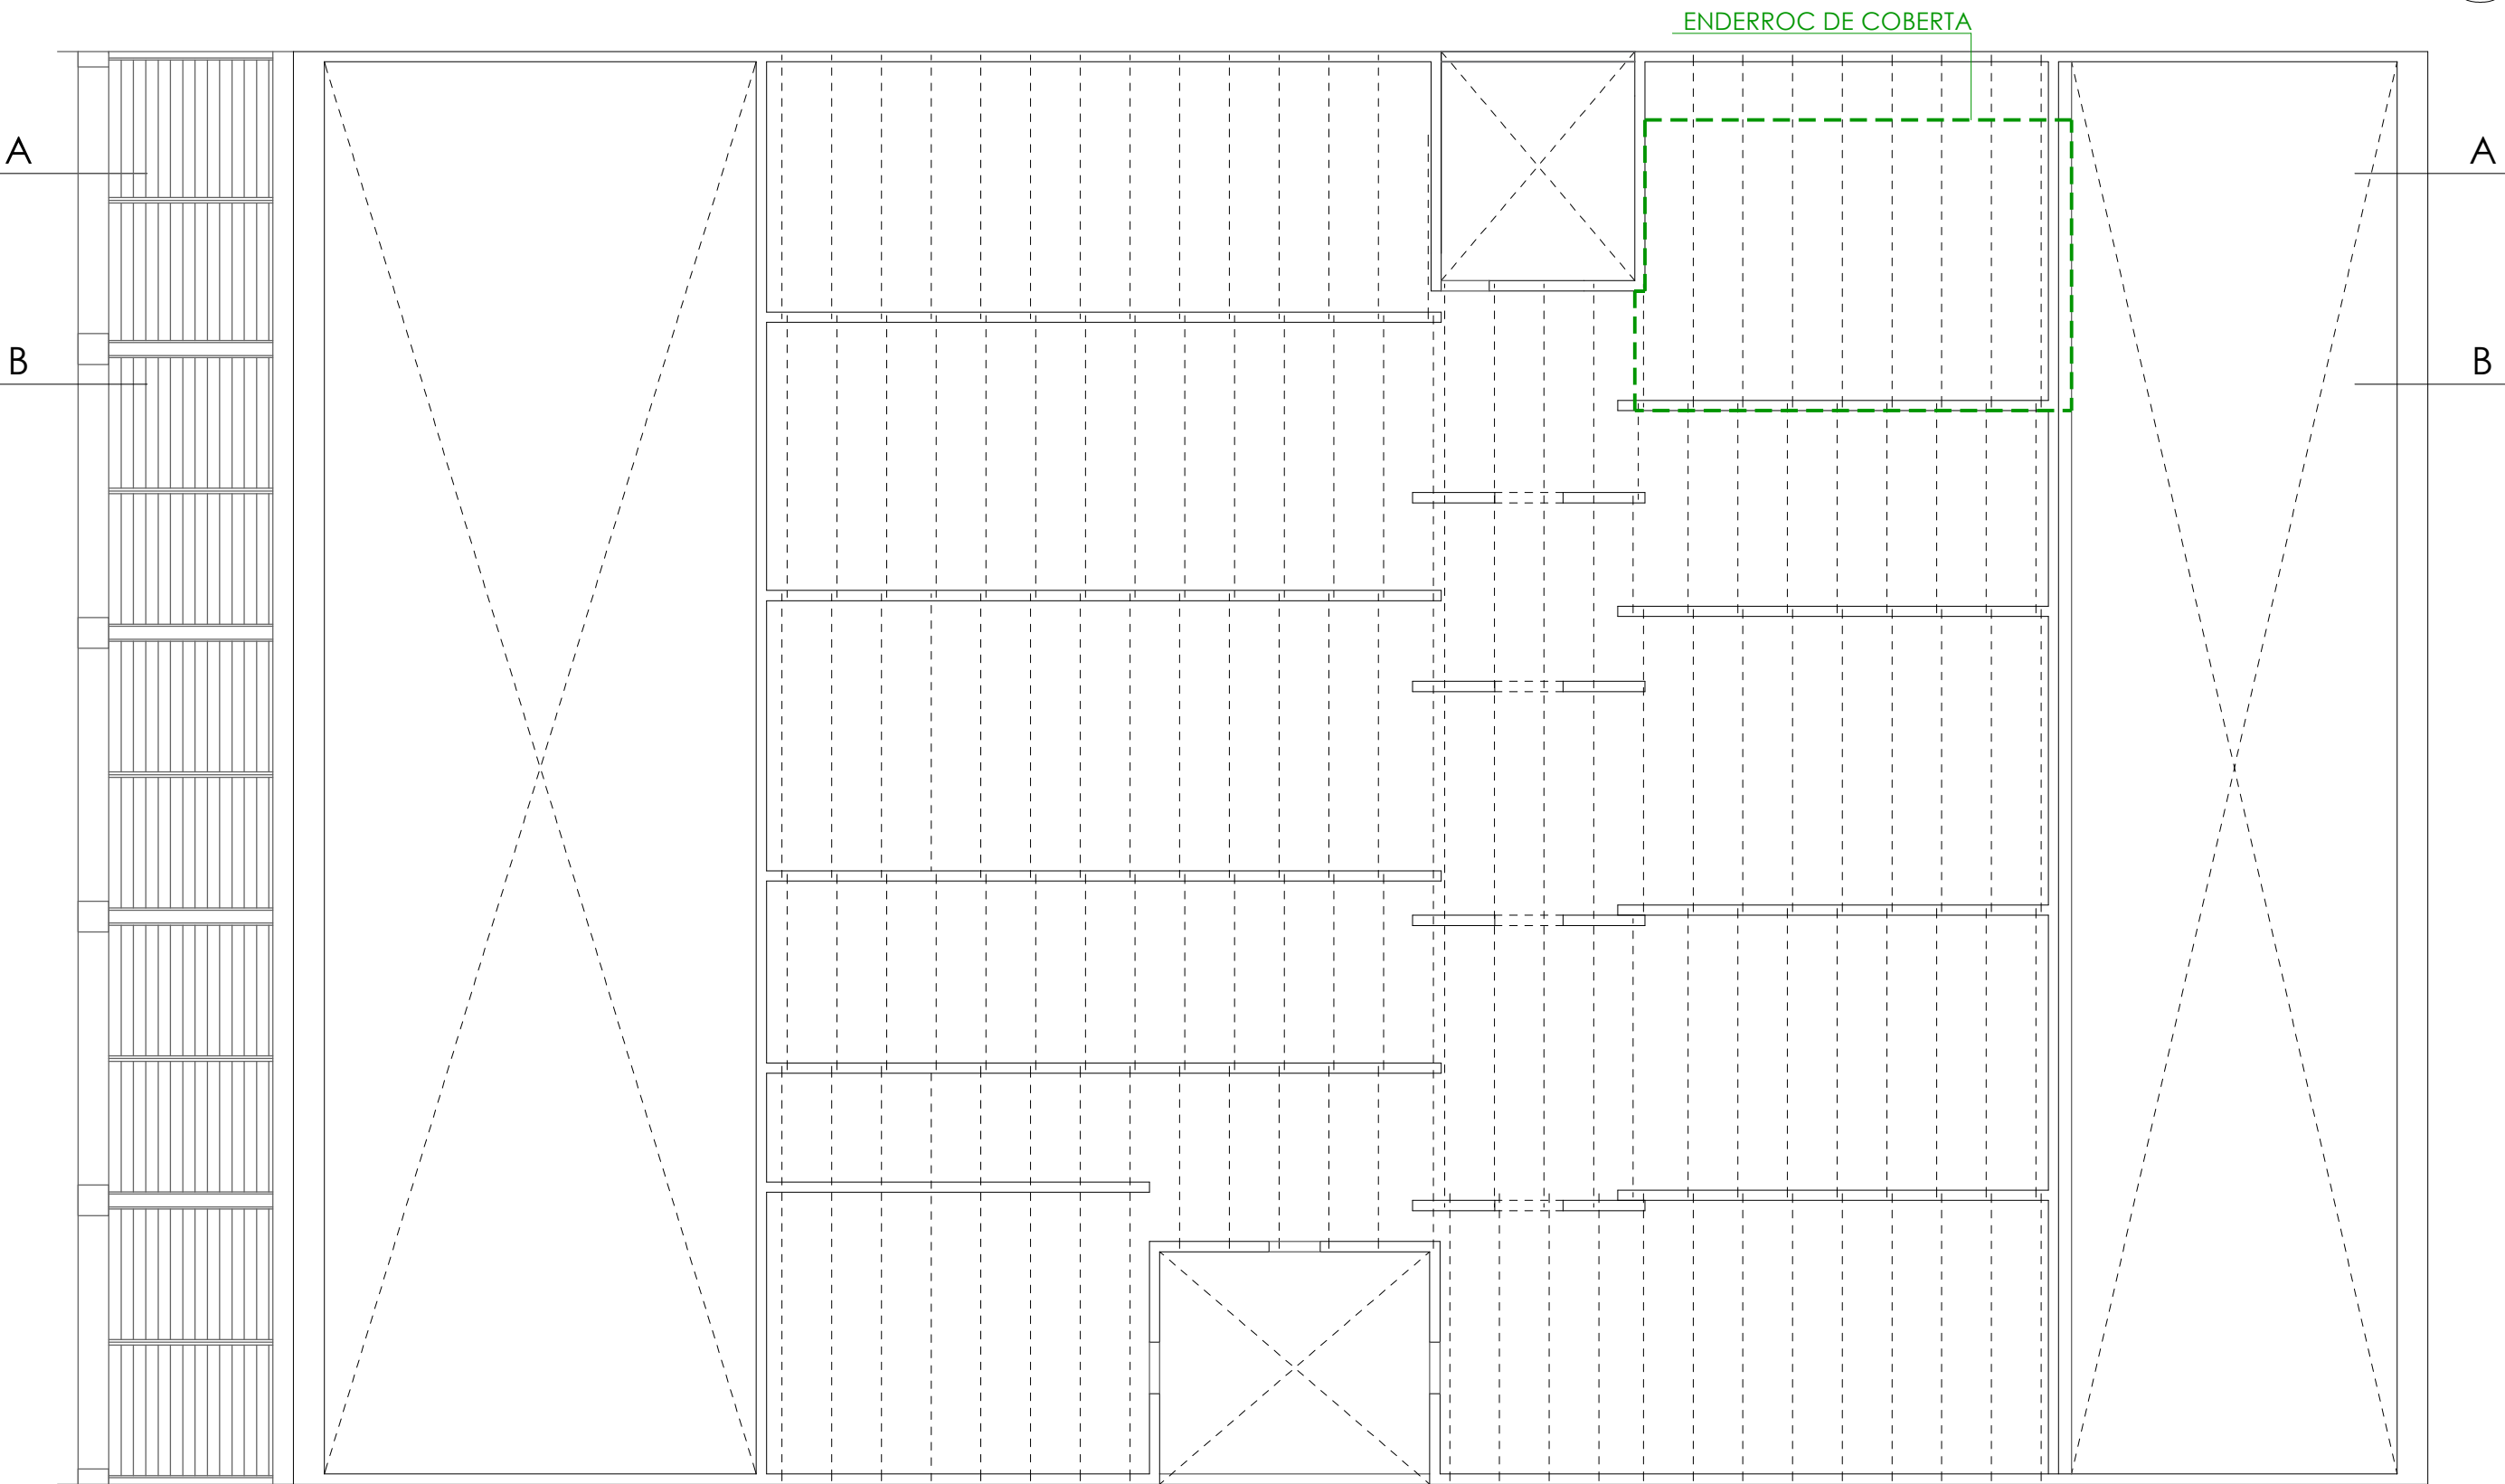


PLANTA SOTACOBERTA

TÍTOL	DESCRIPCIÓ PLÀNOL	PROMOTOR	REDACCIÓ:	DATA	Nº PLÀNOL
				ESCALA	
ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA	PLANTA SOTACOBERTA ESTAT ACTUAL	AJUNTAMENT DE TONA CARRER DE LA FONT, 10 08551 - TONA	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	FEBRER 2025	2
				1/100	

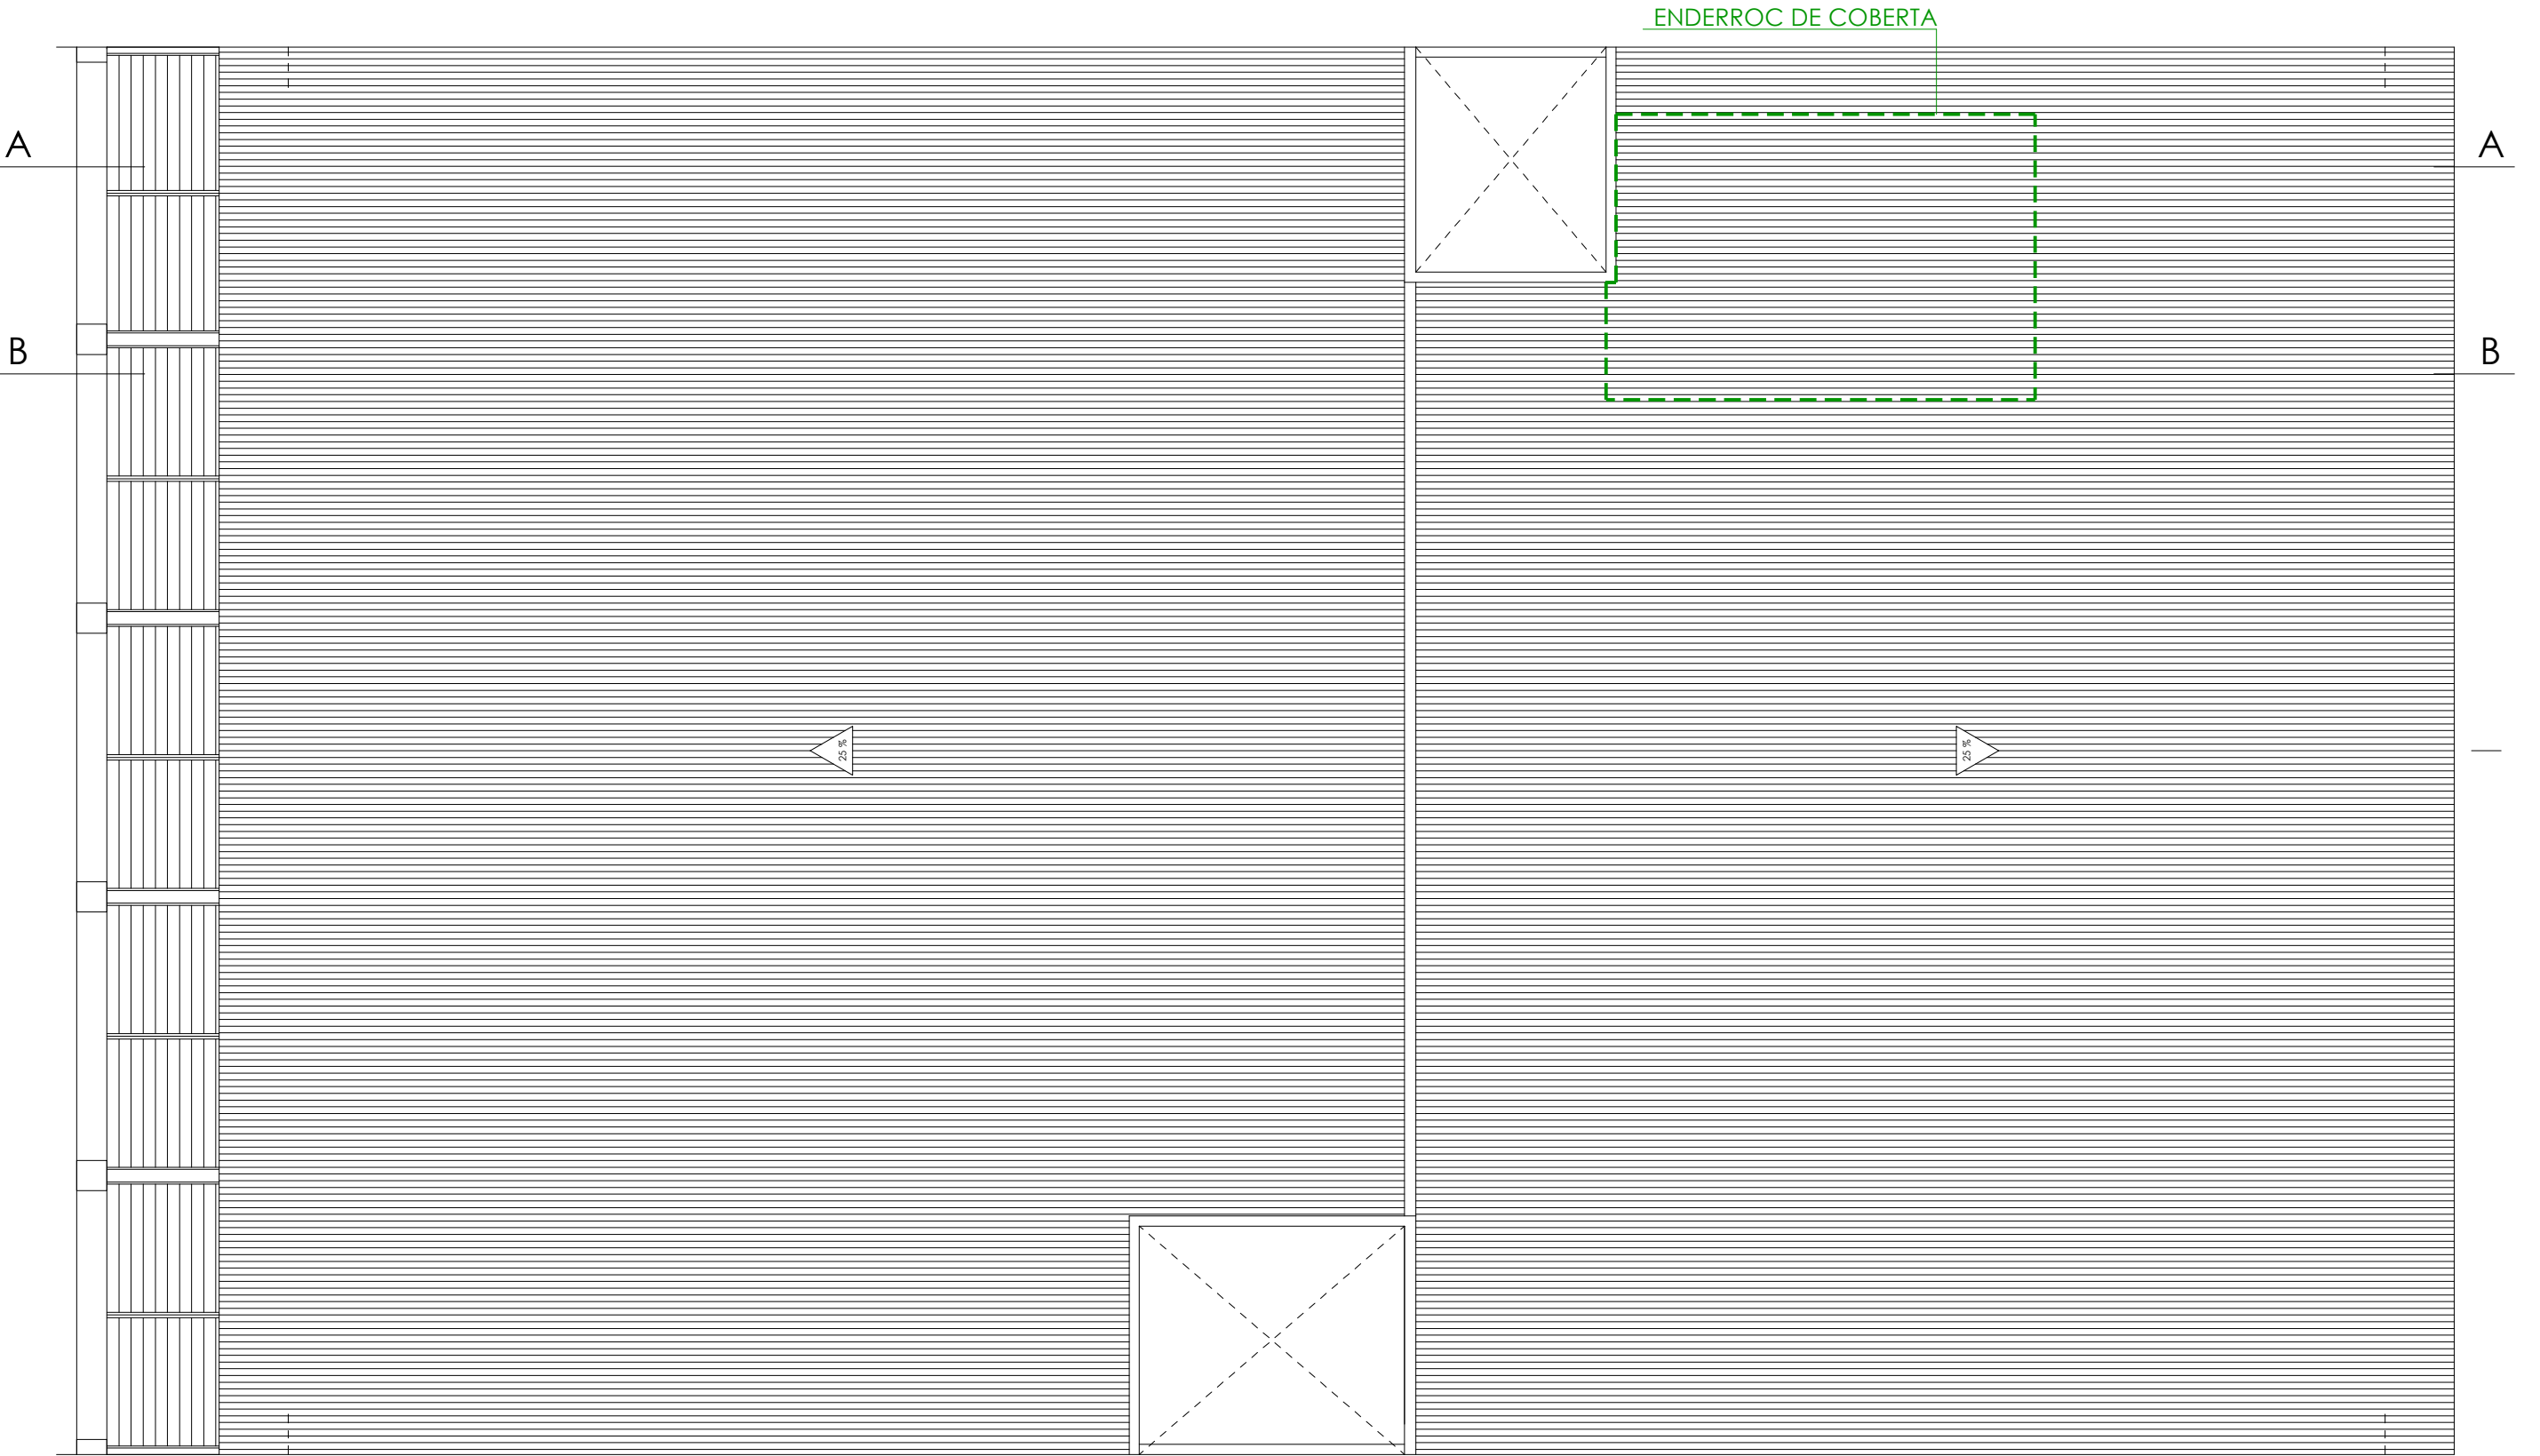


PLANTA COBERTA

TÍTOL	DESCRIPCIÓ PLÀNOL	PROMOTOR	AJUNTAMENT DE TONA	REDACCIÓ:	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	DATA	Nº PLÀNOL
						FEBRER 2025	
						ESCALA	
ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA		PLANTA COBERTA ESTAT ACTUAL		CARRER DE LA FONT, 10 08551 - TONA		1/100	3


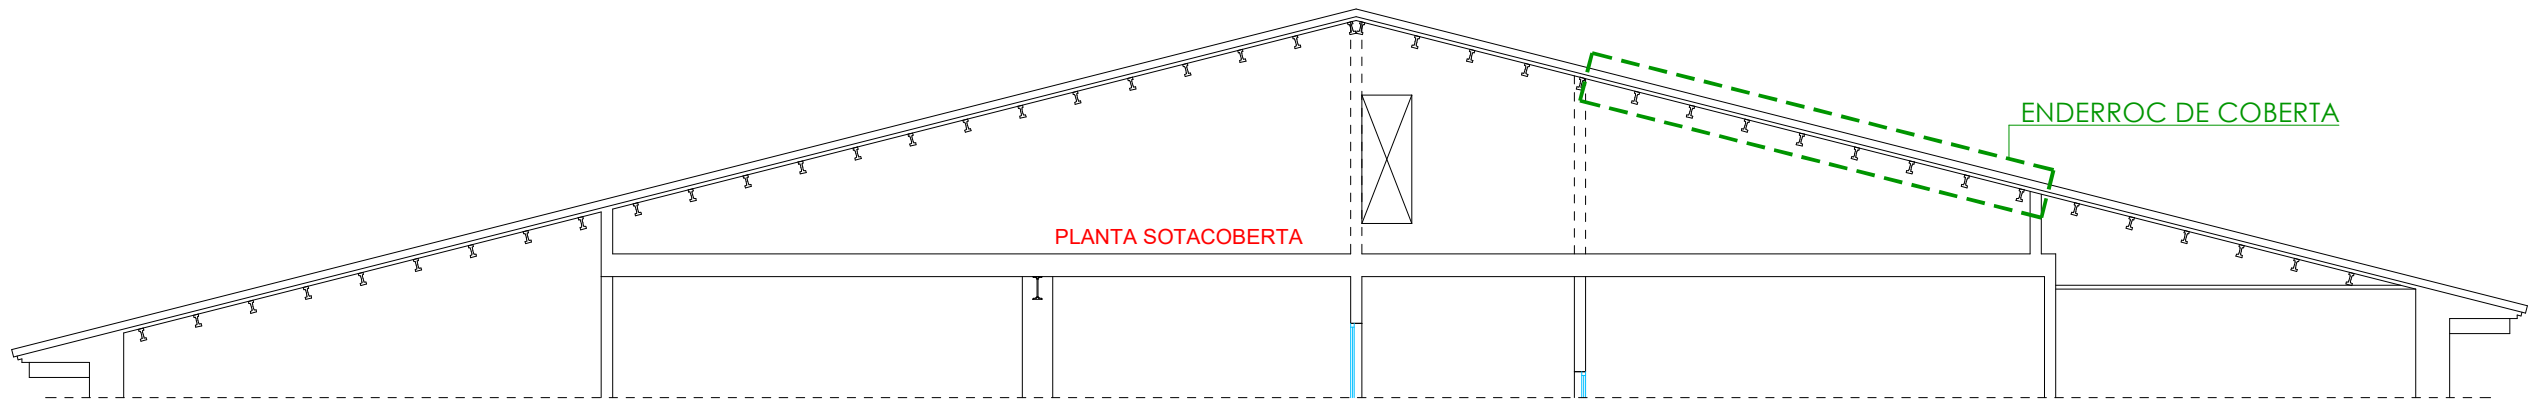


SECCIO B-B' - INTERIOR

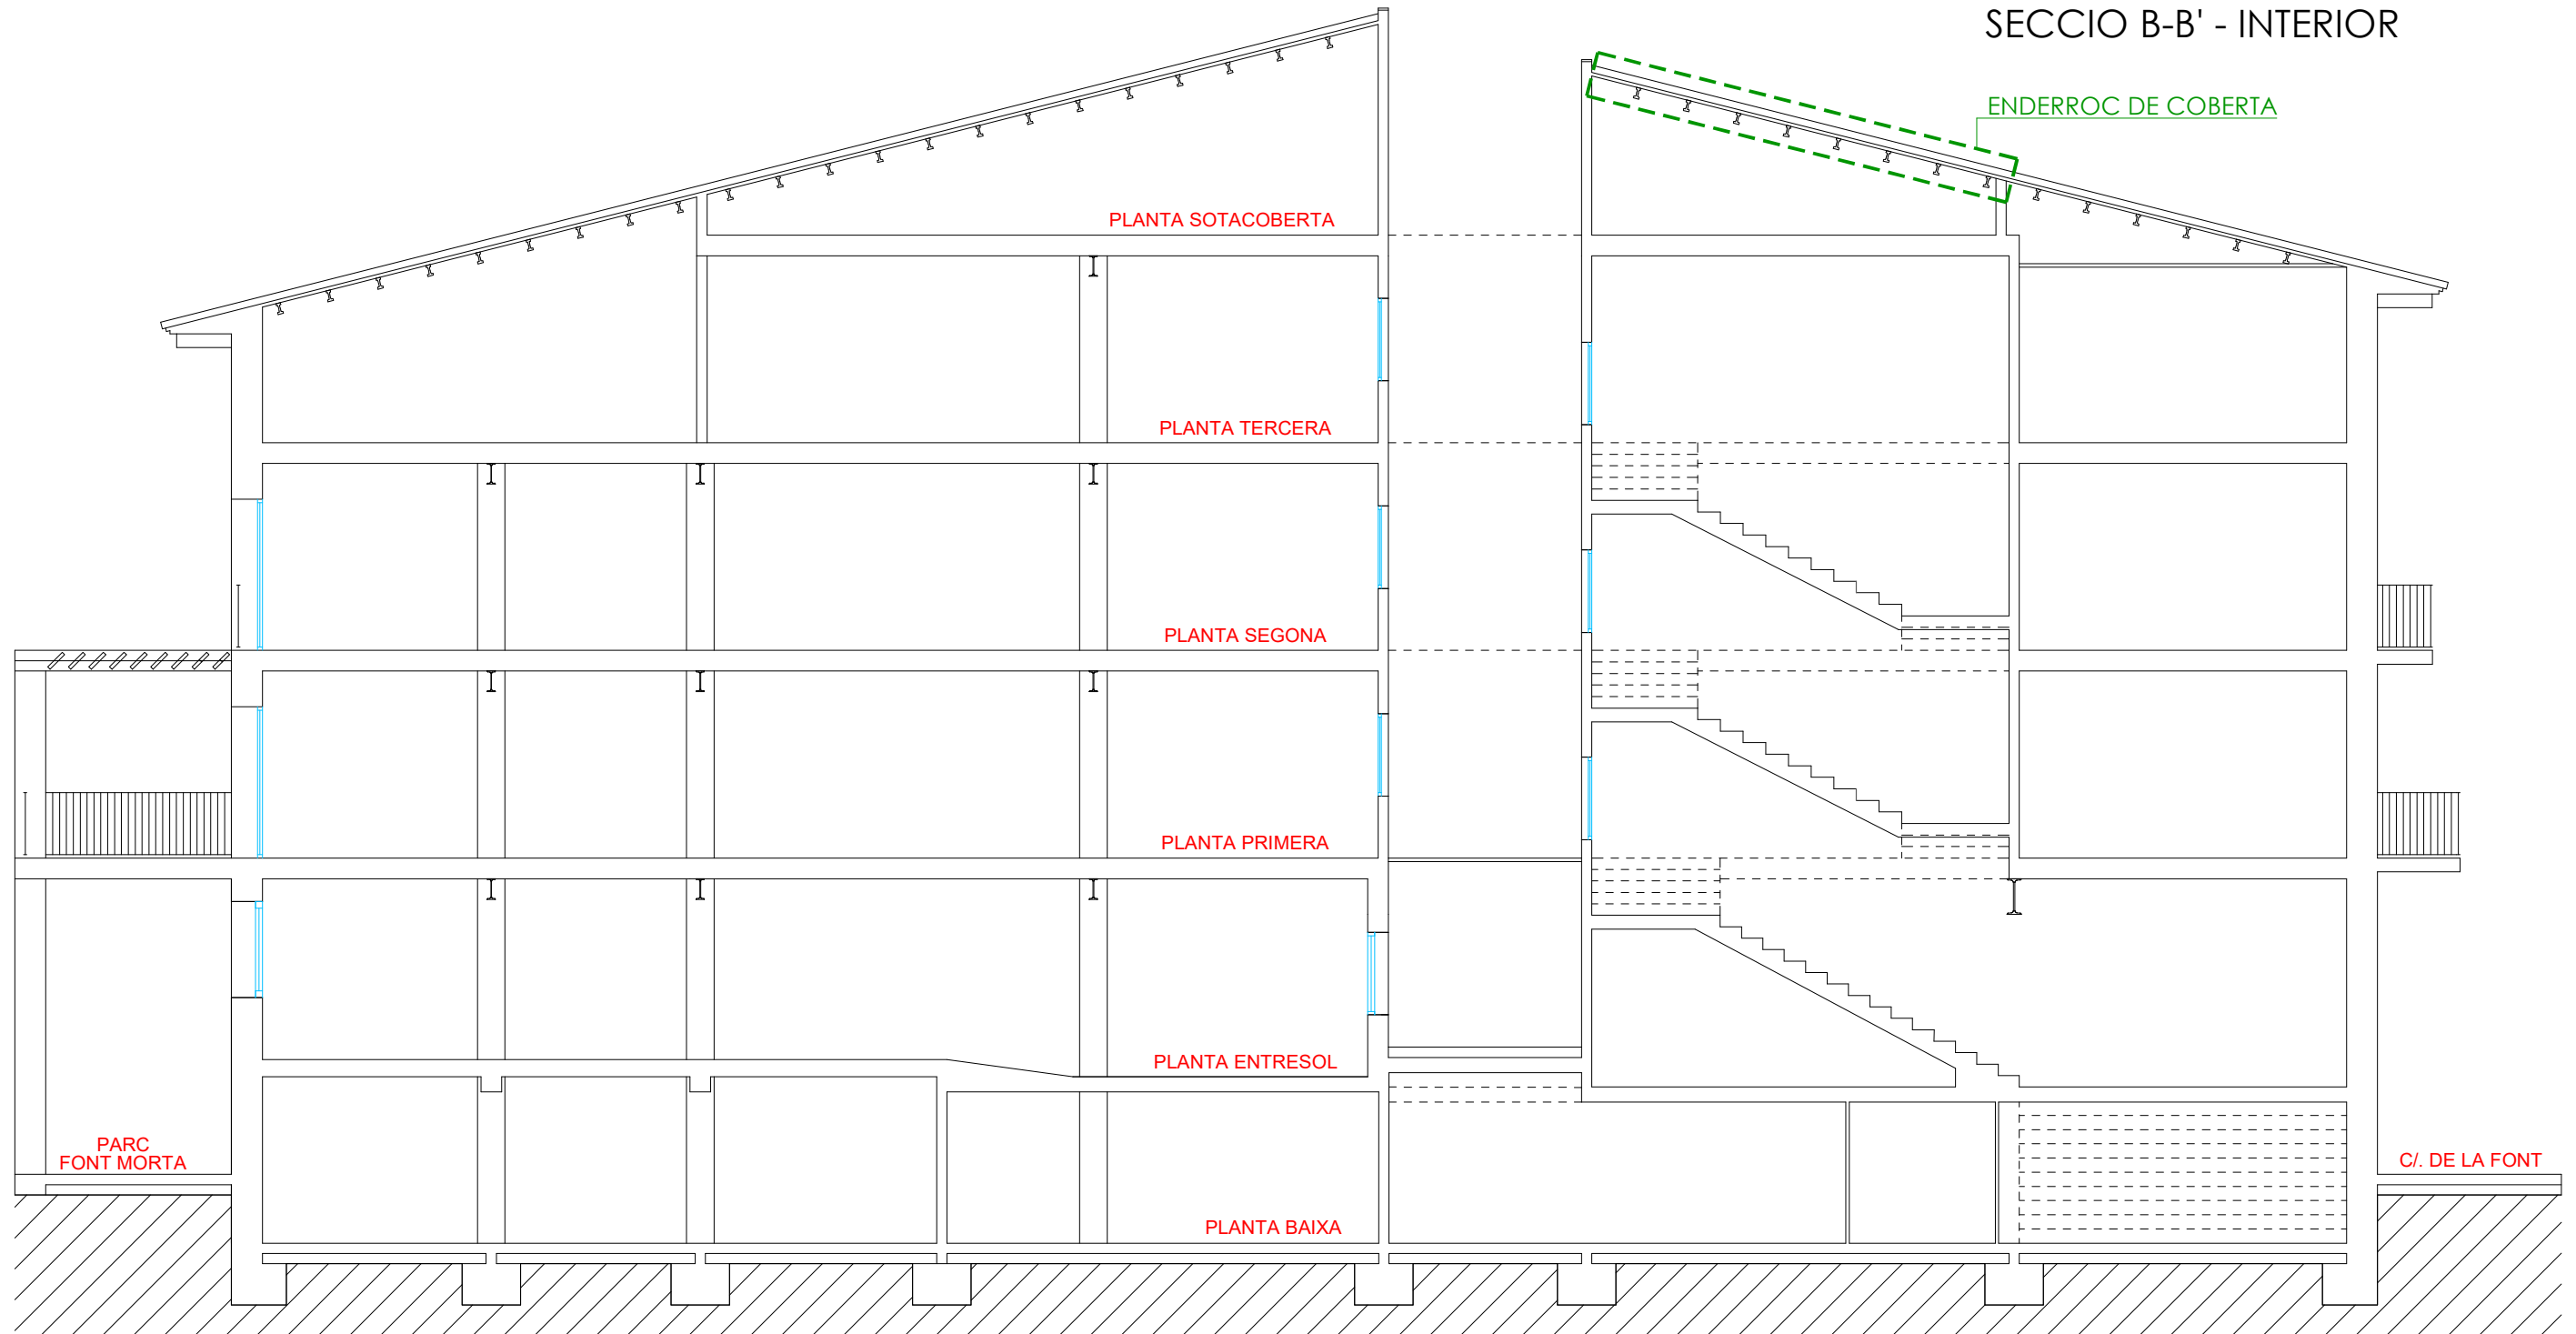


SECCIO A-A' - PATI

TÍTOL ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA	DESCRIPCIÓ PLÀNOL SECCIONS ESTAT ACTUAL	PROMOTOR AJUNTAMENT DE TONA CARRER DE LA FONT, 10 08551 - TONA	REDACCIÓ: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	DATA FEBRER 2025 ESCALA 1/100	Nº PLÀNOL 4
---	---	---	--	---	---------------------------

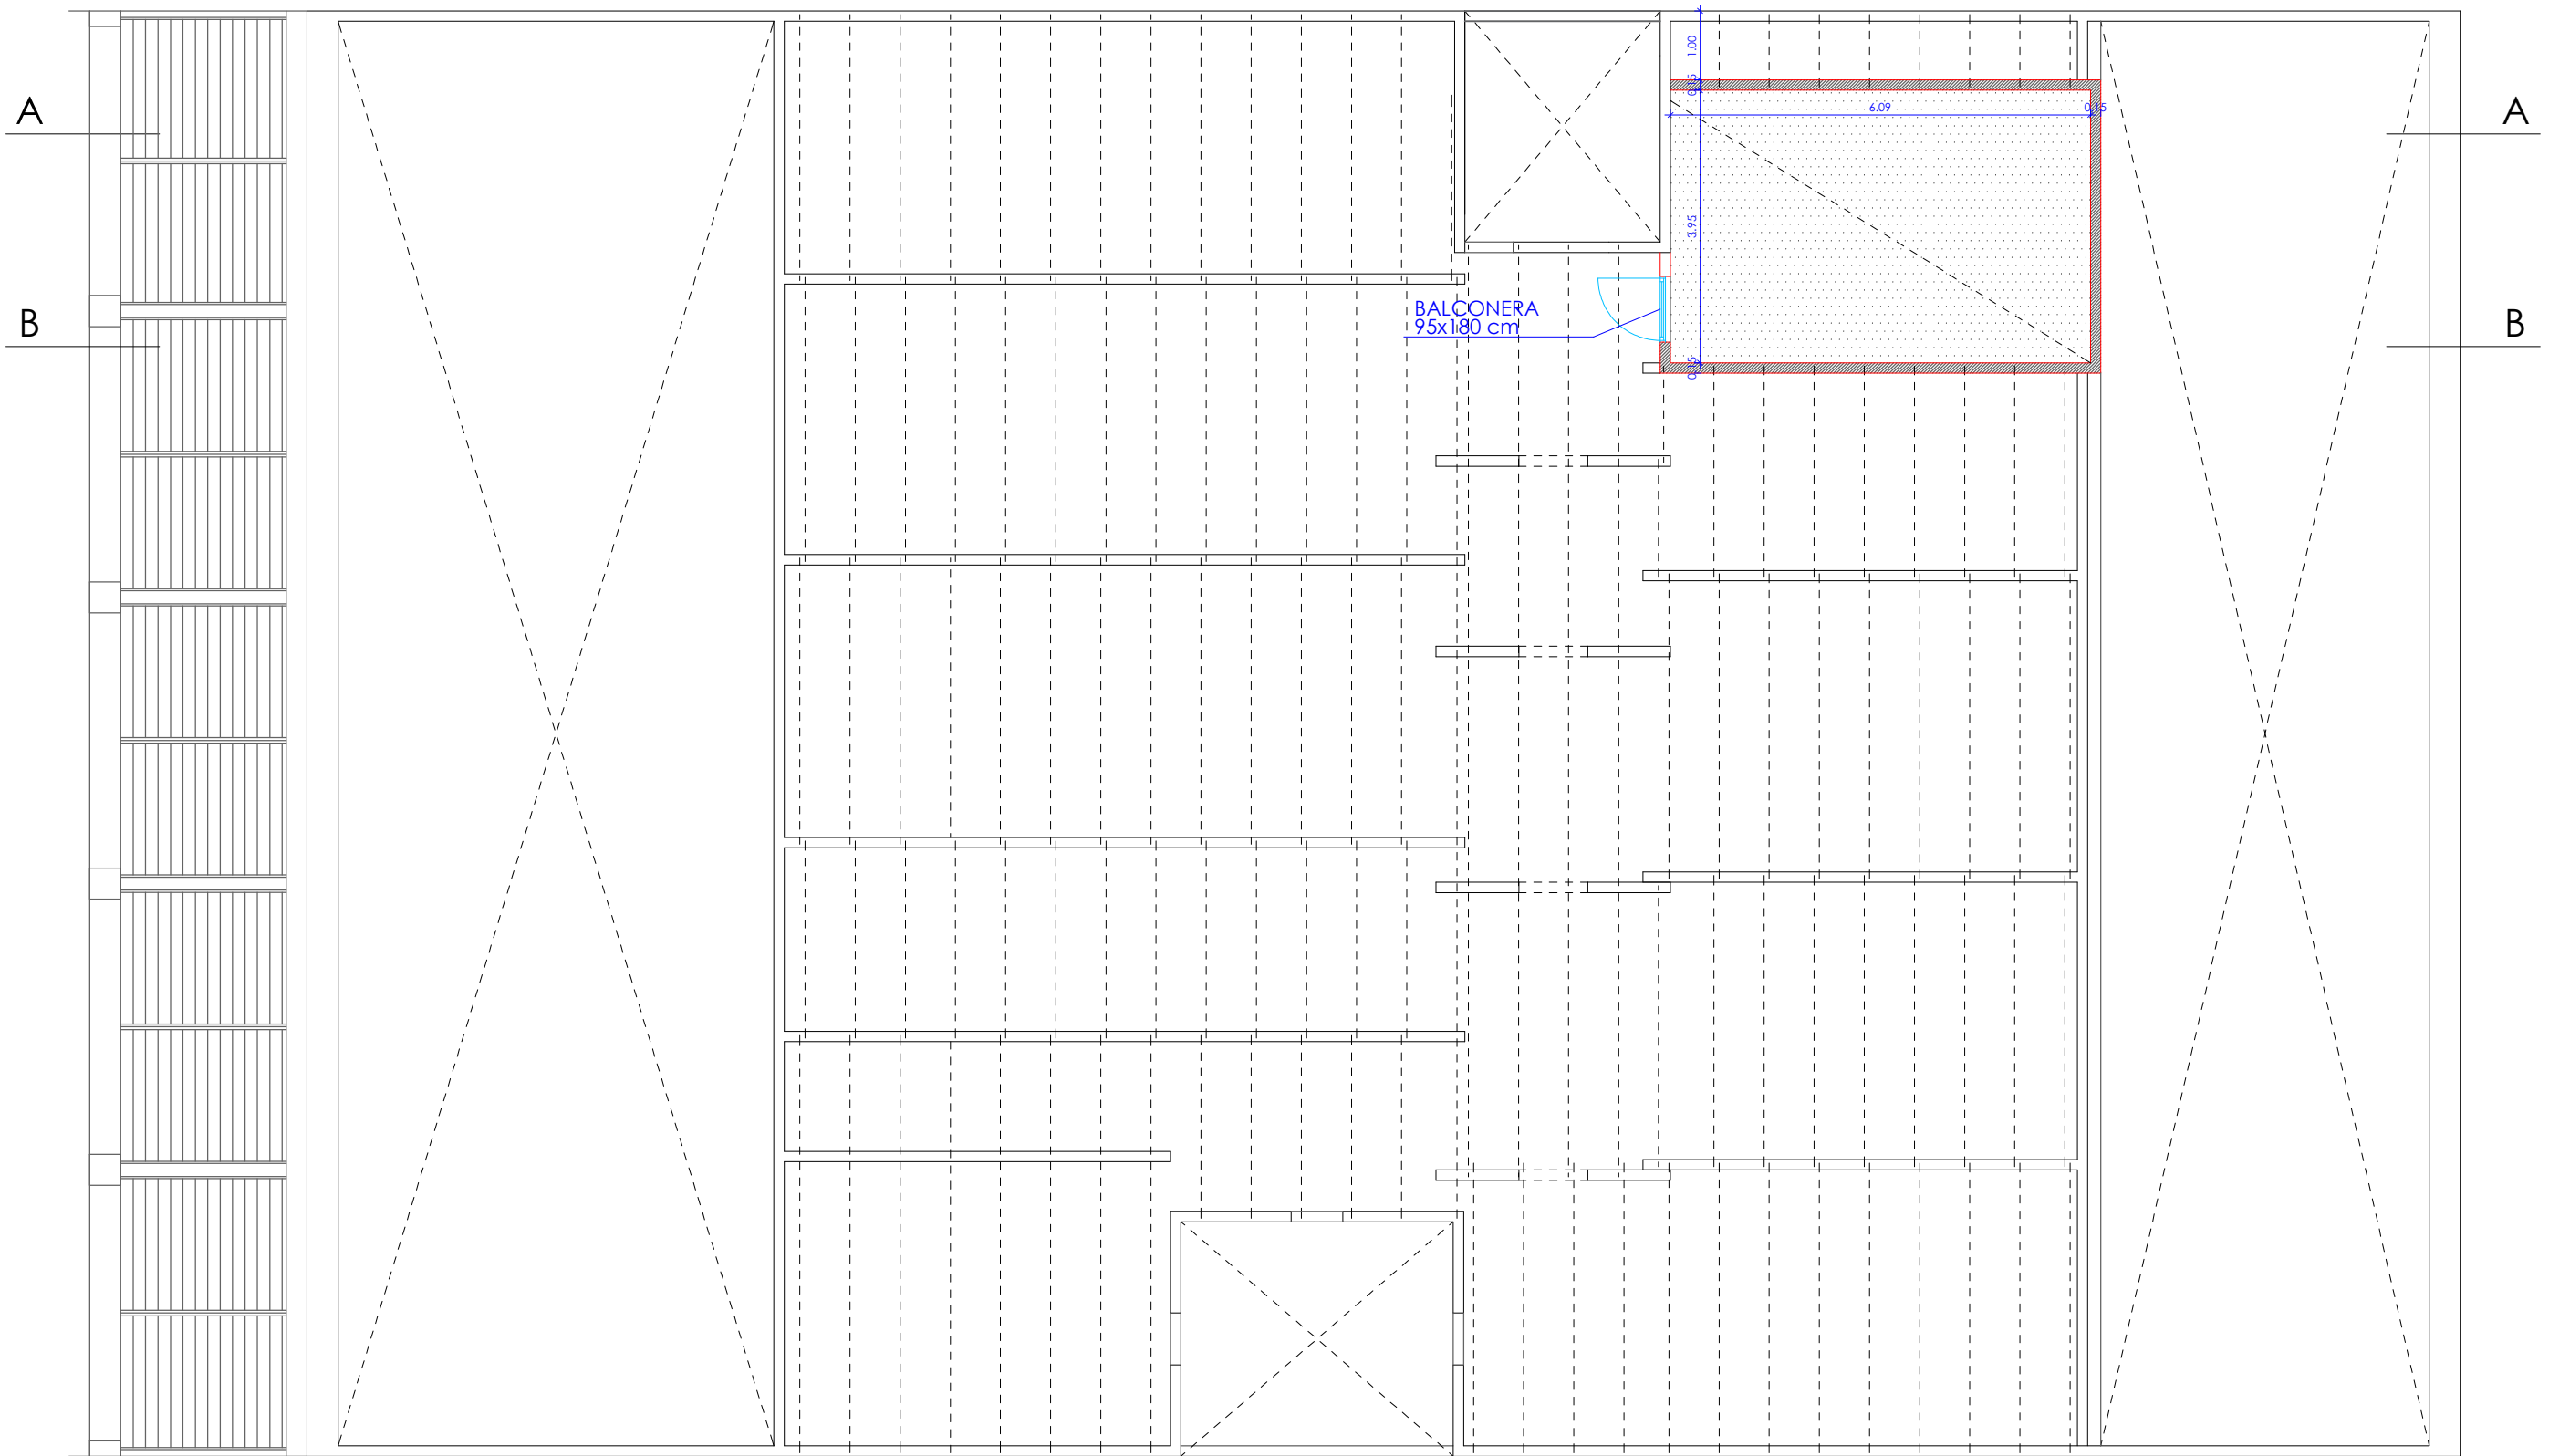


PLANTA SOTACOBERTA



TÍTOL	DESCRIPCIÓ PLÀNOL	PROMOTOR	REDACCIÓ:	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	DATA	Nº PLÀNOL
					FEBRER 2025	
					ESCALA	
ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA		AJUNTAMENT DE TONA			1/100	5
PLANTA SOTACOBERTA PROJECTADA		CARRER DE LA FONT, 10 08551 - TONA				

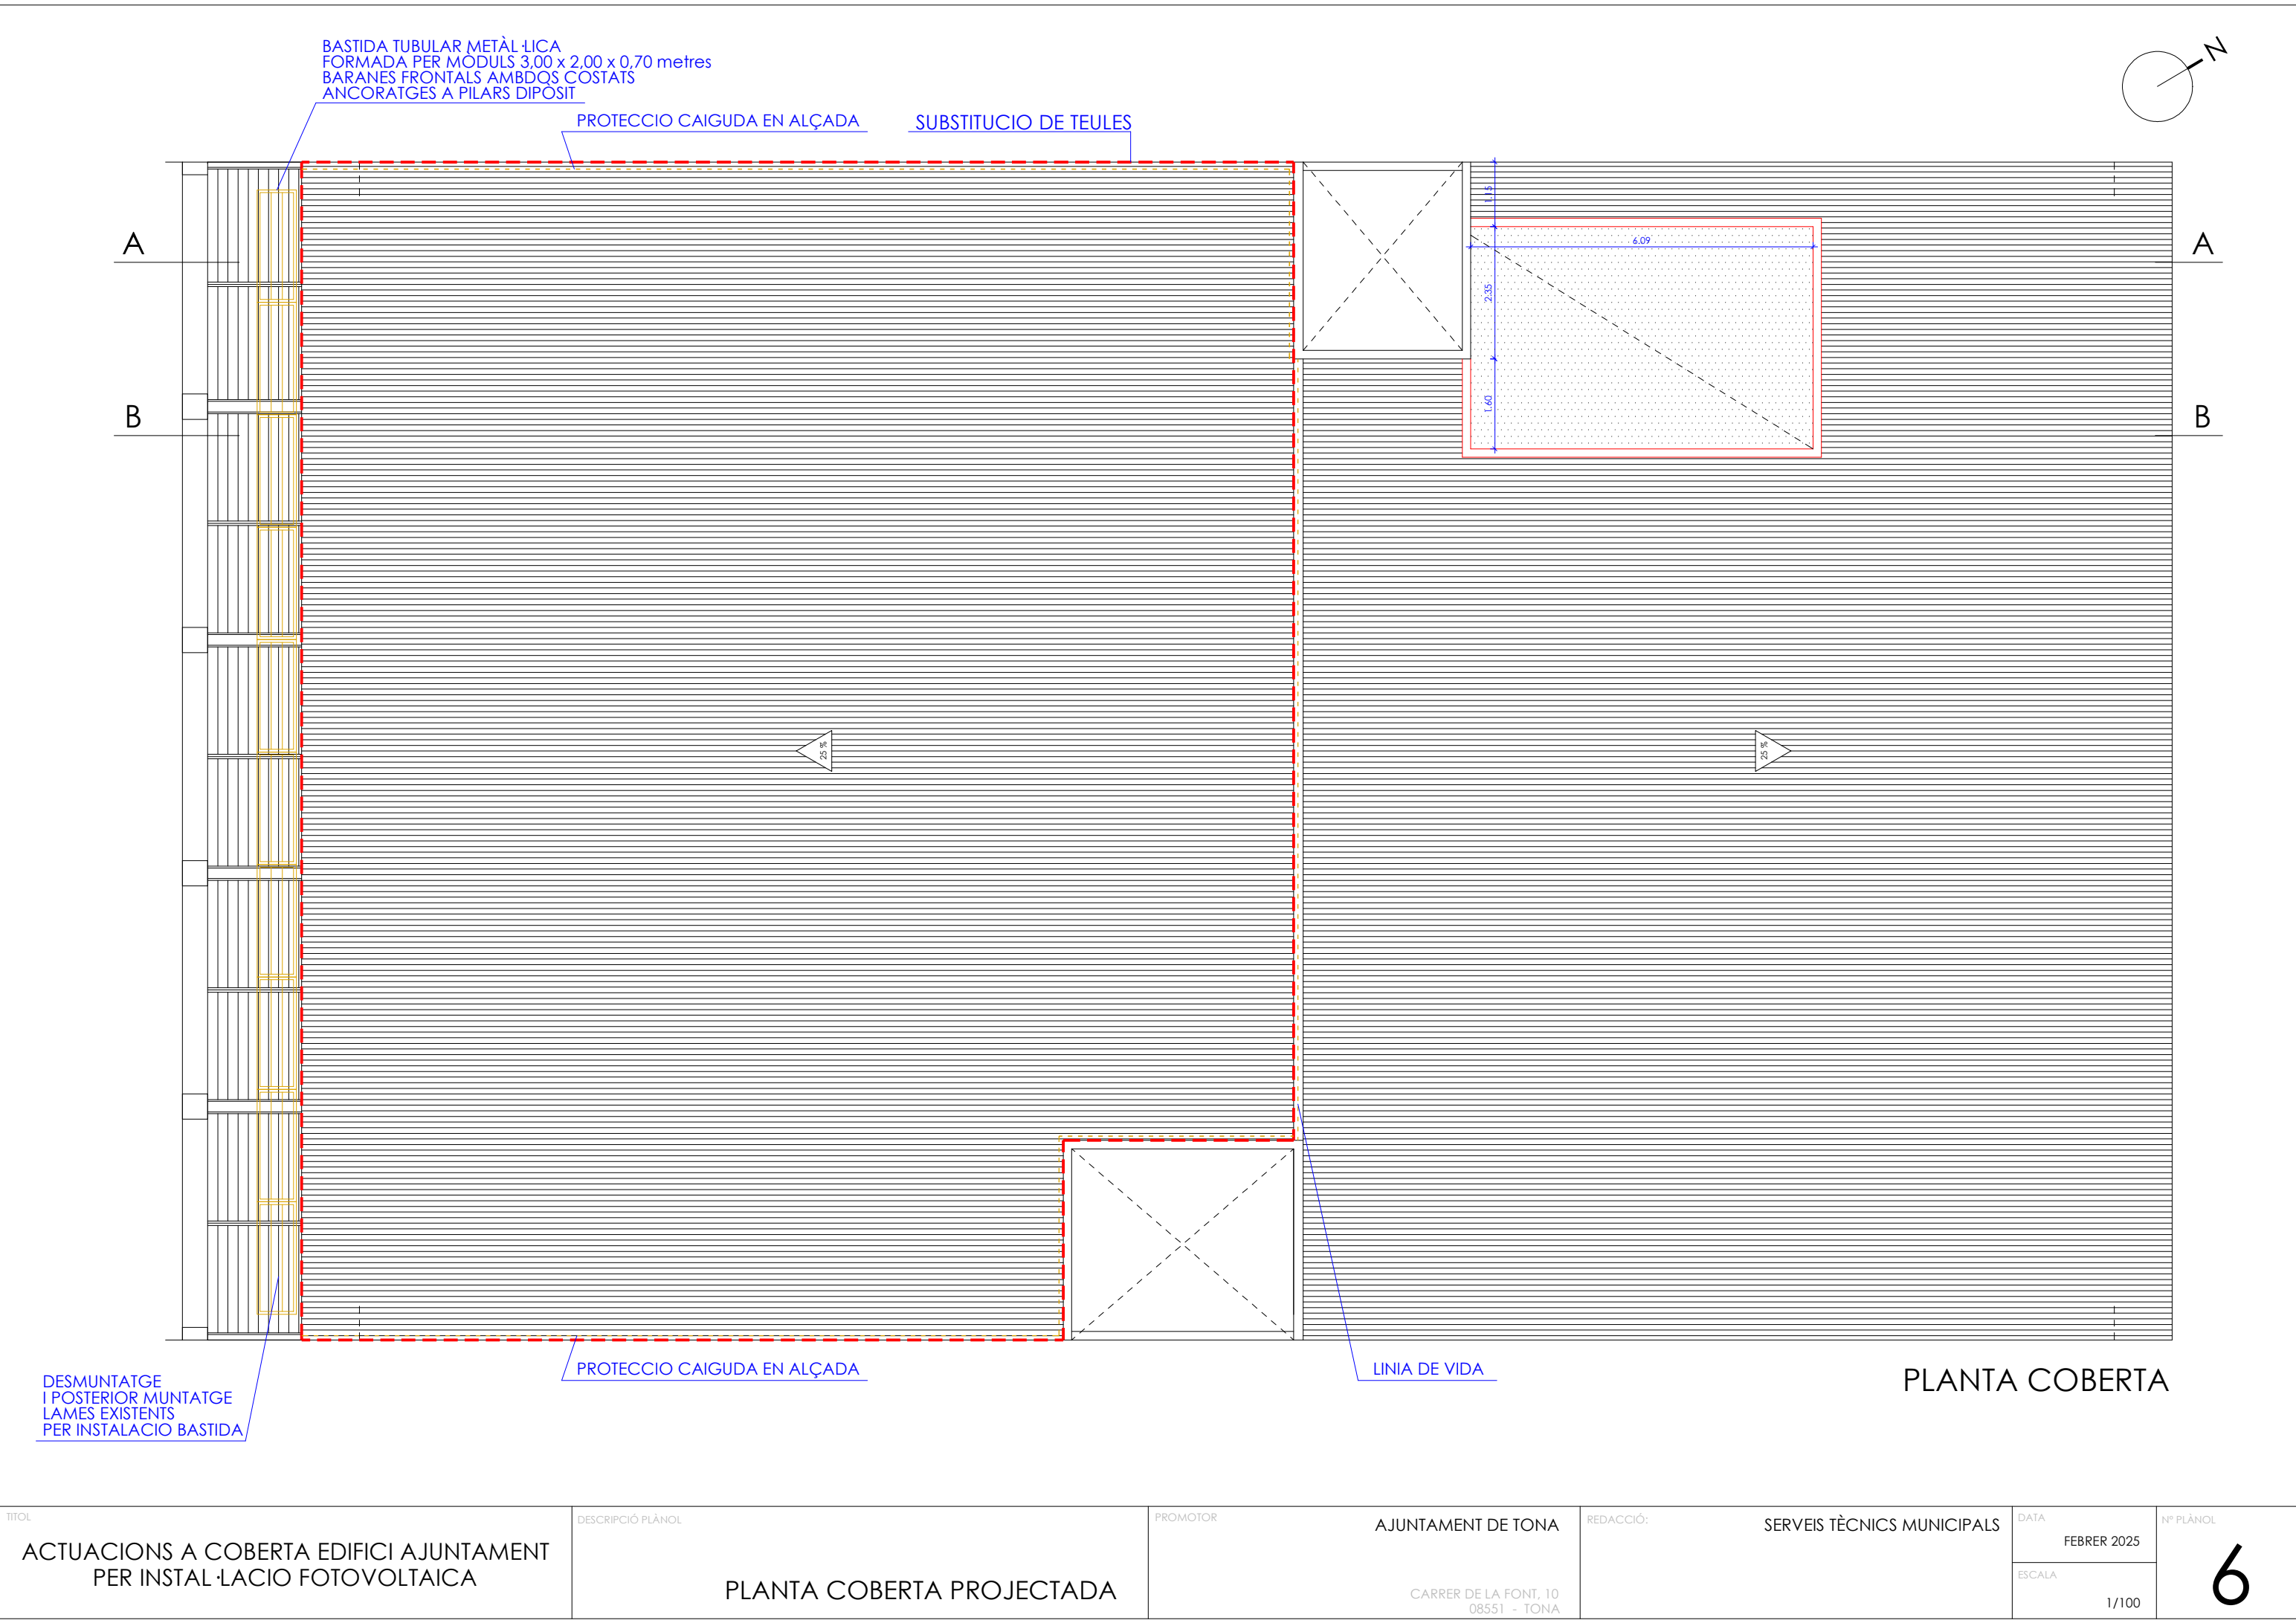

TITOL	DESCRIPCIÓ PLÀNOL	PROMOTOR	REDACCIÓ:	DATA	Nº PLÀNOL
ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA	PLANTA COBERTA PROJECTADA	AJUNTAMENT DE TONA CARRER DE LA FONT, 10 08551 - TONA	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	FEBRER 2025	6
				ESCALA 1/100	

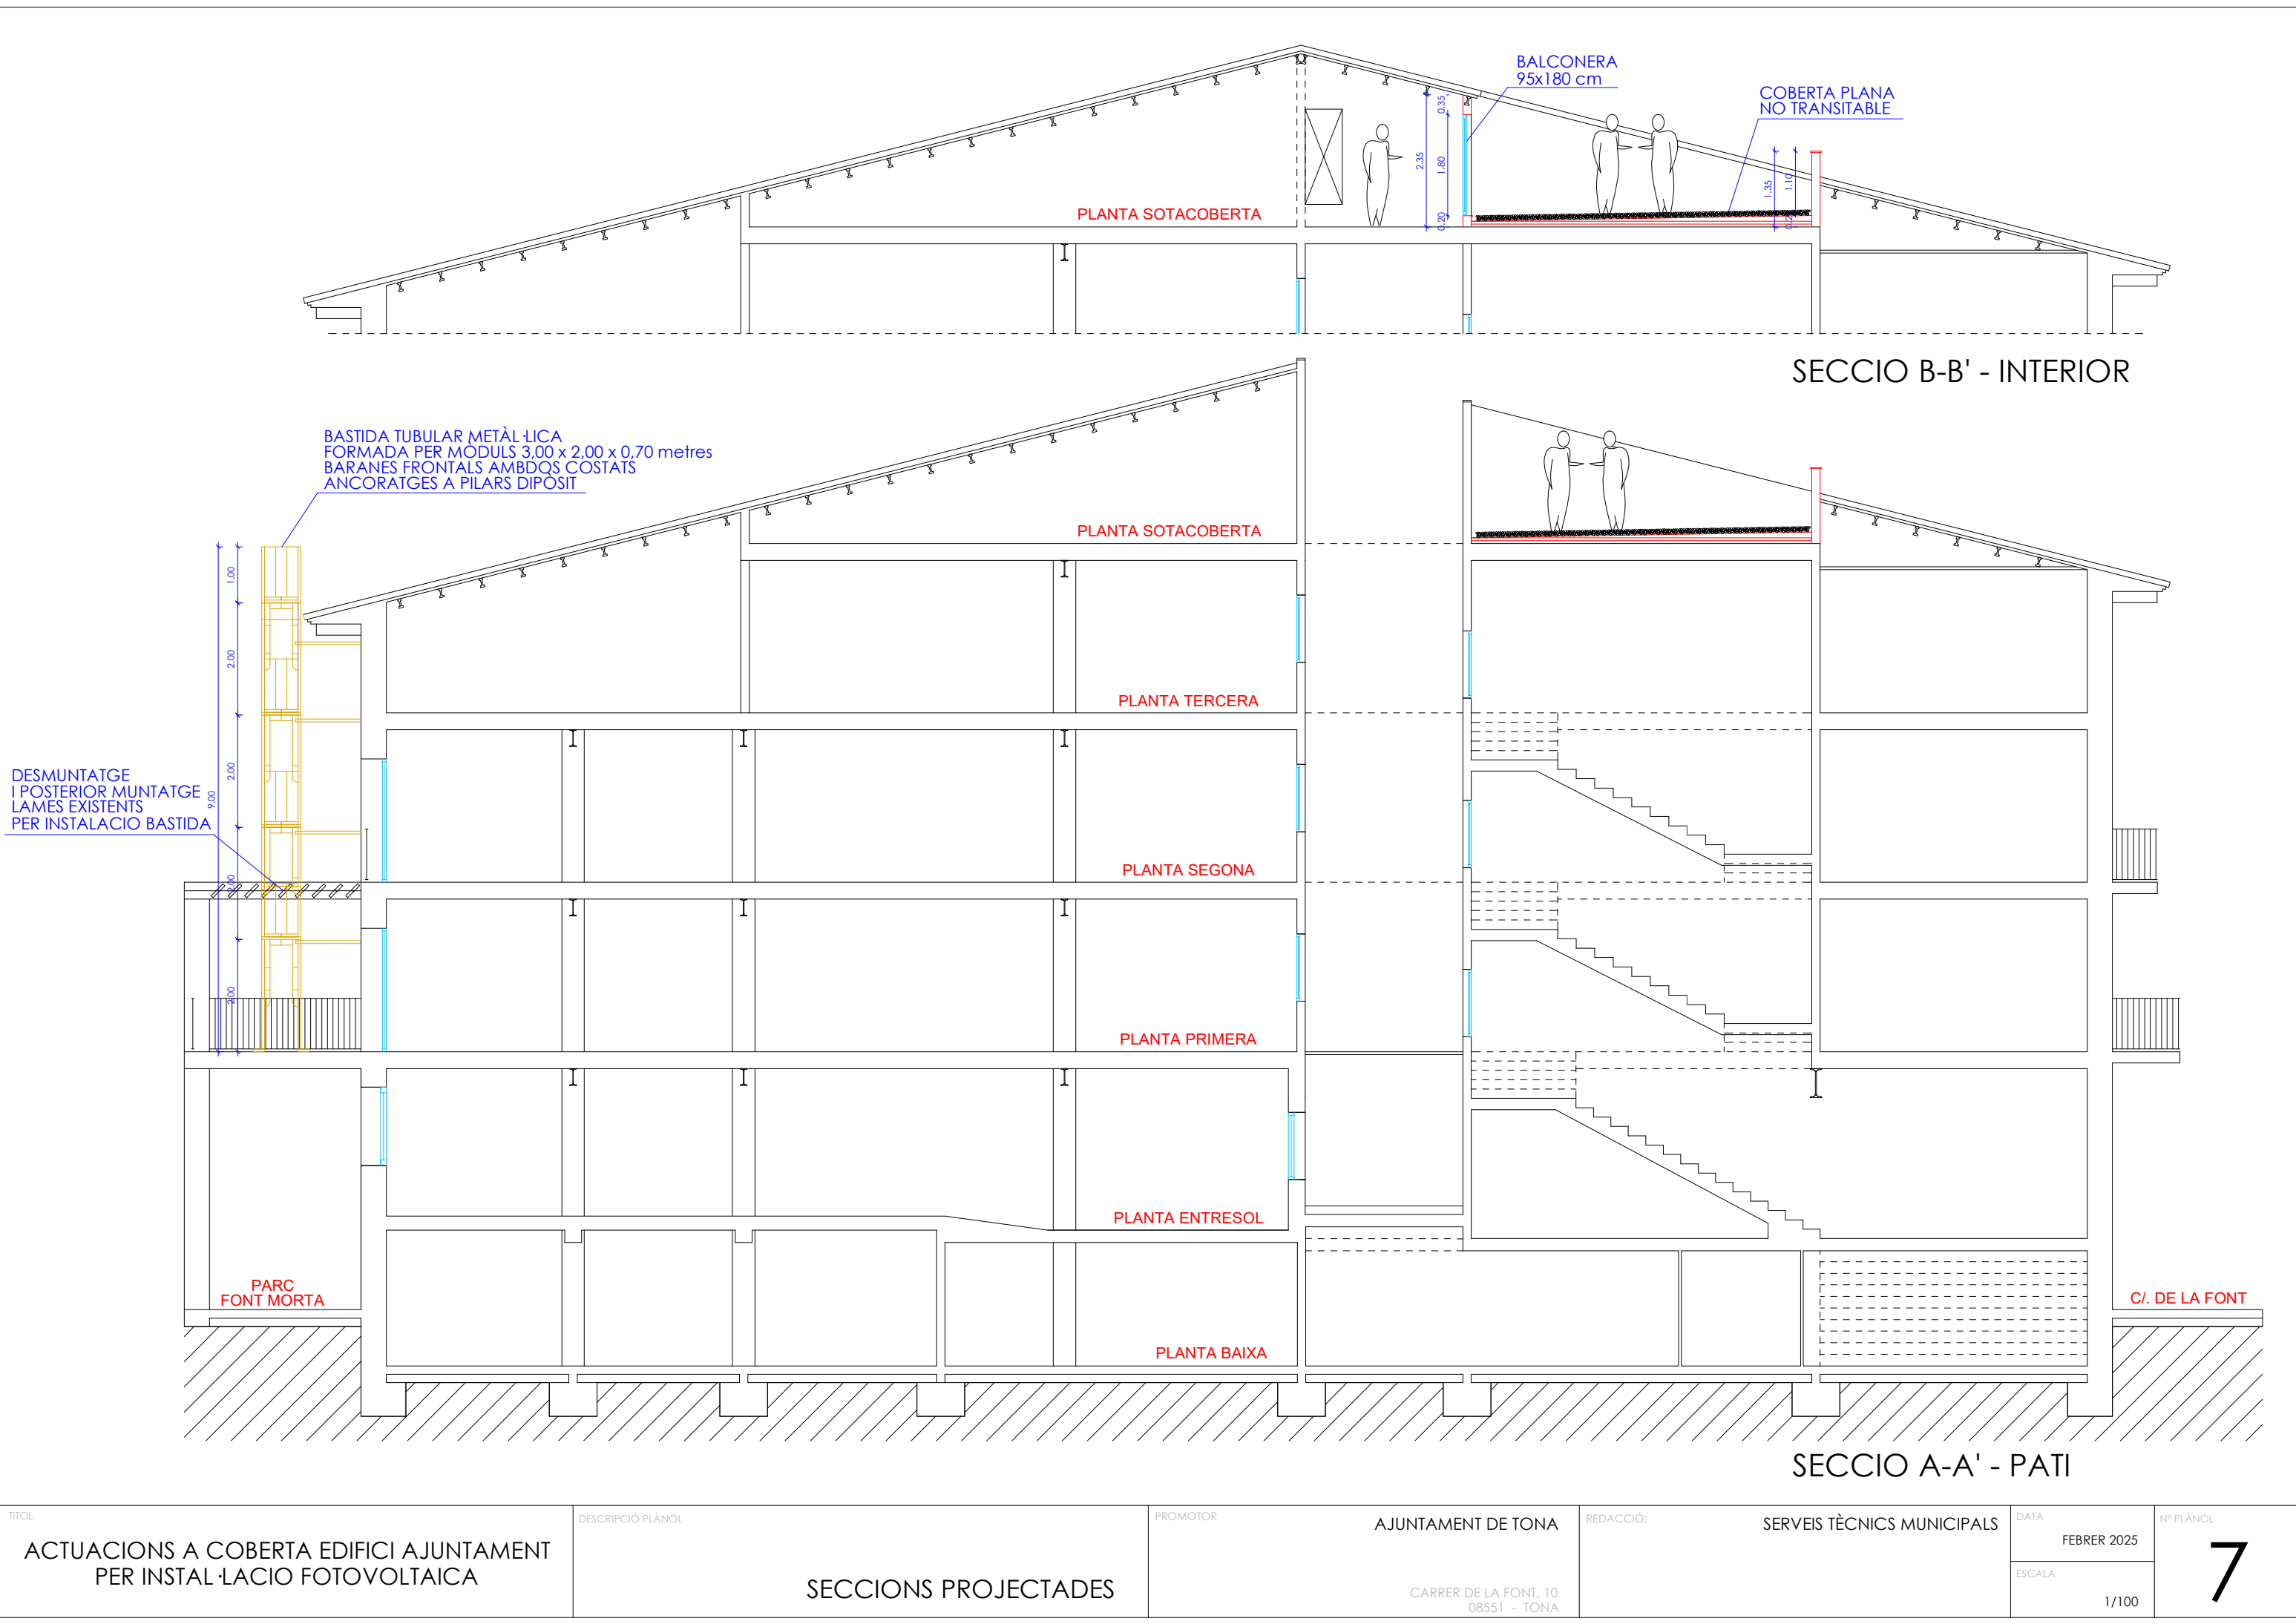

TÍTOL	DESCRIPCIÓ PLÀNOL	PROMOTOR	AJUNTAMENT DE TONA	REDACCIÓ:	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	DATA	Nº PLÀNOL
						FEBRER 2025	
ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA		SECCIONS PROJECTADES				ESCALA	7
				CARRER DE LA FONT, 10 08551 - TONA		1/100	

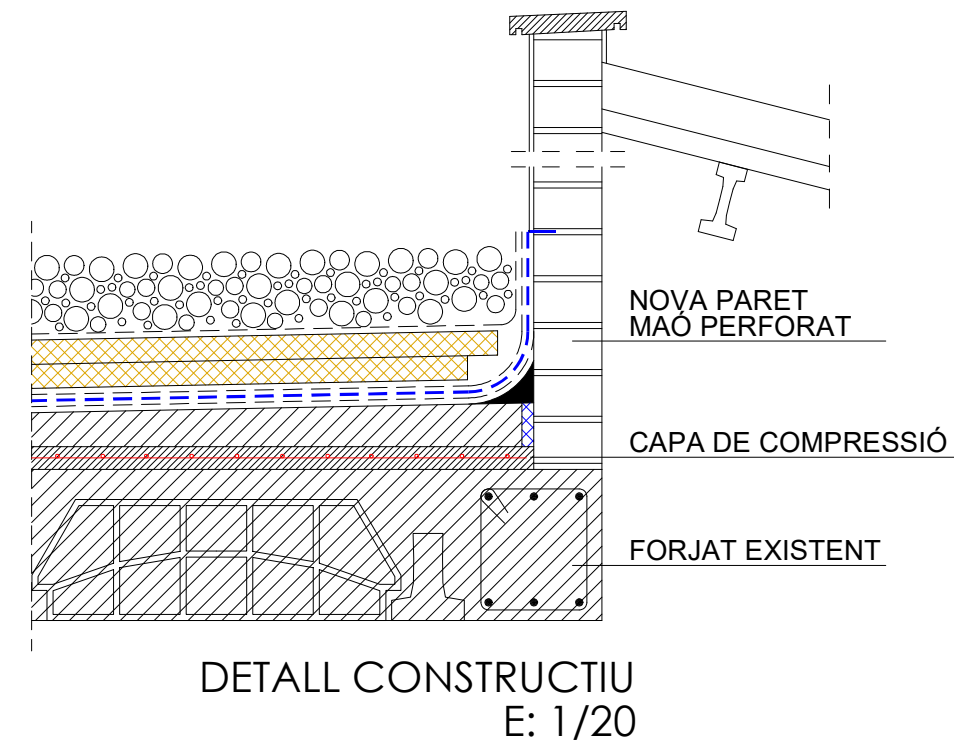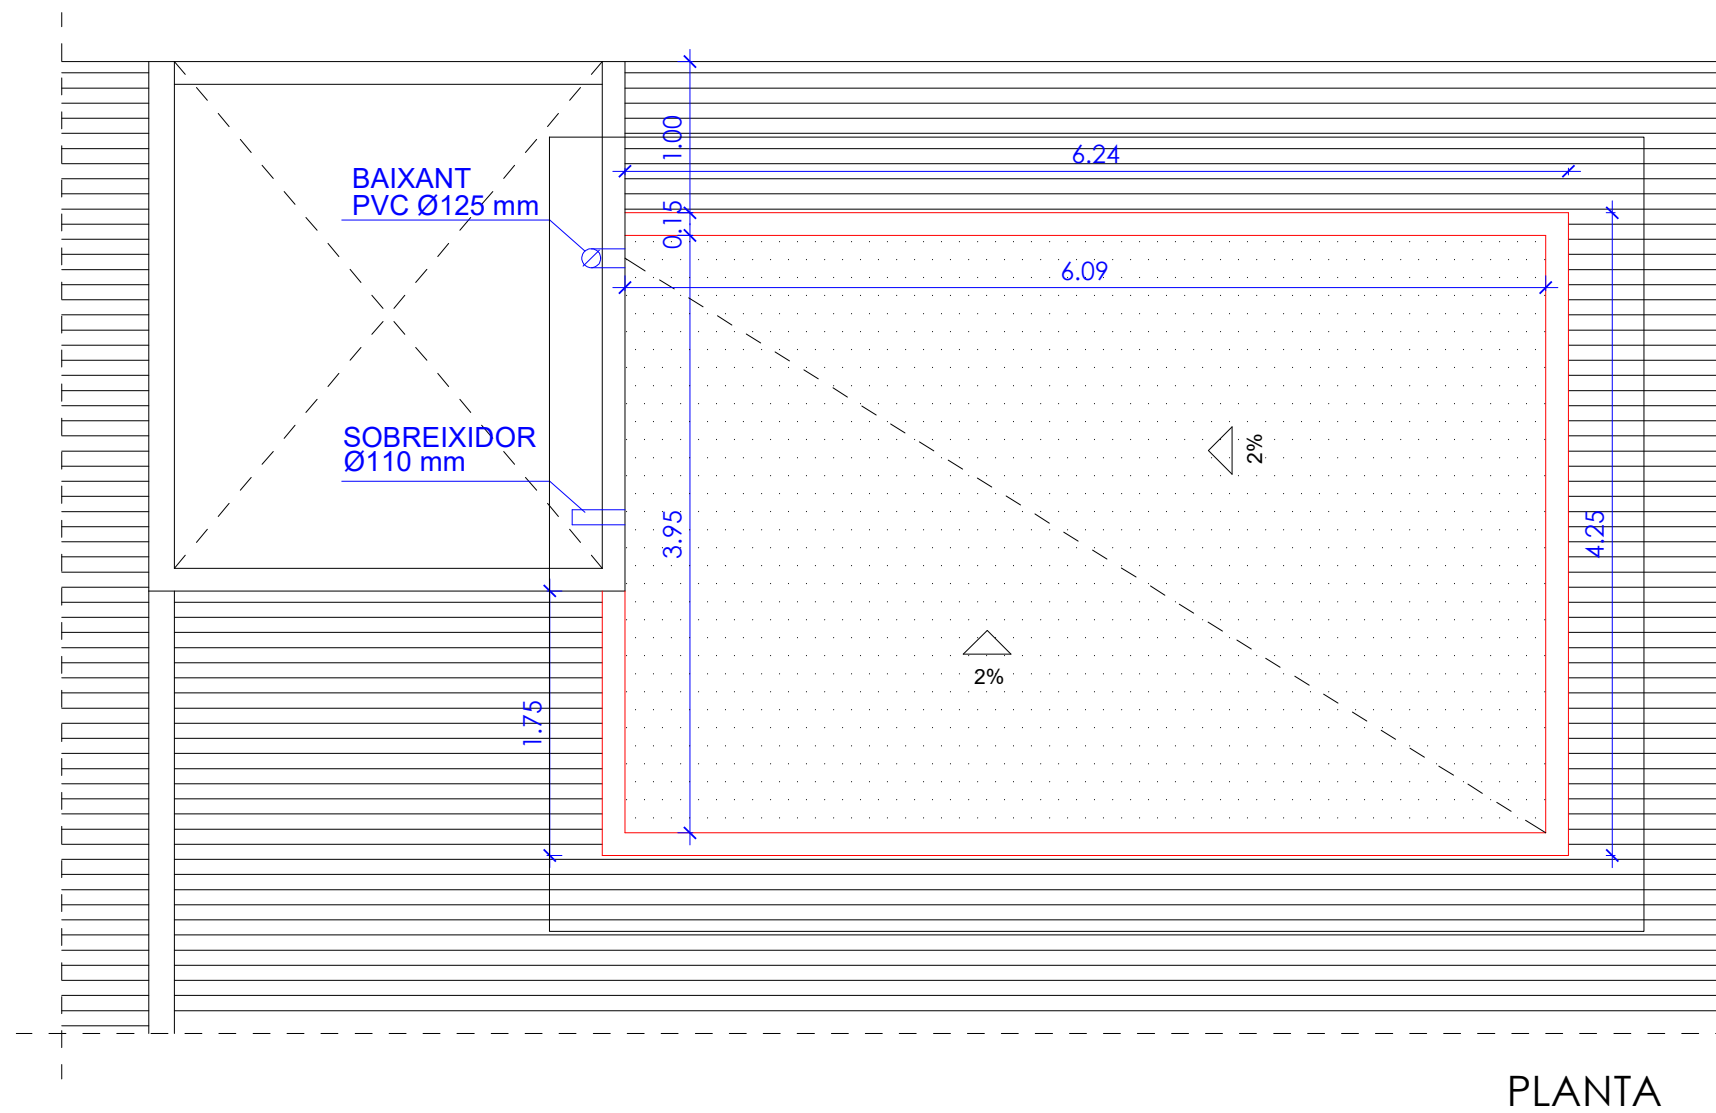

COMPOSICIÓ COBERTA PLANA NO TRANSITABLE

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE 150 Kg/m³
FELTRE GEOTEXTIL DE POLIPROPILÈ 100 grams/M²
LÀMINA IMPERMEABILITZACIÓ BETUM MODIFICAT LBM
FELTRE GEOTEXTIL DE POLIPROPILÈ 100 grams/M²
AILLAMENT AMB DOS PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUSSIONAT, GRUIX 40 mm
FELTRE GEOTEXTIL DE POLIPROPILÈ 100 grams/M²
CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA, d=16-32 mm, GRUIX 5-10 cm

TÍTOL	DESCRIPCIÓ PLÀNOL	PROMOTOR	REDACCIÓ:	DATA	Nº PLÀNOL
ACTUACIONS A COBERTA EDIFICI AJUNTAMENT PER INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA	PLANTA COBERTA PLANA NO TRANSITABLE	AJUNTAMENT DE TONA	SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS	FEBRER 2025	8
				ESCALA 1/50	

CARRER DE LA FONT, 10
08551 - TONA
